



सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी
नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको



नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु (स्वतःप्रकाशन) को विवरण
(२०८१ माघ देखि चैत मसान्त सम्म)



नेपाल विद्युत प्राधिकरण
दरबारमार्ग, काठमाडौं ।

विषय सूची

१.	पृष्ठभूमी	२
२.	नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम, कर्तव्य, एवं अधिकारहरु	२
३.	नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना तथा दरबन्दी	३
	३.१ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना	३
	३.२ कर्मचारीको दरबन्दी विवरण	४
४.	नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकहरु, प्रवक्ता, सूचना अधिकारी र नोडल अधिकृतको नाम तथा टेलिफोन नं.	५
५.	नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशनालयहरुको कार्य विवरण :	६
	५.१ प्रशासन निर्देशनालय	६
	५.२ अर्थ निर्देशनालय	९
	५.३ उत्पादन निर्देशनालय	१३
	५.४ वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय	२३
	५.५ प्रसारण निर्देशनालय	५०
	५.६ योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय	८६
	५.७ आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय	९१
	५.८ ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय	११९
	५.९ व्यवसाय विकास निर्देशनालय	१३१
६.	ऐन, नियम एवं विनियमको सूची	१४५

१. पृष्ठभूमि :


विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरण २०४२ साल भाद्र १ मा स्थापना भएको हो । हालसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालयले संचालन तथा उत्पादन गरेको जम्मा जलविद्युत क्षमता ग्रिडमा जोडीएको ५७८.६२ मेगावाट र ग्रिडमा नजोडिएको ४.५४ मेगावाट गरी जम्मा जलविद्युत क्षमता ५८३.१६ मेगावाट, थर्मल विद्युत ५३.४१ मेगावाट, सोलार विद्युत २५ मेगावाट गरी जम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट उत्पादित विद्युत ६६१.५७ मेगावाट छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूबाट ६०३.९ मेगावाट र निजी क्षेत्रको जलविद्युत २१४८.७ मेगावाट, निजी क्षेत्रको सोलार विद्युत ९१.९४ मेगावाट र बगासबाट उत्पादित ६ मेगावाट गरी नेपालमा जम्मा ३५१२.११ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । विद्युत पहुँच भएका पालिकाको आधारमा ९७.५ प्रतिशत र वडाहरूको आधारमा ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएकोमा प्राधिकरणको विद्युत प्रणाली, निजी क्षेत्र तथा वैकल्पिक उर्जा समेत गरी मुलुकभर आ.व. २०८१/०८२ चैत्र मसान्तसम्ममा करिब ९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । प्राधिकरणले मुलुकभर रहेका वितरण केन्द्रहरू मार्फत आ.व. २०८१/०८२ चैत मसान्तसम्म ने.वि.प्रा. तर्फका ५६,२०,३०२ र सामुदायिक विद्युत सहकारी संस्था तर्फका ४,७५,५३९ समेत गरी जम्मा ६०,९५,८४१ ग्राहकहरूलाई विद्युत सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ ।

२. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम, कर्तव्य एवं अधिकारहरू :

- (क) विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीति निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।
- (क_१) प्रचलित कानून बमोजिम विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने ।
- (ख) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणाली तथा तत्सम्बन्धी अन्य कार्यको योजना तर्जुमा गर्ने र तर्जुमा भएको योजनाको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विद्युत उत्पादन केन्द्र, रूपान्तर केन्द्र (सबस्टेशन), वितरण केन्द्र, प्रसारण र वितरण लाइन तथा तत्सम्बन्धी सुविधाहरूको निर्माण, संचालन, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने ।
- (ग) औद्योगिक, कृषि विकास तथा जनताको सुविधाको लागि आर्थिक दृष्टिले उपयुक्त क्षेत्रमा उपयुक्त स्तरको विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको व्यवस्था गर्ने ।
- (घ) विद्युत महशुल बाहेक ग्राहकबाट मिटर जडान, मिटर ठाउँसारी, नामसारी, क्षमता वृद्धि लगायतका सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने ।
- (ङ) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान कार्य गर्ने, गराउने ।
- (च) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न उच्च तालिम तथा अध्ययनको प्रबन्ध गर्ने, गराउने ।
- (च_१) विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण कार्यसँग सम्बन्धित प्राविधिक सल्लाह र परामर्श प्रदान गर्ने ।
- (छ) प्राधिकरणको उद्देश्य पूर्तिको लागि आवश्यक अन्य कामहरू गर्ने, गराउने ।

३. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना तथा दरबन्दी :

३.१. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना :

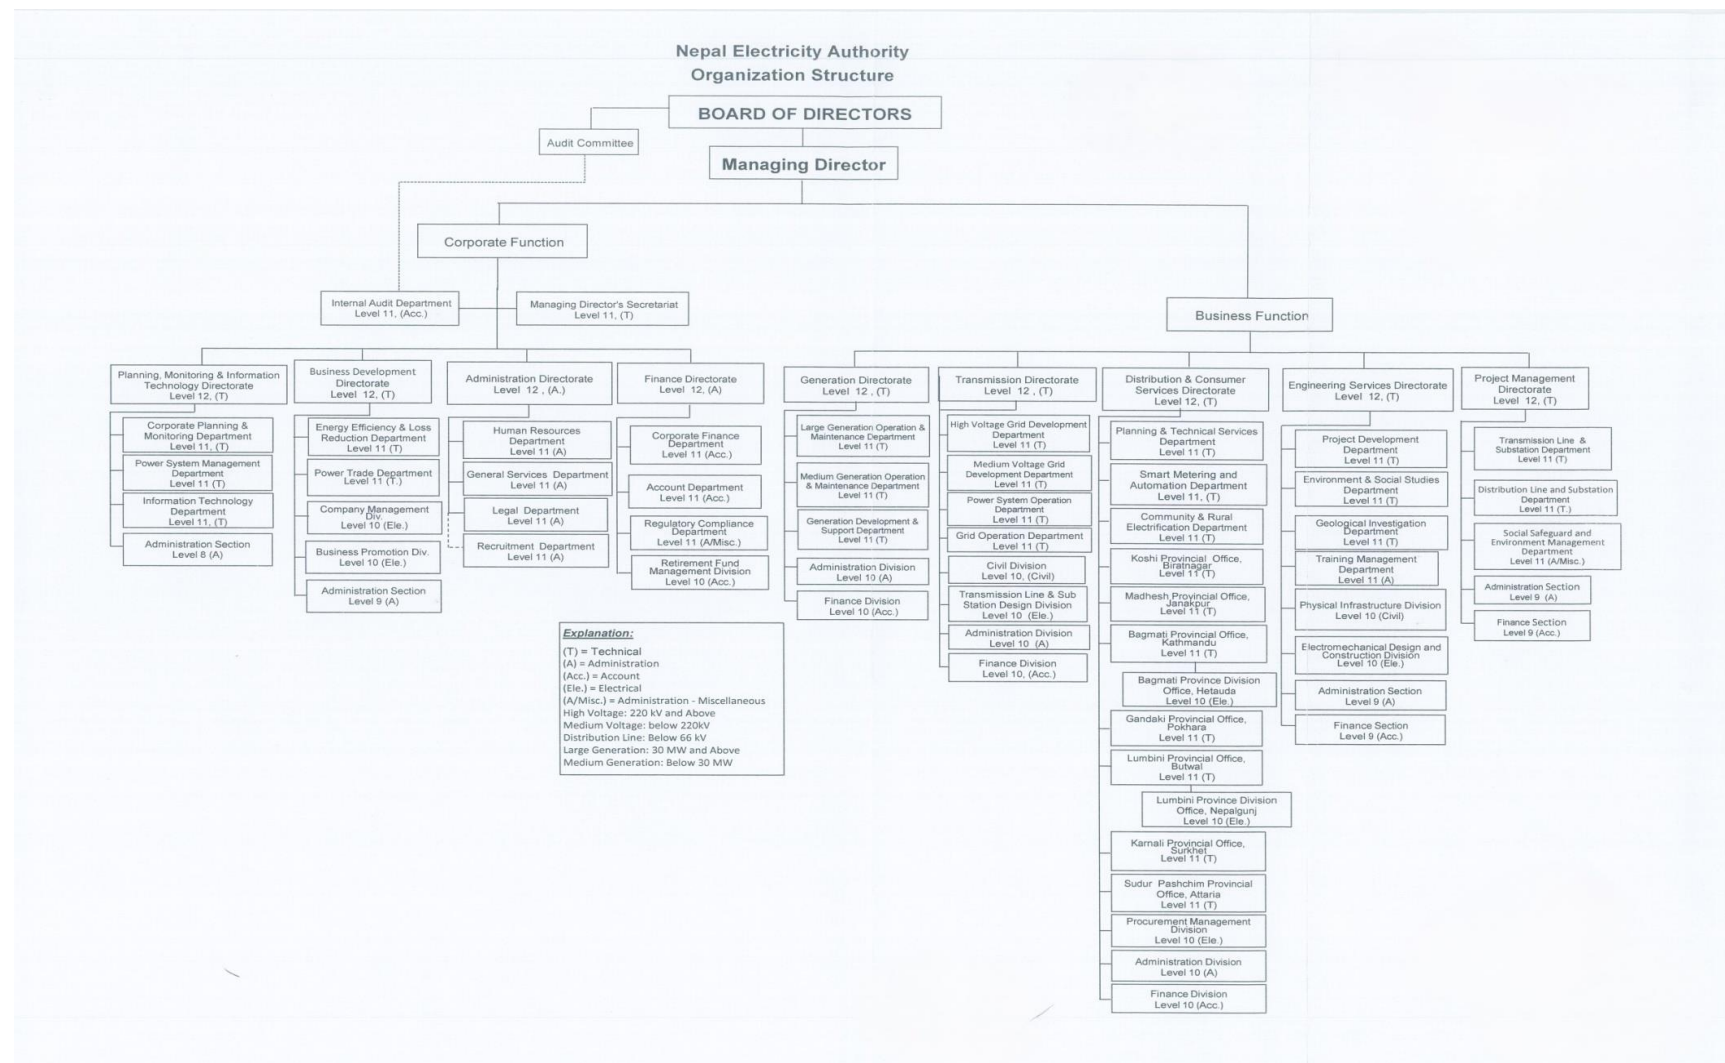

३.२. कर्मचारी दरबन्दी विवरण :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
प्रशासन निर्देशनालय
जनसाधन विभाग
केन्द्रीय कर्मचारी प्रशासन शाखा

२०८१ चैत मसान्त

पद	सेवा	स्वीकृत दरबन्दी	मौजूदा कर्मचारी		
		नियमित	स्थायी	म्यादी/करार/ ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारी संख्या	जम्मा
कार्यकारी निर्देशक		१	१	०	१
उप कार्यकारी निर्देशक	(प्राविधिक/प्रशासन)	९	५	०	५
अधिकृत स्तर (तह ६ देखि ११ सम्म)	प्राविधिक	१७५८	१२७६	०	१२७६
	प्रशासन	८८३	६३६	१	६३७
	जम्मा	२६४१	१९१२	१	१९१३
सहायक स्तर (तह १ देखि ५ सम्म)	प्राविधिक	६०१९	४२१९	११३	४३३२
	प्रशासन	२७६३	२३१७	९५	२४१२
	जम्मा	८७८२	६५३६	२०८	६७४४
	कूल जम्मा	११४३३	८४५४	२०९	८६६३

४. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकहरु, प्रवक्ता, सूचना अधिकारी, र नोडल अधिकृतको नाम तथा टेलिफोन नं.

सि.नं.	पद	नाम	टेलिफोन नं.
१	कार्यकारी निर्देशक	श्री हितेन्द्र देव शाक्य	०१-४१५३००७
२	नि. उपकार्यकारी निर्देशक	श्री राजन ऋषि कडेल	०१-४१५३११६
३	प्रमुख	श्री मोतिलाल महतारा	९८५१०७०४१८
४	नि. उपकार्यकारी निर्देशक	श्री कमल आर्चाय	९८४१९५५७४५
५	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री दिर्घायु कुमार श्रेष्ठ	९८५१२१२०९२
६	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री तुलाराम गिरी	९८५११६८२१९
७	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री मदन तिम्लीना	०१-४१५३०१४
८	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री तारा प्रसाद प्रधान	९८५१३३७०६८
९	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री दुर्गा नन्द बडियैत	९८४१२२८२२२
१०	निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक	श्री नवराज ओझा	९८५११५३१४६
११	प्रवक्ता	श्री राजा भाई सिल्पकार	९७६८९०८१२६
१२	सूचना अधिकारी	श्री सर्वजित कुमार चौधरी	०१-४१५३०२२
१३	नोडल अधिकृत	श्री पुनम जोशी	०१-४१५३२१५

५. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशनालयहरुको कार्य विवरण :

५.१. प्रशासन निर्देशनालय :

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विद्यमान ९ वटा निर्देशनालयहरु मध्ये प्रशासन निर्देशनालय पनि एक हो । यस निर्देशनालयको नेतृत्व उपकार्यकारी निर्देशक तह १२ (प्रशासन) बाट हुँदै आएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको समग्र कर्मचारी प्रशासन र सामान्य प्रशासन यसै निर्देशनालय अन्तर्गत संचालन र व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । यस निर्देशनालय अन्तर्गत जनसाधन विभाग, पदपूर्ति विभाग, सामान्य सेवा विभाग र कानून विभाग गरी चार वटा विभागहरु रहेका छन् । निर्देशनालय अन्तर्गत रहेको सामान्य सेवा विभाग अन्तर्गत जनसम्पर्क तथा गुनासो व्यवस्थापन शाखामा यस आ.व. को तेश्रो त्रैमासिकमा छ वटा सूचना माग गरिएकोमा तीन वटा सम्बन्धित सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराइएको छ भने तीन वटा सूचना उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा रहेका छन् । त्यसैगरी उक्त अवधिमा जम्मा १०,६९५ वटा गुनासाहरु प्राप्त भएकोमा ९,४६० गुनासाहरु फछ्यौट भएका छन् भने १२३५ वटा गुनासाहरु फछ्यौटको प्रकृत्यामा रहेका छन् ।

५.१.१. प्रशासन निर्देशनालयका कार्यहरु :

प्रशासन निर्देशनालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम कारवाहीलाई चुस्त, दुरुस्त, जनमुखी, पारदर्शी, सहभागितामूलक बनाई व्यवस्थित ढंगले सम्पादन गर्न समग्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सहयोग गर्ने सहयोगी निकायको रूपमा कार्यसम्पादन गर्दछ । त्यसका लागि यस निर्देशनालयले आन्तरिक तथा बाह्य सम्पर्क, अन्तर निर्देशनालय समन्वय तथासंचालक समितिका निर्णयहरु कार्यान्वयन गरी प्राधिकरणलाई सुशासनको मार्गमा डोच्याउने जमर्को गर्दछ । उपरोक्त बाहेक यस निर्देशनालयले सम्पादन गर्ने अन्य कार्यहरु निम्नानुसार रहेका छन् :

१. पदपूर्ति सम्बन्धी कार्य: प्रत्येक वर्ष प्राधिकरणमा रिक्त हुन आएका पदहरुमा नियमानुसार प्रतिशत निर्धारण तथा पद बाँडफाँड गरी लोकसेवा आयोगको सहमतीमा नयाँ नियुक्ति र बढुवाको विज्ञापन प्रकाशन गर्ने, दरखास्त छानविन गर्ने, बढुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने, आयोगबाट लिखित परिक्षाको परिणाम प्राप्त भएपछि मौखिक परिक्षा संचालन गर्ने र सफल उमेदवारहरुलाई नियुक्ति र बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने ।

२. जनसाधन सम्बन्धी कार्य: सिफारिस भै आएका नयाँ कर्मचारीलाई नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने, कर्मचारीको सरुवा गर्ने, कर्मचारीहरुको हाजिरी व्यवस्थापन, अभिलेखाङ्कन, विभागीय कारवाही तथा पुरस्कार प्रदान गर्ने साथै कर्मचारी कल्याण सम्बन्धी कार्य (विमा, औषधी उपचार खर्च तथा ऋण व्यवस्थापन) गर्ने ।

३. सामान्य सेवा सम्बन्धी कार्य: देशभर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा रहेका जग्गाहरुको अभिलेखाङ्कन तथा संरक्षण गर्ने, प्राधिकरणका कार्यालयहरुलाई आवश्यकता अनुसार Logistic Support

उपलब्ध गराउने, सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने, कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने, सवारी साधन व्यवस्थापन गर्ने, कार्यालय माल सामान खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने, सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, माग भएका सूचना उपलब्ध गराउने, प्रकाशन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गुनासो सुन्ने र सो को व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य तथा आकस्मिक भैपरि आउने कार्यको व्यवस्थापन गर्ने ।


४. कानून सम्बन्धी कार्य: नेपाल विद्युत प्राधिकरण विरुद्ध अदालतमा परेका मुद्दाहरु, प्राधिकरणका तर्फबाट गर्नुपर्ने मुद्दाहरुको बहस चैरवी गर्ने, प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई कानूनी सल्लाह उपलब्ध गराउने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विनियमावली, निर्देशिका आदिको निर्माणमा सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी समग्र प्राधिकरणको कानूनी समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने ।

५.१.२. प्रशासन निर्देशनालय अन्तर्गतका विभागीय प्रमुखहरु र महाशाखा प्रमुखहरुका नाम तथा सम्पर्क नं. :

सि.नं	निर्देशनालय /विभाग/महाशाखा	पद	नाम	मोवाइल नं.	मेल ठेगाना
१	प्रशासन निर्देशनालय	उप-कार्यकारी निर्देशक	श्री तुलाराम गिरी	९८५११६८२१९	tularamgiri1@gmail.com
२	कानून विभाग	निर्देशक	श्री वलराम सिलवाल	९८५११३५१३८	legal@nea.org.np
३	जनसाधन विभाग	निर्देशक	श्री शिव कुमार अधिकारी	९८५१०४५८३६	sadhikary361@gmail.com
४	पदपूर्ति विभाग	निर्देशक	श्री बेल प्रसाद शर्मा	९८५११७७९०७	belpdsharma@gmail.com
५	सामान्य सेवा विभाग	निर्देशक	श्री शिव प्रसाद आचार्य	९८४१३२६७४०	spacharya77@gmail.com
६.	कर्मचारी प्रशासन महाशाखा	सह निर्देशक	श्री तुलसी प्रसाद सापकोटा	९८४१६४९५३३	tulsisapkota2030@gmail.com
७	कानून महाशाखा	सह निर्देशक	श्री रमेश कुमार घिमिरे	९८५११९८५९८	rameshkghimire@yahoo.com
८	पदपूर्ति महाशाखा	सह निर्देशक	श्री शोभा पौडेल भुसाल	९८४३७६६९४४	shobhapaudel22@gmail.com
९	कर्मचारी कल्याण महाशाखा	सह निर्देशक	श्री गोपाल प्रसाद पाठक	९८५११५८३३६	gopalpathak7@gmail.com
१०	सामान्य प्रशासन महाशाखा	सह निर्देशक	श्री जमुना कुमारी खड्का	९८४१६६४९१८	khadkajamuna2077@gmail.com
११	सुशासन व्यवस्थापन महाशाखा	प्रमुख	श्री रामप्रसाद पौडेल	९८४९७५७३९५	rampsdpaudel@gmail.com

५.१.३ संगठन संरचना:

Organization Structure of Administration Directorate

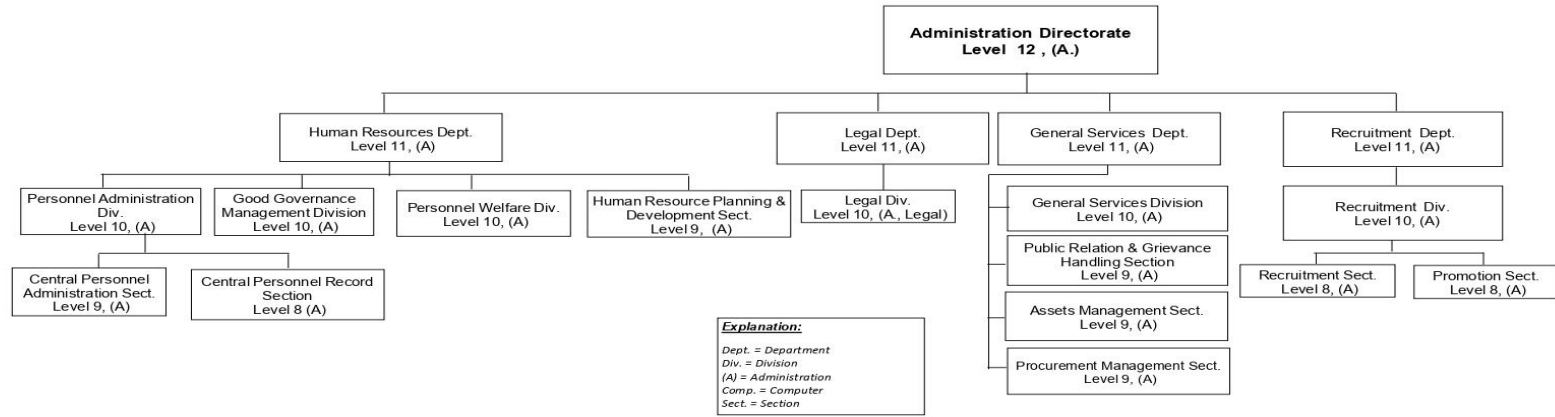

५.२. अर्थ निर्देशनालय:

५.२.१. अर्थ निर्देशनालयका कार्यहरु :

१. नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयबाट संस्थाको वार्षिक बजेट तयार गरी सोको कार्यान्वयन, अनुगमन निरीक्षण तथा नियन्त्रण, आय व्यय विवरण तयारी तथा लगानी व्यवस्थापन सहित केन्द्रीय कोष संचालकको रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने ।


२. यस निर्देशनालय अन्तर्गत संस्थागत वित्तीय विभाग, लेखा विभाग र नियमन अनुपालन विभाग गरी तीन वटा विभाग रहेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कोष संचालकका रूपमा रहेको संस्थागत वित्तीय विभागबाट आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ मा व्यवस्था भएअनुसार विभिन्न उत्पादन केन्द्र, प्रसारण केन्द्र, वितरण केन्द्र, विभाग र आयोजनाको वार्षिक बजेट तयार गरी संचालक समितिबाट स्वीकृति गराई सो अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ । सो कार्यान्वयनका क्रममा स्वीकृत बजेट अनुसारको बजेट निकासा गर्ने तथा सोको अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने।

३. लेखा विभागले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हुने सम्पूर्ण आय व्ययको विवरण तयार गरी अर्ध-वार्षिक र वार्षिकरूपमा वित्तीय विवरण तयार गरी सोको अन्तिम लेखा परीक्षण गराई प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रमाणिकरण गराउने र सो क्रममा देखिएका बेरुज्जहरु सम्बन्धित कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी फछ्छ्यौट गर्ने गराउने कार्य गर्ने।

४. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख रूपमा विद्युत विक्री र अन्य क्रियाकलापबाट संकलन हुने सम्पूर्ण आय रकम केन्द्रीय कोषमा जम्मा गरी सो को आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने ।

५. नेपाल सरकारबाट विकास बजेटका रूपमा प्राप्त हुने शेयर, ऋण, वैदेशिक ऋण/अनुदान बजेट समेतको लगानी व्यवस्थापनका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुमा हुने शेयर तथा ऋण लगानीको पनि व्यवस्थापन गर्ने ।

५.२.२ संगठनात्मक संरचना

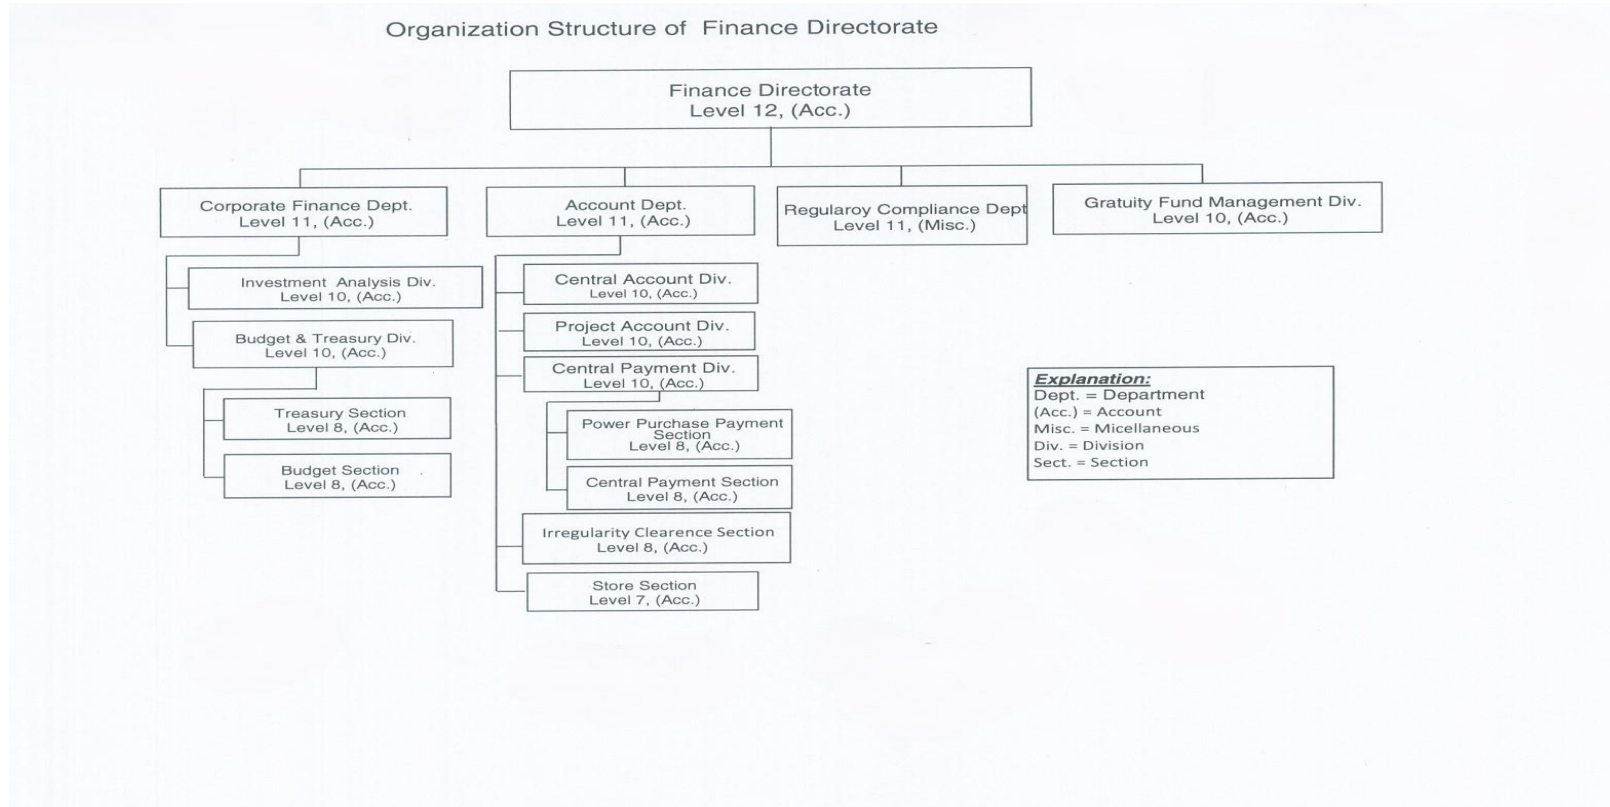

५.२.३. प्रमुखको नाम :

विभागीय प्रमुख तथा महाशाखा प्रमुखहरुको नाम तथा सम्पर्क नम्बर :

सि.नं.	निर्देशनालय/विभाग	पद	विभागीय प्रमुखको नाम	मोबाइल नं.	इमेल ठेगाना
१	अर्थ निर्देशनालय	उप कार्यकारी निर्देशक	नि. प्रमुख राजन ऋषि कडेल	९८४१३४५४२३	
२	लेखा विभाग	निर्देशक	समिर प्रसाद पोखरेल	९८५११६८२१४	sameer.pokharel11@gmail.com
३	संस्थागत वित्तिय विभाग	निर्देशक	गणेश प्रसाद लुईटेल	९८५११२२१३०	
४	नियमन अनुपालन विभाग	निर्देशक	राजन ऋषि कडेल	९८४१३४५४२३	
५	संस्थागत सुदृढिकरण आयोजना	निर्देशक			
६	अवकाश कोष व्यवस्थापन महाशाखा	सह निर्देशक	नारायण धिताल	९८५५०७०००७	
७	केन्द्रिय भुक्तानी महाशाखा	सह निर्देशक	सुशान्त बास्तोला	९८५१२१५२५९	bastolasushant.sb@gmail.com
८	वित्तिय योजना तथा लगानी महाशाखा	प्रमुख	तोलाल सुवेदी	९८५१२७३२०९	
९	बजेट तथा ट्रेजरी महाशाखा	प्रमुख	तिर्थराज न्यौपाने	९८४३१५०४९०	
१०	केन्द्रिय लेखा महाशाखा	प्रमुख	नवराज बस्नेत	९८५१२०२३८९	bnawaraj@gmail.com
११	केन्द्रिकृत लेखाप्रणाली आयोजना	प्रमुख	लोकेन्द्र बहादुर साउद	९८५१०९९१३३	

५.२.४. नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयबाट आ.व. २०८१/२०८२ चैत्र मसान्त सम्म भएका गतिविधिहरु

१.	नेपाल सरकार मार्फत विकास बजेट प्राप्त	आ.व.२०८१/८२ को विनियोजित बजेट रु४ अर्ब ३० करोड ३२ लाख मध्ये २०८१ श्रावण देखि २०८१ चैत्र मसान्तसम्म वैदेशिक तर्फ रु.१ अर्ब ४५ करोड ४५ लाख नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई प्राप्त भएको छ ।
	वैदेशिक श्रोत तर्फको नेपाल सरकारबाट ऋण/अनुदान विकास बजेट प्राप्त	आ.व.२०८१/८२ को विनियोजित बजेट रु४१ अर्ब ५८ करोड ५४ लाख मध्ये २०८१ श्रावण देखि २०८१ चैत्र मसान्तसम्मको कार्य प्रगतिको आधारमा वैदेशिक सोभै भुक्तानी ऋण/अनुदान तर्फ रु.१७ अर्ब २२ करोड ७८ लाख नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई प्राप्त भएको छ ।
	नेपाल सरकार र वैदेशिक मार्फत विकास बजेट खर्च	नेपाल सरकार र वैदेशिक श्रोतबाट प्राप्त विकास बजेट अन्तर्गत चालू आ.व.२०८१/८२ को २०८१ श्रावण देखि २०८१ चैत्र मसान्तसम्म विभिन्न आयोजना र विद्युतिकरण कार्यको लागि ने.वि.प्रा.को तर्फबाट रु.१६ अर्ब ९५ करोड ०३ लाख तथा वैदेशिक सोभै भुक्तानी तर्फ रु.१७ अर्ब २२ करोड ७८ लाख गरेर जम्मा रु. ३४. अर्ब १७ करोड ८१ लाख खर्च भएको छ ।
२	भारततर्फ निर्यात गरिएको विद्युतको विवरण	आ.व. २०८१/०८२ को २०८१ श्रावण देखि २०८१ चैत्र मसान्तसम्म १ अर्ब ७७ करोड ५१ लाख युनिट विद्युत निर्यात गरी जम्मा रु.१३ अर्ब १५ करोड १९ लाख विद्युत बिक्री वापत आम्दानी गरिएको छ ।
३	भारतबाट आयात गरिएको विद्युतको विवरण	आ.व.२०८१/०८२ को २०८१ श्रावण देखि २०८१ चैत्र मसान्तसम्म भारतबाट ९१ करोड ६१ लाख युनिट विद्युत आयात गरी जम्मा रु.९ अर्ब ४२ करोड ९२ लाख विद्युत आयात गरिएको छ ।
४	नेपालका उत्पादकबाट खरिद	आ.व. २०८१/०८२ को २०८१ श्रावण देखि २०८१ चैत्र मसान्तसम्म ने.वि.प्रा.को सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीहरुबाट १ अर्ब ५० करोड ८२ लाख र अन्य निजी उत्पादक कम्पनीहरुबाट ६ अर्ब १६ करोड ६७ लाख गरी जम्मा ७ अर्ब ६७ करोड ४९ लाख युनिट खरिद गरी जम्मा रु.४६ अर्ब ३० करोड ४५ लाख रुपैया बराबरको रकम भुक्तानी भएको छ ।
५	विद्युत बिक्री वापतको आय रकम संकलन	आ.व. २०८१/०८२ को २०८० श्रावण देखि २०८१ चैत्र मसान्तसम्म विद्युत बिक्री वापत रकम संकलन गर्न विभिन्न संकलन केन्द्रहरुका लागि विभिन्न बैंकसँग सम्झौता भई विभिन्न वितरण केन्द्रहरुको विद्युत बिक्री रकम रु.७८ अर्ब ७३ करोड १४ लाख ५३ हजार रहेकोमा सो वापत खुद नगद संकलन रकम रु.७६ अर्ब ६ करोड २९ लाख रहेको छ ।
६	बजेट तथा खर्च तर्फ	आ.व. २०८१/०८२ को २०८१ श्रावण देखि २०८१ चैत्र मसान्तसम्म संचालन संभार खर्च तर्फ रकम रु.८९ अर्ब ७५ करोड ८६ लाख खर्च भएको छ ।
७	आय-व्यय विवरण	आ.व. २०८१/०८२ को २०८१ श्रावण देखि २०८१ चैत्र मसान्तसम्म व्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कुल आम्दानी रकम रु.९८ अर्ब ९५ करोड ६६ लाख रहेकोमा जम्मा खर्च रु.८९ अर्ब ७५ करोड ८६ लाख हुन गई अप्रशोधित नाफा (करकट्टी गर्नुअघि) रु.९ अर्ब १९ करोड ८० लाख हुने अनुमान रहेको छ ।

५.३. उत्पादन निर्देशनालय


५.३.१. पृष्ठभूमी :

नेपाल हिमाल, पहाड र तराई सहितको भौगोलिक विविधता युक्त जलश्रोतको धनी देश भएकोले यहाँका नदी नालाहरुबाट प्रचूर मात्रामा जलविद्युतको उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको सुरुवात वि.स. १९६८ जेठ ९ गते फर्पिङ हाउसबाट भएको र सो सुरुवात भएको ११३ वर्ष पूरा भएको छ । वि.सं. १९६८ सालमा काठमाडौँको फर्पिङमा संचालनमा आएको ५०० कि. वा. क्षमताको जलविद्युत गृह नै नेपालको पहिलो जलविद्युत गृह हो । मुलुकमा विद्युतको उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्य विस्तार हुँदै जाँदा कार्य विशिष्टिकरणका आधारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत निर्देशनालयहरु मध्ये उत्पादन निर्देशनालय पनि एक हो । हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका जलविद्युत गृह, सौर्य र तापीय विद्युत उत्पादन केन्द्रबाट बाट आ.व. ०८०/८१ को अन्त्य सम्म विद्युतको कुल जडित क्षमता ६६१.५७ मेगावाट (Including large, Medium, small isolated, Thermal and solar power plants) रहेको छ । उत्पादन निर्देशनालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका (वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले आफैले हेर्ने बाहेक) विद्युत गृहहरुको संचालन संभार गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।

५.३.२. निर्देशनालयका कार्यहरु :

- क) नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्वयंले निर्माण गरी संचालन गरीरहेका २१ वटा विद्युत गृहहरुको उत्पादन र संचालन संभार सम्बन्धी कार्यको अनुगमन, व्यवस्थापन, निर्देशन लगायत तोकिएको लक्ष अनुसार उर्जा उत्पादन गर्नको लागि विद्युत केन्द्र संचालनमा आइपर्ने समस्याहरुको निराकरणको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने ।
- ख) विद्युत केन्द्र उत्पादन तथा सुदृढीकरण आयोजना संचालनमा बजेटको अभाव हुन नदिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा समन्वय गर्ने ।
- ग) निर्देशनालय अन्तर्गतका तापीय तथा जलविद्युत गृहहरुको नियमित रुपमा अनुगमन र व्यवस्थापन गर्ने ।
- घ) आवश्यकता अनुसार जलविद्युत गृहहरुको सुदृढीकरण र मर्मत संभारको व्यवस्था मिलाउने, बजेट व्यवस्थापन गर्ने ।
- ङ) आफ्नो अन्तर्गतका जलविद्युत गृहहरु अधिकतम क्षमतामा संचालन गरी बढी भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न पहल गर्ने ।
- च) जलविद्युत केन्द्रहरुको दक्षतापुर्वक संचालनको लागि आधुनिकीकरण गर्दै जाने ।
- छ) जलविद्युत केन्द्रमा रहेका सम्पत्तिहरुलाई दीर्घकाल सम्म संचालन गर्न सक्ने क्षमता बृद्धि गर्ने ।
- ज) उपलब्ध स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्नका लागि पुराना जलविद्युत केन्द्रहरुलाई सुदृढीकरण गर्दै लैजाने ।
- झ) ज.वि.केन्द्रहरुमा लगायतका नविनतम सूचना प्रविधिको जडान र उपयोग गर्दै जाने ।
- ञ) निर्देशनालय मातहत रहेका भौतिक सम्पत्तिको अभिलेखिकरण तथा संरक्षणको व्यवस्था गर्ने ।
- ट) निर्देशनालय मातहत रहेका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने ।

५.३.३. निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना :

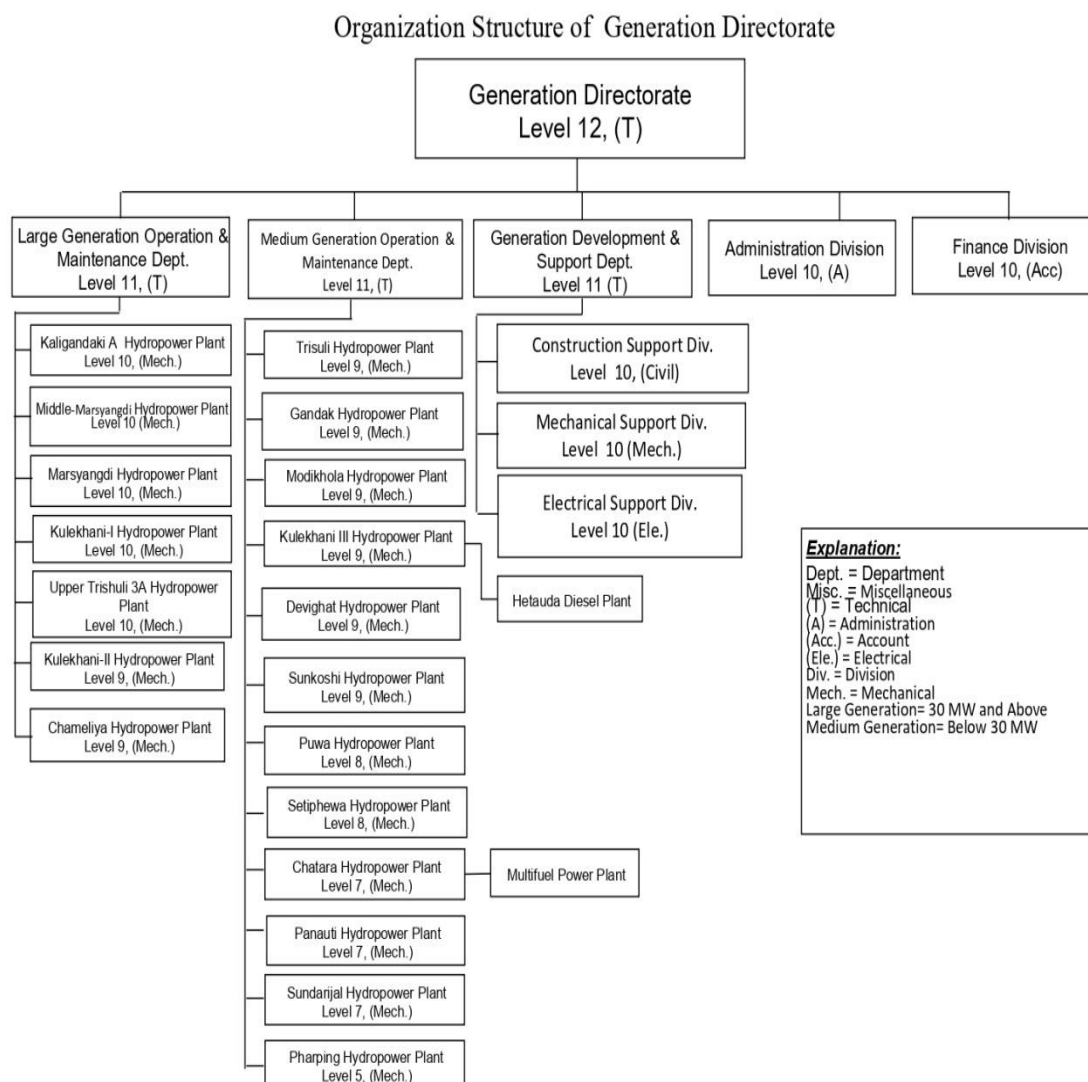

५.३.४. नेपाल विद्युत प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालय अर्न्तगत रहेका जलविद्युत केन्द्र तथा आयोजनाहरुको जडित क्षमता निम्नानुसार छ :

क्र.सं.	विद्युत केन्द्र तथा आयोजनको नाम	जडित उत्पादन क्षमता (मेगावाट)	कैफियत
१	कालीगण्डकी ए ज. वि. केन्द्र	१४४	
२	मध्य मर्स्याङ्दी ज. वि. केन्द्र	७०	
३	मर्स्याङ्दी ज. वि. केन्द्र	६९	
४	कुलेखानी प्रथम ज. वि. केन्द्र	६०	
५	माथिल्लो त्रिशुली ३ ए ज. वि. केन्द्र	६०	
६	दुहवी मल्टीप्यूल केन्द्र	३९	
७	कुलेखानी दोश्रो ज. वि. केन्द्र	३२	
८	चमेलिया ज. वि. केन्द्र	३०	
९	त्रिशुली ज. वि. केन्द्र	२४	
१०	हेटौडा डिजेल केन्द्र	१४.४१	१४.४१
११	कुलेखानी तेस्रो ज. वि. केन्द्र	१४	
१२	गण्डक ज. वि. केन्द्र	१५	
१३	मोदी ज. वि. केन्द्र	१४.८	
१४	देवीघाट ज. वि. केन्द्र	१५	
१५	सुनकोशी ज. वि. केन्द्र	१०.०५	
१६	पुवा खोला ज. वि. केन्द्र	६.२	
१७	चतरा ज. वि. केन्द्र	३.२	
१८	सेती फेवा ज. वि. केन्द्र	२.५	सेती १.५ र फेवा १ मेवा.
१९	पनौती ज. वि. केन्द्र	२.४	
२०	सुन्दरीजल ज. वि. केन्द्र	०.९७	सुदृढीकरण गरी ९७० कि.वा. भएको ।
२१	फर्पिङ ज. वि. केन्द्र	०.५	

५.३.५. निर्देशनालय, विभाग, महाशाखा, आयोजना तथा शाखाका जिम्मेवार अधिकारीको सम्पर्क नम्बर :-

उत्पादन निर्देशनालय र अर्न्तगतका कार्यालय प्रमुखहरुको विवरण						
सि.न.	निर्देशनालय, विभाग, आयोजना तथा केन्द्रको नाम	निर्देशनालय, विभाग, केन्द्र / आयोजना प्रमुख	पद	कार्यालय प्रमुखको सम्पर्क फोन नम्बर	कार्यालयको फोन नम्बर	कैफियत
१	उपकार्यकारी निर्देशक, उत्पादन निर्देशनालय	श्री मदन तिम्सिना	उपकार्यकारी निर्देशक	9851198345	01-4153014	
२	ठूला उ. सं तथा संभार विभाग	श्री राम कुमार यादव	निर्देशक	9855039519	01-4153071	
३	अर्थ महाशाखा प्रमुख	श्री भरत पौडेल	सह-निर्देशक	9841779189	01-4153170	
४	प्रशासन महाशाखा प्रमुख	श्री केशवराज वली	सह-निर्देशक	9851161727	01-4153172	
५	मझौला उ. सं तथा संभार विभाग	श्री कपिलदेव मान्जन	प्रमुख	9846256116	01-4153017	
६	उत्पादन विकास तथा सहायता विभाग	श्री अनिरुद्र पौडेल	निर्देशक	9851083764	01-4153029	
७	कालीगण्डकी ए जलविद्युत केन्द्र	श्री बाबुराजा महर्जन	कार्यालय प्रमुख	9856003144	063-403081	
८	मध्य मर्स्याडदी जलविद्युत केन्द्र	श्री पवन बस्नेत	कार्यालय प्रमुख	9856010073	066-400073	
९	मर्स्याडदी जलविद्युत केन्द्र	श्री पशुपतिराज गौतम	कार्यालय प्रमुख	9856041069	065-540088	
१०	माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजना	श्री सुरेश राउत	आयोजना प्रमुख	9851210400		
११	माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र	श्री धिरेन्द्र कुमार चौधरी	कार्यालय प्रमुख	9851115178	01-6227801	
१२	कुलेखानी प्रथम जलविद्युत केन्द्र	श्री तारादत्त भट्ट	कार्यालय प्रमुख	9855075030	057-419100	
१३	दुहवी मल्टीफ्यूल केन्द्र	श्री पवन घिमिरे	कार्यालय प्रमुख	9852062364	021-421243	
१४	कुलेखानी दोस्रो जलविद्युत केन्द्र	श्री प्रल्हाद राउत	कार्यालय प्रमुख	9855011545/ 9843382277	057-419470	

१५	चमेलिया जलविद्युत केन्द्र	श्री रविकिशोर दत्त	कार्यालय प्रमुख	9851152658	014-153030	
१६	चमेलिया जलविद्युत आयोजना	श्री राम कुमार यादव	निर्देशक	9855039519	01-4153030	
१७	त्रिशुली जलविद्युत केन्द्र	श्री पुरन सोव	कार्यालय प्रमुख	9851160992	010-561095	
१८	देवीघाट जलविद्युत केन्द्र	श्री प्रदिप सिंह	कार्यालय प्रमुख	9851121095	078-520782	
१९	गण्डक जलविद्युत केन्द्र	श्री पिताम्बर भूसाल	कार्यालय प्रमुख	9841068916	078-520782	
२०	मोदीखोला जलविद्युत केन्द्र	श्री सुरेन्द्र कार्की	कार्यालय प्रमुख	9857690500/9855015003	067-410041	
२१	कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत केन्द्र	श्री प्रसन्नमुनी ताम्राकार	कार्यालय प्रमुख	9855011417	057-621417	
२२	कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजना	श्री सुभाष मिश्र	निर्देशक	9851208257/9846256116	010-560803	
२३	ईलेक्ट्रोमेकानिकल वर्कसप तथा निर्माण आयोजना	श्री सुरज दाहाल	आयोजना प्रमुख	9851109474		
२४	जलविद्युत केन्द्र स्वचालन आयोजना	श्री उमङ्ग कार्की	आयोजना प्रमुख	9841040624		
२५	सुनकोशी जलविद्युत केन्द्र	श्री हरिष चन्द्र धिताल	कार्यालय प्रमुख	9851214734/9851245580	011-482155	
२६	पुवाखोला जलविद्युत केन्द्र	श्री शिवकुमार थापा	कार्यालय प्रमुख	9852620351	027-520351	
२७	चतरा जलविद्युत केन्द्र	श्री पवन घिमिरे	कार्यालय प्रमुख	9852062364	025-550077	
२८	पनौती जलविद्युत केन्द्र	श्री शिवराज तिमल्सीना	कार्यालय प्रमुख	9851224809/9841777882	011-410056	
२९	सेतीफेवा जलविद्युत केन्द्र	श्री चिरन्जीवी आर्चाय	कार्यालय प्रमुख	9856041245	061-553245	
३०	सुन्दरीजल जलविद्युत केन्द्र	श्री रविन्द्र कुमार मण्डल	कार्यालय प्रमुख	9842810846	01-4801394	

५.३.६. उत्पादन निर्देशनालय, विभाग, महाशाखा, आयोजना तथा शाखाका सूचना अधिकारीको नामावली :-

उत्पादन निर्देशनालय र अर्न्तगतका सूचना अधिकारीहरु					
सि.न.	निर्देशनालय,विभाग र केन्द्र	सूचना अधिकारीको नाम	तह	पद	सम्पर्क फोन नं.
१	उत्पादन निर्देशनालय ठूला उत्पादन सं.तथा सं.विभाग मझौला उत्पादन सं.तथा सं. विभाग उत्पादन विकास तथा सहायता विभाग फर्पिङ जलविद्युत केन्द्र	श्री गंगा भण्डारी ऐर	६	सहायक क.अधिकृत	९८४१४१००३७
२	कालिगण्डकी ए जलविद्युत केन्द्र	श्री ज्ञानेन्द्र सुवेदी खत्री	७	प्रशासकीय अधिकृत	९७४८२११४१४
३	मध्य मर्स्याङ्दी जलविद्युत केन्द्र	श्री प्रविन कुमार चौधरी	७	इन्जिनियर(ईले)	९८४४४१०९६४
४	मर्स्याङ्दी जलविद्युत केन्द्र	श्री प्रदिप रुपाखेती	६	स.प्रशासकीय अधिकृत	९८५२०२२२२०
५	कुलेखानी प्रथम जलविद्युत केन्द्र	श्री रविन घिमिरे	७	प्रशासकीय अधिकृत	९८४५०३२००२
६	माथिल्लो त्रिशुली ३ए ज.वि.के.	श्री गौरीशंकर प्रसाद चौरसिया	७	प्रशासकीय अधिकृत	९८४९७१९४३८
७	कुलेखानी दोश्रो जलविद्युत केन्द्र	श्री सन्तोष कुमार चौधरी	७	इन्जिनियर(मेका)	९८५२०७५६६६
८	चमेलिया जलविद्युत केन्द्र	श्री दान बहादुर नेपाली	७	प्रशासकीय अधिकृत	९८४८११८५२२
९	त्रिशुली जलविद्युत केन्द्र	श्री दिपक सिग्देल	५	मि.रि.सु.भा.	९८५१३१४७७० ९८५१०१०७७४
१०	देवीघाट जलविद्युत केन्द्र	श्री मुकेश रेग्मी	७	इन्जिनियर(मेका.)	९८६०१८४५६०
११	मोदिखोला जलविद्युत केन्द्र	श्री विनिता कुवँर	६	स.प्रशासकीय अधिकृत	९८४२०५२५६६
१२	गण्डक जलविद्युत केन्द्र	श्री मोहन पण्डीत	५	मि.रि.सु.भा.	९८४४२१८७४४
१३	कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत केन्द्र	श्री ममता कुमारी श्रेष्ठ	६	स.प्रशासकीय अधिकृत	९८६११६८०८६
१४	सुनकोशि जलविद्युत केन्द्र	श्री हरि सुन्दर माझी	६	स. ईन्जिनियर मे.का.	९८४२३४१९२३
१५	पुवाखोला जलविद्युत केन्द्र	श्री अशोक कुमार दास	६	स.ईन्जिनियर (मेका)	९८६२१६१९२९
१६	चतरा जलविद्युत केन्द्र	श्री घनश्याम घिमिरे	५	मि.रि.सु.भा.	९८६२३३८००९
१७	पनौति जलविद्युत केन्द्र	श्री प्रमोद अर्याल	५	मि.रि.सु.भा.	९८४५३००३३२
१८	सेतिफेवा जलविद्युत केन्द्र	श्री प्रदिप सापकोटा	५	मि.रि.सु.भा.	९८५७६४०३३२
१९	सुन्दरीजल जलविद्युत केन्द्र	श्री रविन्द्र कुमार मण्डल	६	स.ईन्जिनियर (मेका)	९८४२८१०८४६

५.३.७. उत्पादन निर्देशनालय मातहत संचालित आयोजनाहरु :

- क) माथिल्लो त्रिशुली ३ए जलविद्युत आयोजनाहाल DLP मा संचालनमा रहेको (केन्द्र स्थापना भैसकेको) ।
- ख) कुलेखानी तेश्रो जलविद्युत आयोजना TOC जारी हुन बाँकी (केन्द्र स्थापना भैसकेको) रहेको ।
- ग) ईलेक्ट्रोमेकानिकल वर्कसप तथा निर्माण आयोजना ।
- घ) जलविद्युत केन्द्र स्वचालन आयोजना

५.३.८. सम्पादन गरेका मुख्य मुख्य कामको विवरण :

1. Kaligandaki A Hydropower Station
 - ✓ Repair, Maintenance & Replacement of Air Compressor and Dewatering Pumps.
 - ✓ Repair & Maintenance of dam site gates & diversion gate roller buckets.
 - ✓ Repair and Maintenance of Excitation Panel Converter & PT fuse of Unit No-1
2. Middle Marsyangdi Hydropower Station
 - ✓ Seal Replacement, Sill beam repair of all three spillway radial gate along with complete overhaul of Desander 1 which includes replacement of sediment flushing system and repair of under sluice gate.
 - ✓ Rehabilitation work on Spillway 1 which include repair of damaged roller bucket, piers and spillway surface
 - ✓ Up gradation of Hydro Turbine governor were performed for optimize performance
3. Marsyangdi Hydropower Station
 - ✓ Overhauling of Unit No-2 (Replacement of runner, wearing rings and facing plates)
 - ✓ Cleaning of all generator air cooler, bearing oil coolers.
 - ✓ Transformer cleaning, oil filtration, generator cleaning & meggering work.
4. Trishuli -3 A Hydropower Station
 - ✓ Repair & Maintenance of 4 Nos. Diversion Spillway Radial Gates and hydraulic structure
 - ✓ Repair & Maintenance of Desander Flushing Gates, Governor OPU gear pump
 - ✓ Repair and Maintenance of damaged stilling basin, Apron of radial Gate 4 of Dam by application of High grade Concrete at Headworks
 - ✓ Dismantling of 132/11kV distribution transformer for Repair & Maintenance
5. Kulekhani First Hydropower Station
 - ✓ Penstock Anchor block-5 saddle bearing alignment work along with painting of penstock
 - ✓ Valve housing drainage maintenance with alternative passage of leakage water
 - ✓ Repair of Jet brake pipelines and VT pumps
 - ✓ Vibration monitoring of both units
 - ✓ Replacement of 5 MVA transformer with 22.5 MVA transformer
 - ✓ Installation of new VCB for Mandu feeder

- ✓ Upgradation of LT line of control room and powerhouse gate area.
6. Kulekhani-Second Hydropower Station
 - ✓ Replacement of faulty winding temperature indicator (WTI) of 37.8 MVA, Main Transformer
 - ✓ Maintenance of Programmable Operation Display (POD) of Unit no.1 Governor Panel
 - ✓ Maintenance of carbon seal filter and seat ring filter
 - ✓ Maintenance of check wall & replacing top layer filter material at Mandu intake
 7. Chameliya Hydropower Station
 - ✓ Replacement of VCB and Spare parts
 - ✓ Repair of Runner, Guide vane, head cover of Unit No- 2
 - ✓ Supply of VT & submersible Pump
 - ✓ Right Bank Protection work of balach-bitule road section and bridge repair and maintenance of karkale
 - ✓ Construction of store building at powerhouse premise.
 8. Trishuli Hydropower Station
 - ✓ Repair and Maintenance of Under sluice Gate Structure at Dam Site (on going work)
 - ✓ Rotor Shaft Machining Work of Unit no 1 (on Progress)
 - ✓ Installation, testing commissioning of 6.6kV Switchgear Breaker, Control & Protection Panel, 18MVA Transformer under the Rehab project
 - ✓ Regular repair work like shaft seal replacement, thrust bearing replacement, intake Trash rack cleaning.
 - ✓ Repair and Maintenance of Trash rack at dam Site
 9. Devighat Hydropower Station
 - ✓ Installation of 11 KV station supply VCB Breaker and cables.
 - ✓ Repair & Maintenance of Power Pack and high Pressure compressor
 - ✓ Construction of Fencing and boundary wall at powerhouse area.
 10. Kulekhani –III Hydropower Station
 - ✓ Clearances of debris, landslides materials completely burying Adit 4 entrance gate and gabion protection works near Adit 4
 - ✓ Replacement of submersible pump of Hetauda Diesel Station for pumping boring water
 - ✓ Construction of rigid pavement RCC road from main gate to office and staff quarters
 11. Modikhola Hydropower Station
 - ✓ Alignment adjustment of tilted power transformer of Unit No-2.
 - ✓ Replacement & adjustment of Jacking & Braking System (Brake Jack) of unit no-2 generator

- ✓ Overhauling works of Unit-2
- ✓ Repair and Maintenance of Intake gates along with replacement of seal and base plate of flushing gates

12. Gandak Hydropower Station

- ✓ Installation of flat seals & J seals at powerhouse stop log gates.
- ✓ Repair & Maintenance of TRCM log jaw at headwork.
- ✓ Routine Maintenance and checking of gears, ropes oil cooler & generator air cooler.

13. Sunkoshi Hydropower Station

- ✓ River Training Works at Powerhouse areas
- ✓ Installation of Motorable Hoist at Damsites (2 pcs of 5T at stoplog gates & 2 pcs of 3T at intake and bypass gates) and 2 pcs of 3T at penstock gates.
- ✓ Testing and Commissioning works of dry type transformer at Powerhouse
- ✓ Changing of shaft seal housing and shaft seal at Unit 1 , Unit 2

14. Ilam Puwa Khola Hydropower Station

- ✓ Unit No.2 Generator Stator Coil repairing works
- ✓ Penstock Rectification Works between Anchor Block No. #3 to 5A
- ✓ Diversion Weir Flushing gate's chute repairing works

15. Chatara Hydropower Station

- ✓ 33 KV line maintenance work at patnali
- ✓ 11 KV colony feeder restoration.
- ✓ Installation of new 50KVA Diesel generator at Powerhouse

16. Setifewa Hydropower Station

- ✓ Repair and Maintenance of 11KV VCB spring charger breaker.
- ✓ Repair & Maintenance of governor along with gas filling on accumulator, changing solenoid valve and AVR panel & thyristor
- ✓ Repair and Maintenance of Desander basin gate, spindle and gearbox bush
- ✓ Replacement of 11KV lighting arrestor and CT.
- ✓ Repair and Maintenance of 50 KVA Transformer and Installation for Station Service at Fewa HPS
- ✓ Installation of 11 KV Link switch and Repair of 11 KV line with changing Lightning Arrester/ Disc/ Pin at at Fewa HPS

17. Panauti Hydropower Station

- ✓ Cleaning of Power house and governor Unit No-1
- ✓ Charging of 110V battery (2*55 v cells)
- ✓ Slope protection work is in progress
- ✓ Tailrace side river bed lowering work

18. Sundarijal Hydropower Station

- ✓ Changing of Switchyard Incomer cable along with other switchyard repair work.

- ✓ Repair and Maintenance of Oil Pressure Unit(OPU)
- ✓ Reservoir cleaning work

19. Pharping Hydropower Station

- ✓ Normal check, repair and maintenance activities of Power house equipment's

५.४. वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय आम विद्युत उपभोक्ताहरूलाई स्तरीय विद्युत सेवा प्रवाह गर्नको लागि केन्द्रीत रहने गर्दछ । यस निर्देशनालयले ७ वटा प्रादेशिक कार्यालय तथा २ वटा प्रदेश डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत रहेका मुलुकभरका १२९ वितरण केन्द्रहरू तथा तिनका उप वितरण केन्द्र र फ्युज सेवाहरू मार्फत विद्युत वितरणको कार्य गर्दै आएको छ । साथै २६ वटा विभिन्न आयोजनाहरू मार्फत वितरण लाइन तथा वितरण सबस्टेशनहरू विस्तार गर्ने र स्तरोन्नतिको कार्य गर्दै आएको यस निर्देशनालयमा ३ वटा विभाग तथा ३ वटा महाशाखाहरू रहेका छन् । यस निर्देशनालयलमा विद्युत प्राधिकरणका कुल जनशक्तिको करिब ६५.३८ प्रतिशत जनशक्ति कार्यरत रहेका छन् । यस निर्देशनालयले विद्युत पहुँच भएका पालिकाको आधारमा ९७.५ र विद्युत पहुँच भएका वडाहरूको आधारमा ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण कार्य गर्न सफल भएको छ भने प्राधिकरणको विद्युत प्रणाली, निजी क्षेत्र तथा वैकल्पिक उर्जा समेत गरी मुलुकभर आ.व. २०८१/०८२ चैत्र मसान्तसम्ममा करिब ९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । आ.व. २०८१/०८२ चैत्र मसान्तसम्म ने.वि.प्रा. तर्फका ५६,२०,३०२ र सामुदायिक विद्युत सहकारी संस्था तर्फका ४,७५,५३९ समेत गरी ६०,९५,८४१ ग्राहकहरूलाई विद्युत सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ । आ.व. २०८१/०८२ चैत्र मसान्तसम्म ८,०७,३५,१८,००० युनिट विद्युत विक्री भई जम्मा विद्युत विक्री बिल रकम रु.७८,७३,१४,५३,००० रहेकोमा रु.७६,०६,२९,७३,००० महशुल संकलन भएको छ ।

५.४.१. निर्देशनालयका कार्यहरू :

यस निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट निम्न बमोजिम कार्यहरू संचालन हुँदै आएको छ ।

क) प्रसारण सम्बन्धी कार्य

- १) ३३ के.भी. प्रसारणलाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन संभार र मर्मत गर्ने ।
- २) ३३/११ के.भी. सबस्टेशन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार र मर्मत गर्ने ।
- ३) ३३/११ के.भी. सबस्टेशन स्तरोन्नती सम्बन्धी संपूर्ण कार्य ।
- ४) ११ के.भी. प्रसारणलाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार र मर्मत गर्ने ।

- ५) वितरण लाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार मर्मत गर्ने ।
- ६) विभिन्न क्षमताका ट्रान्सफर्मरहरु (पावर तथा वितरण) खरिद गर्न लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी खरिद गर्ने साथै जडान, संभार र मर्मत गर्ने ।
- ७) उपरोक्त संरचना निर्माण गर्न जग्गा आवश्यक भएमा जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य गर्ने ।

ख) वितरण सम्बन्धी कार्य

- १) ग्राहकहरुबाट प्राप्त विद्युतको माग फारम लिने ।
- २) माग फारमको आधारमा विद्युत जडानको लागि लागत अनुमान तयार गर्ने ।
- ३) लागत अनुसार रकम लिइ मिटर जडान गर्ने र लाइन चालु गर्ने ।

ग) महशुल संकलन

- १) स्थायी, अस्थायी तथा घुम्ती काउण्टर खडा गरी विद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन गर्ने ।
- २) विभिन्न बैंकहरु मार्फत विद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन गर्ने ।
- ३) ई सेवा मार्फत विद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन गर्ने ।

घ) ग्राहक सेवा सम्बन्धी

- १) मासिक रुपमा मिटर रिडिङ गर्ने ।
- २) नामसारी र ठाउँसारी सम्बन्धित कार्य ।
- ३) विद्युत शक्तीको क्षमता स्वीकृत एवं परिवर्तन सम्बन्धिकार्य ।
- ४) ग्राहकको विवरण राख्ने तथा अध्यावधिक गर्ने कार्य ।
- ५) ग्राहकको बर्गिकरण सम्बन्धी कार्य ।
- ६) मिटर रिडिङ गरेको ६० दिन भित्र पनि ग्राहकले महशुल भुक्तानी नगरेमा बिना सूचना विद्युतको लाइन काट्ने ।

ङ) रिचार्जबल सम्बन्धी कार्य

- ग्राहक वा कुनै संघ संस्थाको माग अनुसार विद्युत प्रसारण तथा वितरण सम्बन्धी कार्यहरु यस कार्यालय मार्फत गर्नु परेमा लाग्ने दस्तुर लिई गरिने कार्य ।

च) विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन २०५८ र विद्युत चोरी नियन्त्रण विनियमावली २०५९ मा तोकिए बमोजिमका कार्यहरु

- १) कसैले अनाधिकृत रुपमा विद्युतको उपयोग गरेमा चोरी नियन्त्रण गर्ने ।
- २) विद्युत चोरी गर्ने व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याइ कानून बमोजिम कारबाहि गर्ने ।
- ३) बिगो र जरिवाना असुल उपर गर्ने ।
- ४) चोरी हुनबाट जोगाउन आवश्यक व्यवस्था अबलम्बन गर्ने ।

छ) विद्युत दुर्घटना क्षतिपूर्ति विनियमावली, २०६७ मा उल्लेख गरिएका कार्यहरु

- १) यस कार्यालयको कारणले विद्युत दुर्घटना हुन गै जनधनको क्षति हुन गएमा छानबिन गर्ने ।
- २) छानबिन बाट क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने ठहरेमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने वा सिफारिस गर्ने ।
- ३) विद्युत दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने र जन धनको क्षति हुन बाट बचाउने ।

ज) सामुदायिक ग्रामिण विद्युतिकरण विनियमावली, २०७१ ले तोकिए बमोजिमका कार्यहरु


- १) वितरक संस्थाबाट प्रस्ताव प्राप्त गर्ने ।
- २) प्रस्तावहरु ने.वि.प्रा.को प्रचलित मापदण्ड बमोजिम छ/ छैन हेर्ने ।
- ३) डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार गर्ने ।
- ४) आवश्यकता अनुसार स्थलगत निरिक्षण गर्ने ।
- ५) मापदण्ड पुरा भएका संस्थाहरुलाई नियमानुसार विद्युत वितरण गर्न आवश्यक व्यवस्था गरी दिने ।

झ) गुनासो व्यवस्थापन कार्य

- १) संघ संस्था वा ग्राहकहरुको गुनासो वा सुझाव प्राप्त गर्ने ।
- २) गुनासो उपर छानबिन गर्ने ।
- ३) छानबिनको आधारमा समस्याको समाधान गर्ने वा कारबाही गर्ने ।

५.४.२. वि.ग्रा.से. निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना

Organization Structure of Distribution and Consumer Services Directorate

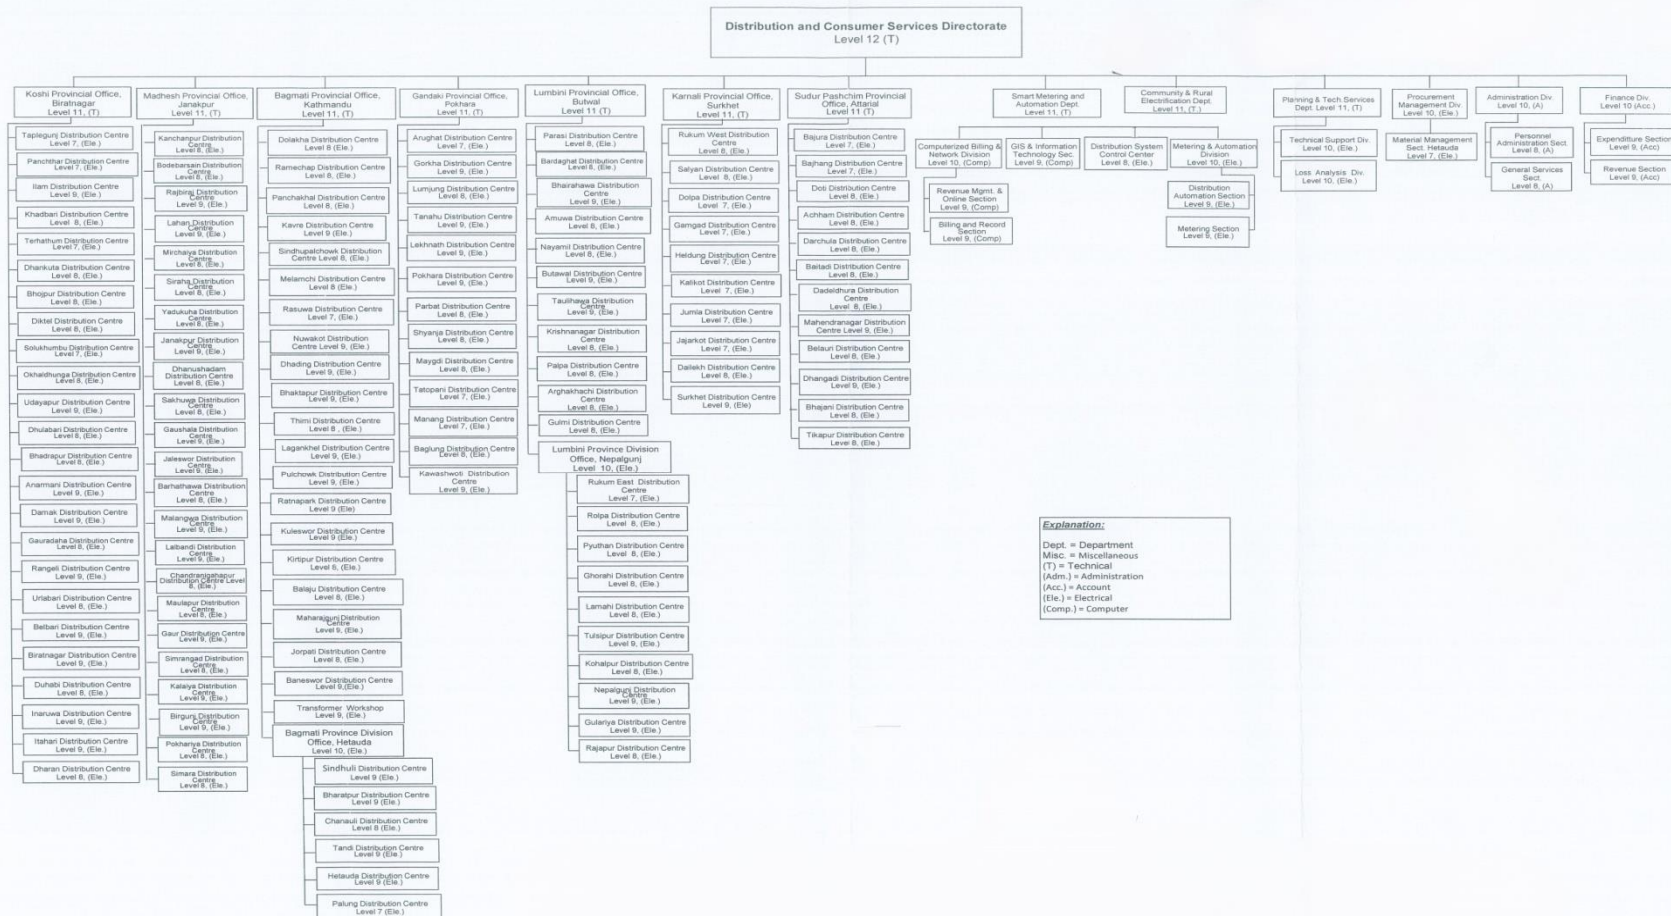

५.४.३. निर्देशनालय, प्रादेशिक/डिभिजन कार्यालय प्रमुख, वितरण केन्द्र प्रमुख र सूचना अधिकारीहरुको विवरण:

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय

क्र.स.	कार्यालय	कार्यालय प्रमुखको नाम	सम्पर्क नं.		सूचना अधिकारीको नाम/पद	मोबाईल नम्बर	इमेल ठेगाना
			मोबाइल नं.	कार्यालयको नंबर			
१	वितरण तथा ग्राहक सेवा नि.	उपकार्यकारी निर्देशक, दीर्घायु कुमार श्रेष्ठ	९८५१२१२०९२	१४१५३१४५	निर्देशक, अच्युत बाबु घिमिरे	९८५१०२४०२१	dcs@nea.org.np
२	योजना तथा प्रा.सेवा विभाग	निर्देशक, अच्युत बाबु घिमिरे	९८५१०२४०२१	१४१५३१५८			planningtech@nea.org.np
३	स्मार्ट मिटरिङ्ग तथा अटोमेशन विभाग	निर्देशक, श्रीराम पोखरेल	९८४१२६३६४१		निर्देशक, श्रीराम पोखरेल	९८४१२६३६४१	smaad@nea.org.np
४	सामुदायिक ग्रामिण वि.विभाग	प्रमुख, जंग बहादुर चन्द	९८४१५००२६८	१४३६००५७	प्रमुख, जंग बहादुर चन्द	०१४९६०६६५ / ९८४१५००२६८	community@nea.org.np
५	प्रशासन महाशाखा, वि.ग्रा.से.नि.	सह निर्देशक डोलनाथ कंडेल	९८५१२३४१४७	१४१५३०५०	सह निर्देशक डोलनाथ कंडेल	९८५१२३४१४७	dcs@nea.org.np
६	अर्थ महाशाखा, वि.ग्रा.से.नि.	सह निर्देशक, साधव भण्डारी	९८५१२७३२०९	१४१५३१४२	सह निर्देशक, साधव भण्डारी	९८५१२७३२०९	dcs.finance@nea.org.np
७	जिन्सी व्यवस्थापन महाशाखा, वि.ग्रा.से.नि.	उप प्रबन्धक प्रज्वल खड्का	९८४३१९४२५१	१४१५३१५२	उप प्रबन्धक प्रज्वल खड्का	९८४३१९४२५१	mmddcsd@gmail.com
८	कम्प्युटराईज्ड विलिङ्ग तथा नेटवर्क महाशाखा,	प्रबन्धक रविन्द्र श्रेष्ठ	९८५११५७४२८	१४१५३१७६	प्रबन्धक रविन्द्र श्रेष्ठ	९८५११५७४२८	billing@nea.org.np

	वि.ग्रा.से.नि.						
क)	कोशी प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय, विराटनगर	मुनिन्द्र ठाकुर	९८५२०७९६६६	०२१-४३६०५७	सहा.निर्देशक नगेन्द्र कुमार श्रेष्ठ	९८४२०३७२२३	biratnagar.ro@nea.org.np
१	विराटनगर वितरण केन्द्र	सरोज कुमार	९८५२०२१७२५	०२१-५२१२०६	श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी	९८४११५१४३	biratnagar@nea.org.np
२	इटहरी वितरण केन्द्र	राम उदगार साह	९८५२०८०८४१	०२५-५८३४५९	श्री सुरज गोसाई	९८६७९८६८७४	itahari@nea.org.np
३	भद्रपुर वितरण केन्द्र	राजमणि बजगाई	९८५२६३०६६६	०२३-४५५६११	श्री भूमि प्रसाद तिवारी	९८४२६३७९७६	bhadrapur@nea.org.np
४	गौरादह वितरण केन्द्र	सागर पोखरेल	९८५२६८५५००	०२३-४८०३४७	श्री प्रविण कुमार चौधरी	९८४५३८६३४१	gauradaha@nea.org.np
५	दमक वितरण केन्द्र	परितोष कुमार चौधरी	९८५२६८२७९७	०२३-५८११६९	श्री शशिकान्त तिवारी	९८४१८२४०६३	damak@nea.org.np
६	इनरुवा वितरण केन्द्र	रेवत कुमार चौधरी	९८५२०७०००७	०२५-५६१९६१	श्री विपिन कुमार कायस्थ	९८५२०४९५३५	inaruwa@nea.org.np
७	रंगेली वितरण केन्द्र	पंकज कुमार गोईत	९८५२०८०६५०	०२१-५८०६५३	श्री कृष्ण शर्मा	९८५२०२८३६५	rangeli@nea.org.np
८	अनारमणी वितरण केन्द्र	संजिव कुमार साह	९८५२६४६१७१	०२३-५४६६५८	श्री विभव पौडेल	९८४१४०१५०१	anarmani@nea.org.np
९	दुहवी वितरण केन्द्र	अभिनव भा	९८५२०४७६६६	०२५-५४०४०३	श्री विजय कुमार सिंह	९८००८२९२९०	duhabi@nea.org.np
१०	उर्लाबारी वितरण केन्द्र	निरज कुमार साह	९८५२०४४१४०	०२१-५४१४७२	श्री भीम गनगाई	९८५२०२७२८८	urlabari@nea.org.np
११	उदयपुर वितरण केन्द्र	माधव प्रसाद यादव	९८५२८३५६६८	०३५-४२०६२९	श्री पुष्कर पौडेल	९८४२०२४३२०	udaypur@nea.org.np
१२	इलाम वितरण केन्द्र	विजली प्रसाद यादव	९८५२६२००५४	०२७-५२१४१७	श्री सरोज कुमार चौधरी	९७६९७२२६५५	illam@nea.org.np
१३	धनकुटा वितरण केन्द्र	रोशन कुमार सिंह	९८५२०७००९१	०२६-५२००९१	श्री विक्रम ठाकुर	९८६७४६१९५१	dhankuta@nea.org.np
१४	धरान वितरण केन्द्र	प्रदिप कुमार शर्मा	९८५२०६२४२१	०२१-५२०४२१	श्री दीपक गुरुङ	९८५२०५०४९८	dharan@nea.org.np
१५	बेलबारी वितरण केन्द्र	पवन कुमार साह	९८५२०४६०८६	०२१-४३४३२५	श्री राजेश कुमार पाण्डे	९८६४४२१२७८	belbari@nea.org.np
१६	भोजपुर वितरण केन्द्र	रामबाबु चौधरी	९८५२०५३७७	०२९-४२०७५२	श्री शान्तिलाल खतिवडा	९८४२८५७५३२	bhojpur@nea.org.np
१७	खांदबारी वितरण केन्द्र	शत्रुघन यादव	९८५२०९९५८८	०२९-५६००७८	श्री दिवश यादव	९८४८८०७३८३	khadbari@nea.org.np

१८	तेहथुम वितरण केन्द्र	प्रतिश ठकाल	९८६२३५९८००	०२६-४१०१११	श्री रमण कुमार पासमान	९८०५३१०३१७	terathum@nea.org.np
१९	ताप्लेजुङ्ग वितरण केन्द्र	सुरेश प्रसाद चौधरी	९८५२६६०४५६	०२४-४६११०२	श्री महेन्द्र राज दुलाल	९८४१३१७१३१	taplejung@nea.org.np
२०	पांचथर वितरण केन्द्र	दिपक कुमार दाहाल	९८५२६८४१७७	०२४-५२००२३	श्री लक्ष्मी प्रसाद रखाळ	९८४२७७२४८९	panchthar@nea.org.np
२१	दिक्तेल वितरण केन्द्र	शोभित बहादुर क्षेत्री	९८५५०११६३६	०३६-४२०७५१	श्री बाबुराम पन्थी	९८४७११७१६१	diktell@nea.org.np
२२	ओखलढुङ्गा वितरण केन्द्र	ईश्वर कुमार श्रेष्ठ	९८५२८४२२६८	०३७-५४०२०५	श्री रसिलाल राउत	९८५२८४४४२६	okhaldhunga@nea.org.np
२३	सोलुखुम्बु वितरण केन्द्र	अशेश्वर कुमार यादव	९८५२८५३२८६	०३८-५२०२२६	श्री विक्रम शाक्य	९८५२८५१२२६	solukhumbu@nea.org.np
२४	धुलावारी वितरण केन्द्र	शम्भु प्रसाद मण्डल	९८५२६६१९९९	०२३-५६०१२१	श्री ज्ञान काफ्ले	९८४४४३०५९५	dhulabari@nea.org.np
ख)	मधेश प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय, जनकपुर	शम्भु कुसियैत यादव	९८५४०२४४७८	०४१-४२४०७८	प्र.अ. काली चरण यादव	९८५२०३५९६३	janakpur.ro@nea.org.np
२५	जनकपुर वितरण केन्द्र	सुनिल कुमार महतो	९८५४०२२६१४	०४१-५२१६१४	सुधिर कुमार राय	९८४४०२२७५१	janakpur@nea.org.np
२६	जलेश्वर वितरण केन्द्र	गजेन्द्र कुमार चौधरी	९८५४०३२३१२	०४४-५२०१६६	चन्द्रिका प्रसाद सिंह	९८५४०३८५३४	jaleshwor@nea.org.np
२७	मलंगवा वितरण केन्द्र	उमेश प्रसाद यादव	९८५४०६५७७७	०४६-५२०३३६	रन्जय कुमार महतो	९८४३६५४६९३	malangawa@nea.org.np
२८	राजविराज वितरण केन्द्र	लखन लला मल्लिक	९८५२८२१४५९	०३१-५२०४५९	श्याम कुमार शर्मा	९८४११४०४२८	rajbiraj@nea.org.np
२९	लाहान वितरण केन्द्र	अवधेश कुमार गुप्ता	९८५२८३३६४६	०३३-५६०६४६	मनोज कुमार साह	९८५५०३८५०१	lahan@nea.org.np
३०	सिराहा वितरण केन्द्र	वासुकी नाथ भ्वा	९८५२८२२२०३	०३३-५२०११५	ई.उदय कुमार कर्ण	९८५२८४४२०३	siraha@nea.org.np
३१	सखुवा वितरण केन्द्र	प्रविण कुमार मिश्र	९८५४०२६३४१	०४१-५४०४६१	शैलेन्द्र सिंह	९८४४१०४४०२	sakhuwa@nea.org.np
३२	मिर्चैया वितरण केन्द्र	मनोज कुमार शर्मा	९८५२८३६५०९	०३३-५५०५०९	हरिओम मानन्धर	९८४२८८५३३६	mirchaiya@nea.org.np
३३	गौशाला वितरण केन्द्र	जगन्नाथ भ्वा	९८५४०३१५६२	०४४-५५६१६५	प्र.प्र. गंगा प्रसाद मंडल	९८४५०३७४३९	gaushala@nea.org.np
३४	लालबन्दि वितरण केन्द्र	त्रिभुवन कुमार यादव	९८५४०६६७७७	०४६-५०१७२९	राम केवल राय यादव	९८४४१४९६६०	lalbandi@nea.org.np

३५	यदुकुवा वितरण केन्द्र	गोपाल कुमार ठाकुर	९८५४०२४३३४	०४१-४१०००९	चन्दन मण्डल	९८६१८००६१८	yadukuha@nea.org.np
३६	कञ्चनपुर वितरण केन्द्र	अरुण कुमार साह	९८५२८६००६९	०३१-५६०१५९	उपेन्द्र महतो	९८४२८१००२९	kanchanpur@nea.org.np
३७	बोदेबर्सार्इन वितरण केन्द्र	संयोग विश्वकर्मा	९८५२८२३४५९		प्रकाश नारायण चौधरी	९८४८४२७२७०	bodebarsain@nea.org.np
३८	धनुषाधाम वितरण केन्द्र	रोशन कुमार सिंह	९८५४०२३०५६	०४१-४१४०७३	शिवशंकर महतो	९८५४०२९०१०	dhanusadham@nea.org.np
३९	बरहथवा वितरण केन्द्र	अञ्जनी कुमार यादव	९८५४०५०४१५		चन्दन कुमार भा	९८४९६८७३६५	barahathawa@nea.org.np
४०	विरगञ्ज वितरण केन्द्र	अवधेश कुमार दुवे	९८५५०२६०३४	०५१-५२२०५०	मुरारी उपाध्याय	९८४५१००८३८	birgunj@nea.org.np
४१	कलैया वितरण केन्द्र	हिमांशु कुमार यादव	९८५५०४९१४९	०५३-५५०५९१	जलन्धर प्रसाद गोठ	९८४१५३०८४७	kalaiya@nea.org.np
४२	सिमरा वितरण केन्द्र	रुमेश रुपाखेती	९८५५०२१०६६	०५३-५२१०६६	ई. श्याम किशोर प्रसाद यादव	९८४५४२९१७५	simara@nea.org.np
४३	गौर वितरण केन्द्र	राम अयोध्या राय यादव	९८५५०४४७७०	०५५-५२१५६६	श्याम किशोर भा	९८५५०००४४४	gaur@nea.org.np
४४	चन्द्रनिगाहपुर वितरण केन्द्र	धिरेंद्र कुमार यादव	९८५५०४१८८२	०५५-५४०२८२	ई. धिरज विक्रम चौधरी	९८६६६६०८५८	chandranigahapur@nea.org.np
४५	पोखरिया वितरण केन्द्र	बुद्धि नाथ भा	९८५५०३८६४४	०५१-५६०००५	दीपक अधिकारी	९८४५८५२७८०	pokharia@nea.org.np
४६	मौलापुर वितरण केन्द्र	राम दिनेश राय यादव	९८५५०४४४५२		धर्मेन्द्र पासवान	९८४५७१८४२४	maulapr@nea.org.np
४७	सिम्रौनगढ वितरण केन्द्र	तैयब अन्सारी	९८५५०४९९९३	०५३-४११०६५	श्याम सुन्दर यादव	९८४५०३३००३	simraungadh@nea.org.np
ग)	बागमती प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय, काठमाडौं	टेकनाथ तिवारी	९८५१२७३७१०	०१-४१५३१५६	स.नि. निर्मला पनेरु	९८४९७०९५४५	kathmandu.ro@nea.org.np
४८	रत्नपार्क वितरण केन्द्र	प्रज्वलमान श्रेष्ठ	९८५१२७३७११	०१-४१५३२५४	प्र.अ.रमिला कोईराला	९८५१२१९६७८	ratnapark@nea.org.np
४९	बानेश्वर वितरण केन्द्र	रोहिणी पौडेल	९८५१३१३३२२	०१-४४६१५२७	बलभद्र भा	९८४९१९५८२१	baneshwor@nea.org.np
५०	लगनखेल वितरण केन्द्र	विजय महतो	९८५१२७३७१३	०१-५५५५६६९	प्र.प्र. श्याम हरि पौडेल	९८४१२०१८७४	lagankhel@nea.org.np

५१	कुलेश्वर वितरण केन्द्र	विरेन्द्र कुमार सिंह	९८५१०५८८००	०१-४२७४८४७	प्र.अ. हरि कृष्ण पाण्डे	९८६३४४०८०८	kuleshwor@nea.org.np
५२	महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र	बाबुराम सुवेदी	९८५१०४४७००	०१-४९८०५३२	सालिकराम खड्का	९८४१५३७६८६	maharajgunj@nea.org.np
५३	भक्तपुर वितरण केन्द्र	राम प्रमोद साह	९८५१२७३७१४	०१-६६११०९८	सत्य नारायण साह	९८४५२५२६६६	bhaktapur@nea.org.np
५४	पुल्चोक वितरण केन्द्र	सुबोध शर्मा	९८५१२७३७१२	०१-५५२३०९६	नविन कुमार यादव	९८५१३३५०५४	pulchowk@nea.org.np
५५	ठिमी वितरण केन्द्र	जयानन्द भ्ना	९८५१२७३७१५	०१-६६३५१०६	ई. राजकुमार कार्की	९८६००४२५५२	thimi@nea.org.np
५६	काभ्रे वितरण केन्द्र	अमृत बाबु अधिकारी	९८५१२७३७१८	०११-६६४७९७	ई. सुरोज पराजुली	९८४९६८४५४३	kavre@nea.org.np
५७	कीर्तिपुर वितरण केन्द्र	सानुबाबु थापा	९८४१४५२८३३	०१-४३३३५३२	नरेन्द्र कुमार साह	९८४०१९६८०९	kirtipur@nea.org.np
५८	धुन्चे वितरण केन्द्र (रसुवा)	गुञ्जमान तामाङ	९८५१२७३७२०	०१०-५४०११३	प्र.प्र. अनिल भट्टराई	९८४३७०३१६१	dhunche@nea.org.np
५९	नुवाकोट वितरण केन्द्र	ईन्द्र बहादुर जि.सी.	९८५११६०१७७	०१०-५६०६७६	प्र.प्र. जनक शर्मा	९८४७८५७४९५	nuwakot@nea.org.np
६०	धादिङ्ग वितरण केन्द्र	सुधिर कुमार राय	९८५११०५१३२	०१०-५२०१३२	प्र.प्र. देवमणी दाहाल	९८४९३२००७९	dhading@nea.org.np
६१	सिन्धुपाल्चोक वितरण केन्द्र	दिपक सापकोटा	९८५१२०७६८६	०११-४८२१३९	संजय प्रजापति	९८४११३४६७५	sindhupalchowk@nea.org.np
६२	दोलखा वितरण केन्द्र	नेत्रमणी न्यौपाने	९८५४०४५७७३	०४९-४२१७७३	समृद्धि भट्टराई	९८१६१८०८०५	dolakha@nea.org.np
६३	जोरपाटी वितरण केन्द्र	ध्रुव राज कार्की	९८५१२७३७१६	०१-५१३४०४६	पवन भट्ट	९८४३६५४८४३	jorpati@nea.org.np
६४	रामेछाप वितरण केन्द्र	दिपेन्द्र बुढाथोकी	९८५१२७३७१९	०४८-५४००६८	प्र.प्र. प्रकाश मैनाली	९८४१९१९७८७	ramechhap@nea.org.np
६५	मेलम्ची वितरण केन्द्र	राजन भण्डारी	९८५१२७३७२१	०११-४०१०४०	अशोक बाबु श्रेष्ठ	९८४६४५३८००	melamchi@nea.org.np
६६	बालाजु वितरण केन्द्र	जय कुमार यादव	९८५१२४८८९६	०१-४३५०९४९	ई. उमेश कंडेल	९८४१४२५००३	balaju@nea.org.np
६७	पांचखाल वितरण केन्द्र	सुनिल सापकोटा	९८५११८०५३५	०११-४९९३०१	सुनिल सापकोटा	९८५११८०५३५	panchkhal@nea.org.np
	ट्रान्सफर्मर वर्कशप शाखा	राजिव कुमार शर्मा	९८५१२७३७१७	०१-४४१०१६५	मनोज बस्याल	९८४७५२८४९३	transformer@nea.org.np

घ)	बागमती प्रदेश डिभिजन कार्यालय, हेटौडा	शशिभूषण साह	९८५५०६८०५२	०५७-५२४४६८	श्री अविनाश महत	९८५५०७०९३४	hetauda.ro@nea.org.np
६८	सिन्धुली वितरण केन्द्र	शिशिर लम्साल	९८५४०४२२५०	०४७-५२९९०५	ई. शत्रुघ्न साह	९८६५०४३८४५	sindhuli@nea.org.np
६९	हेटौडा वितरण केन्द्र	शिवराम यादव	९८६५४०९९५२	०५७-५२५७६८	दिपक के.सी.	९७६५९५९५३०	hetauda@nea.org.np
७०	भरतपुर वितरण केन्द्र	रामु श्रेष्ठ	९८५५०८२३८०	०५६-५२५३८०	नन्द राम विष्ट	९८५५०७८३८०	bharatpur@nea.org.np
७१	रत्ननगर टाँडी वितरण केन्द्र	राजेन्द्र कुमार चौधरी	९८५५०८३६५५	०५६-५६९६५५	मुक्ति कुमारी भट्टराई	९८४९८५४९०४	tandi@nea.org.np
७२	पालुङ्ग वितरण केन्द्र	रुद्रराज विष्ट	९८५५०६७७६८	०५७-४००००२९	राम विलास राय	९८४४००३६५४	palung@nea.org.np
७३	चनौली वितरण केन्द्र	राज कुमार श्रेष्ठ	९८५५०९९३९२	०५६-५९९८९०	सरोज कुमार महतो	९८६०५२९६६९	chanauli@nea.org.np
ङ)	गण्डकी प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय, पोखरा	मनोज कुमार यादव	९८५६०६९५०९	०६९-४६९५००	स.नि.कृष्ण प्रसाद पन्त	९८५९९९८५५८	pokhara.ro@nea.org.np
७४	पोखरा वितरण केन्द्र	जितेन्द्र यादव	९८५६०२४४३५	०६९-५२०४७२	प्रदिप कुमार भुवाजी	९८४९९९२२६९	pokhara@nea.org.np
७५	आरुघाट वितरण केन्द्र	हेमराज चापागाई	९८५६०९३०७७	०६४-४९००७५	मनोज तिवारी	९८४७६४६३५३	aarughat@nea.org.np
७६	स्याङ्गजा वितरण केन्द्र	रमेश बज्जाडे	९८५६०५४८९९	०६३-४२३८९९	प्रेमराज पौडेल	९७४८४३४३६४	syangja@nea.org.np
७७	बाग्लुङ्ग वितरण केन्द्र	पवन पौडेल	९८५७६६६४४४	०६८-५२०८२०	तारानाथ सुवेदी	९८५७६८७४४४	baglung@nea.org.np
७८	म्याग्दी वितरण केन्द्र	सत्य नारायण गामी	९८५७६५५४०३	०६९-५२०४०३	प्रकाश भा	९७४६५७४९०८	myagdi@nea.org.np
७९	तनहु वितरण केन्द्र	विजय राज रेग्मी	९८५६०२७३३३	०६५-५६०२४२	देश बन्धु श्रेष्ठ	९७६२७४७७९०	tanahu@nea.org.np
८०	लेखनाथ वितरण केन्द्र	राजकुमार रमण	९८५६०९००३२	०६९-५६००३२	लोकनाथ आचार्य	९८४७६३२५९७	lekhnath@nea.org.np
८१	पर्वत वितरण केन्द्र	प्रितम राज विष्ट	९८५७६४०९७७	०६७-४२९९३९	अशोक कुमार कर्ण	९८५७६६०९७७	parbat@nea.org.np
८२	तातोपानी वितरण केन्द्र	प्रकाश काफ्ले	९८५७६४५०४९		रमाकान्त पौडेल	९८६७६२७९४८	tatopani@nea.org.np

८३	लमजुङ्ग वितरण केन्द्र	मेघराज भट्टराई	९८५६०७२३२९	०६६-५२९०७७	तेज नारायण आचार्य	९८५६०७४३५०	lamjung@nea.org.np
८४	गोरखा वितरण केन्द्र	चिज बहादुर गुरुङ्ग	९८५६०४३९७७	०६४-४२०४७७	साधुराम तिवारी	९८४९०७९२०७	gorkha@nea.org.np
८५	कावासोती वितरण केन्द्र	शिव नारायण गोशली	९८५७०४९३८८	०७८-५४०७४४	दिनेश श्रेष्ठ	९७६२५६२२९३	kawasoti@nea.org.np
८६	मनाङ वितरण केन्द्र	राजु महतो	९८५६०३७०३९	०६६-५२९०७७	नारायण पौडेल	९८४६७९९०८०	manang@nea.org.np
च)	लुम्बिनी प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय, बुटवल	हरि प्रसाद पाण्डे	९८५७०५८०५५	०७९-४३७९९७	प्र.प्र.भोज राज पोखरेल	९८४९९४३३०८	butwal.ro@nea.org.np
८७	भैरहवा वितरण केन्द्र	संजय कुमार मिश्र	९८५७०९७५५४	०७९-५२०६५४	प्रकाश रोक्का	९८५७०२४८३०	bhairahawa@nea.org.np
८८	बुटवल वितरण केन्द्र	कपिल राज पाण्डे	९८५७०७०५८५	०७९-५४९००२	विनोद खनाल	९८५७०६९२८५	butwal@nea.org.np
८९	परासी वितरण केन्द्र	सुरज रेग्मी	९८५७०४६२४२	०७८-५२०२७८८	रमार्शंकर साह	९८५७०५६५३६	parasi@nea.org.np
९०	पाल्पा वितरण केन्द्र	दिलिप मरासिनी	९८५७०७५५९९	०७५-५२०५९९	श्री गणेश भण्डारी	९८६४४४४२०९	palpa@nea.org.np
९१	गुल्मी वितरण केन्द्र	अर्जुन पोखरेल	९८५७०२६२७५	०७९-५२०२०८	ई. भरत पोखरेल	९८५७०९९२००	gulmi@nea.org.np
९२	तौलिहवा वितरण केन्द्र	गौरव पाण्डे	९७६८२९४९५९	०७६-५६०९९७	श्री श्याम सुन्दर चौधरी	९७६८२९४९६०	taulihawa@nea.org.np
९३	कृष्णनगर वितरण केन्द्र	शुशिल पौडेल	९८०२५३२४३९	०७६-५२००९५	ई. रिजन खाँडा	९८०२५३२४६४	krishnanagar@nea.org.np
९४	अर्घाखाँची वितरण केन्द्र	त्रिलोचन भट्टराई	९८५७०६६८२४	०७७-४२०८२४	खिमराज आचार्य	९८५७०८६७२२	arghakhanchi@nea.org.np
९५	नयाँ मिल वितरण केन्द्र	रितेश गुप्ता	९८५७०४२३७८	०७९-५६००३२	सकुन्तला तिवारी भट्टराई	९८४६९६३२०६	nayamill@nea.org.np
९६	बर्दघाट वितरण केन्द्र	प्रशान्त कुमार भा	९८५७०८९०७३	०७८-५८०८५५	भागीरथ बस्याल	९८५७०८३९८९	bardaghat@nea.org.np
९७	अमुवा वितरण केन्द्र	किरण खनाल	९८५७०९४०८८	०७९-५०९०२८	ई.सुजन आचार्य	९८५७०८५०९४	amuwa@nea.org.np
छ)	लुम्बिनी प्रदेश डिभिजन कार्यालय, नेपालगञ्ज	राजिव कुमार सिंह	९८५८०७२२९९	०८९-५२७४२९	प्र.अ. दुर्गा बहादुर खत्री	९८५८०७२२९७	nepalgunj.ro@nea.org.np

९८	नेपालगञ्ज वितरण केन्द्र	जगन्नाथ लामिछाने	९८५८०५११७७	०८१-५२०२४७	शृजेश प्रसाद	९८५८०३५९११	nepalgunj@nea.org.np
९९	कोहलपुर वितरण केन्द्र	माधव महत	९८५८०४००३९	०८१-५४०६४५	संजिव कुमार राय	९८५८०३५६०१	kohalpur@nea.org.np
१००	रुकुम वितरण केन्द्र (पूर्व)	प्रमोद खनाल	९८५७८५४६२९	०८८-४१३१४३	अनिल चौधरी	९८५८०२५०३८	rukum@nea.org.np
१०१	प्युठान वितरण केन्द्र	महेन्द्र कुमार दास	९८५७८३६४५८	०८६-४६०१५१	ब.स. जित बहादुर चौधरी	९८५७८६८०४२	pyuthan@nea.org.np
१०२	रोल्पा वितरण केन्द्र	अशेश्वर साह	९८५७८८६२४८	०८६-४४०२४८	मदन केसी.	९८६४७१७१७७	rolpa@nea.org.np
१०३	गुलरिया वितरण केन्द्र	नारायण अर्याल	९८५८०३१२६६	०८४-४२०४८९	गान्धी नारायण मण्डल	९८५१३४७८६९	gularia@nea.org.np
१०४	घोराही वितरण केन्द्र	दिवाकर प्याकुरेल	९८५७८६१२०१	०८२-५६१२०१	स.प्र.अ. भवानी चन्द	९८४८७२४४९०	ghorahi@nea.org.np
१०५	तुलसीपुर वितरण केन्द्र	सुरेश कुमार महतो	९८५७८४८५५०	०८२-५२१७५०	शरद अर्याल	९८५७८२६७५०	tulsipur@nea.org.np
१०६	लमही वितरण केन्द्र	युव राज रावत	९८५७८४१११८	०८२-४१७०१८	कमल पुन	९८६४४३०१६४	lamahi@nea.org.np
१०७	राजापुर वितरण केन्द्र	अनिल कुमार चौधरी	९८५८०६०२१३	०८४-४६०२१३	राम कुमार मगर	९८६९५१५६५२	rajapur@nea.org.np
ज)	कर्णाली प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय, सुर्खेत	जितेन्द्र कुमार भा	९८५८०७२३९९	०८३-५२०३२२	प्र.अ. रामचन्द्र चापागाई	९८४८३७०८०६	karnali@nea.org.np
१०८	सुर्खेत वितरण केन्द्र	अशोक लोहनी	९८५८०८४६००	०८३-५२२११७	वेनी नेपाली	९७६६४३५६८२	surkhet@nea.org.np
१०९	सल्यान वितरण केन्द्र	दिनेश पौडेल	९८५७८२२९३०	०८८-५००८०	काली बहादुर बुढाथोकी	९८६६८७११३५	salyan@nea.org.np
११०	दैलेख वितरण केन्द्र	नरेशदत्त रावल	९८५८०२९५००	०८९-४२०२०७	तेज बहादुर भण्डारी	९८४८१२३९९८	dailekh@nea.org.np
१११	डोल्पा वितरण केन्द्र	धर्मपति यादव	९८५२०३१४६०	०८७-५५००८१	ध्रुव बहादुर वि.क.	९८६४७४२२३०	dolpa@nea.org.np
११२	हेलुङ्ग वितरण केन्द्र	जितेन्द्र साह	९८५८३२२१७८	०८७-६८००४६	कृष्ण प्रसाद बली	९८५८३९१९०२	heldung@nea.org.np
११३	गमगाढ वितरण केन्द्र	साजन बहादुर ऐडी	९८५८३२२१३६	०८७-४६०१३६	कृष्ण प्रसाद जैसी	९८५८३२०५८९	gamgad@nea.org.np
११४	कालिकोट वितरण केन्द्र	हरेन्द्र राय यादव	९८५८३२२७०५	०८७-४४०२३६	प्रकाश कुमार शाही	९८४९६६९२००	kalikot@nea.org.np

११५	जाजरकोट वितरण केन्द्र	शंकर सिंह ठकुरी	९८५८०८०३७५	०८३-४३०३७५	शैलेश लुवार	९७६५८०७०१५	jajarkot@nea.org.np
११६	रुकुम वितरण केन्द्र (पश्चिम)	विरमान रास्कोटी	९८५७८३२०३२	०८८-५३०३६५	पारस सुवेदी	९८०२५७४५८३	rukum@nea.org.np
११७	जुम्ला वितरण केन्द्र	राम आपिश साह	९८५८३९१५००	०८७-५२००१४	काली बहादुर महत	९७६२४३७६६७	jumla@nea.org.np
११८	सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय, अत्तरिया	विक्रम कुमार अमात्य	९८५८४८८५५५	०९१-५५१३४१	प्र.अ. भुवनराज भट्ट	९८४८४२३१४३	attaria.ro@nea.org.np
११९	टीकापुर वितरण केन्द्र	कपिल जोशी	९८५८४८५७६१	०९१-५६०२११	राम प्रसाद अधिकारी	९८४८०४२२१७	tikapur@nea.org.np
१२०	महेन्द्रनगर वितरण केन्द्र	चुटुन कुमार श्रीवास्तव	९८५८७८४२२२	०९९-५२०८७३	संगित पौडेल	९७६२४८०६५९	mahendranagar@nea.org.np
१२१	डडेल्धुरा वितरण केन्द्र	रमेश अवस्थी	९८५८७८६७६९	०९६-४२०२६३	व.स. मनोज कुमार रावल	९८४८७७४९१७	dadeldhura@nea.org.np
१२२	धनगढी वितरण केन्द्र	मिथिलेश कुमार गोहिवार	९८५८४२२४५६	०९१-४१७४५६	लोकमान स्वार	९७६५३१९९४४	dhangadi@nea.org.np
१२३	डोटी वितरण केन्द्र	शिवशंकर सोनी	९८५८४४०१८४	०९४-४१२१८३	हर्क बहादुर विष्ट	९८४९२७५२७३	doti@nea.org.np
१२४	बैतडी वितरण केन्द्र	जनार्दन पौडेल	९८५८७८३३३३	०९५-५२०१६४	मोहन बहादुर चन्द	९८४८७७४९११	baitadi@nea.org.np
१२५	दार्चुला वितरण केन्द्र	आनन्द सापकोटा	९८५८७८७३७८	०९३-४२०४९८	पुष्कर बहादुर बम	९८४८८४९४७४	darchula@nea.org.np
१२६	अछाम वितरण केन्द्र	हिक्मत बहादुर वि.सी.	९८५८४२२५२२	०९७-६२५१०५	हिरेन्द्र कुँवर	९८६८८५०२४४	achham@nea.org.np
१२७	भजनी वितरण केन्द्र	गणेश दत्त पाण्डेय	९८५८४८८२३६	०९१-५८००९६	दिपक राज पन्त	९८४८८५९८०९	bhajani@nea.org.np
१२८	बेलौरी वितरण केन्द्र	टंकराज गिरी	९८५८७८५०००	०९९-५८०४६४	हिराचन्द ठकुरी	९८४२६३५१६३	belauri@nea.org.np
१२९	बझाङ्ग वितरण केन्द्र	सुजन खड्का	९८५८४८५६२३	०९२-४२१४९७	प्रमिला चौधरी	९८४८४८३०३३	bajhang@nea.org.np
१३०	बाजुरा वितरण केन्द्र	राजेश कुमार भ्वा	९८५८४८८४५२	०९७-५४१३३२	गुण राज भट्ट	९८५८४८३९१२	bajura@nea.org.np

५.४.४.ने.वि.प्रा., वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गत संचालित आयोजनाहरूको विवरण

सि.नं.	आयोजनाको नाम	आयोजनाको स्थान	आयोजना प्रमुख	पद	मोबाईल नं.
१	ग्रिड सोलार तथा ईनर्जि ईफिसियन्सी आयोजना	त्रिशुली लगायत देशभरका विभिन्न क्षेत्रहरू	श्री अच्युत बाबु घिमिरे (संयोजक)	निर्देशक	९८५१०२४०२१
(क)	Development of 25 MW Grid Solar System Component	त्रिशुली	श्री विकास बहादुर रघुवंशी	उप प्रबन्धक	९८४१२९१२५२
(ख)	Design, Supply, Delivery, Installation, Testing, Commissioning of 33/11 kV S/S & 33 kV Lines-Package-9	देशका विभिन्न क्षेत्रहरू	श्री संगिता कार्की पौड्याल	सहायक प्रबन्धक	९८४१७४९३४९
	Electricity Supply reliability Improvement Project-(Package-9- (Construction of New 33/11kV Substations-Udayapur, Sankhuwasabha, Sunsari, Jhapa) &	उदयपुर, संखुवासभा, सुनसरी, झापा			
	Electricity Supply reliability Improvement Project- Package-12- Consultancy Services (Individuals/Firms)	देशभर			
(ग)	Design, Supply, Delivery, Installation, Testing, Commissioning of 33/11 kV S/S & 33 kV Lines-Package-8	देशका विभिन्न क्षेत्रहरू	श्री गणेश शाह	सहायक प्रबन्धक	९८५१०५३३२६
	Electricity Supply reliability Improvement Project (Package-8- Construction of New 33/11kV Substations-Taplejung, Panchthar, Ilam)	ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर, इलाम			
(घ)	Design, Supply, Delivery, Installation, Testing, Commissioning of Distribution System-Package-11	देशका विभिन्न क्षेत्रहरू	श्री सन्दीप श्रेष्ठ	प्रबन्धक	९८५१००२३००
(ङ)	11/0.4kV Distribution System in Kapilbastu, Gulmi & Arghakhanchi District, Package - 4	कपिलवस्तु, गुल्मी, अर्घाखाँची	श्री प्रवीण ढकाल	ईन्जिनियर	९८५१२२६८११
(च)	Design, Supply, Delivery, Installation, Testing, Commissioning of Distribution System-Package-2,3,10	देशका विभिन्न क्षेत्रहरू	श्री प्रकाश राउत	स. प्रबन्धक	९८५११६५१०२
(छ)	Loss Reduction Master Plan Project	देशभर	श्री दामोदर पराजुली	सहायक प्रबन्धक	९८४११५१९१८
२	सोलुखुम्बु ओखलढुंगा ३३ के.भी. ग्रा.वि. तथा सबस्टेशन आयोजना	सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा			
	Electricity Supply reliability Improvement Project (Package-5 Reinforcement of Distribution Network-Koshi Province)	कोशी प्रदेश			
३	(क) वितरण प्रणाली स्तरोन्नती तथा विस्तार	देशका विभिन्न क्षेत्रहरू	श्री विजय सेन खड्का	उप प्रबन्धक	९८४१५९२६९८

	आयोजना (EIB)				
	(ख) वितरण प्रणाली स्तरोन्नती तथा विस्तार आयोजना(AIIB)	देशका विभिन्न क्षेत्रहरु	श्री धिरेन्द्र कुमार यादव	प्रबन्धक	९८४१४५३४६९
४	वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना	कैलाली, कंचनपुर, भैरहवा, वीरगंज, जगकपुर, भरतपुर, हेटौडा, बर्दिया, दाङ लगायतका विभिन्न अन्य जिल्लाहरुको ३३ के.भि. लाईनहरु	श्री सुरज भुजु	ईन्जिनियर	९८५११५३३५८
५	३३/११ के.भि. सबस्टेशन सुदृढीकरण आयोजना	घोराही, भैरहवा, कावासोती, कलैया, गौर, विरगंज, राजविराज, जगकपुर, मिर्चैया, धरान, इर्नवा, दमक लगायतका विभिन्न सबस्टेशनहरु			
६	३३/११ के.भि. लाइन विस्तार तथा सुदृढीकरण आयोजना	देशका विभिन्न क्षेत्रहरु	श्री सन्दीप श्रेष्ठ	प्रबन्धक	९८५१००२३००
७	Smart Metering Smart Grid आयोजना	वि.ग्रा.से.नि. अन्तर्गतका सम्पूर्ण वि.के.हरु			
८	सिस्टम रिलायबिलिटी एण्ड ३३/११ के.भी. आयोजना	देशका विभिन्न क्षेत्रहरु	श्री मनोज कुमार साह	प्रबन्धक	९८६०१५७६६६
९	GIS Smart Grid आयोजना	वि.ग्रा.से.नि. अन्तर्गतका सम्पूर्ण वि.के.हरु	श्री उत्सव कोईराला	उप प्रबन्धक	९८४१२७५९१०
१०	चौतारा, सिन्धुपाल्चोक ३३ के.भि.प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशन आ.	लामोसांधु, चौतारा, सिन्धुपाल्चोक	श्री अमित कुमार कर्ण	सहायक प्रबन्धक	९८४१८७९५८२
११	मादनकुमारी मकैवारी सिंगटी प्र.ला. तथा स.स. आयोजना ।	माभिफेदा, मुढे, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक			
१२	ट्रान्सफरमर टेष्टिङ ल्याव निर्माण आयोजना	विराटनगर, बुटवल, नेपालगंज			
१३	खोटाङ-भोजपुर-उदयपुर-संखुवासभा ३३ के.भी. प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण आयोजना	खोटाङ, भोजपुर, उदयपुर, संखुवासभा			
	Electricity Supply reliability Improvement Project (Package-1- Feeder Automation Project)	कोशी र मधेश प्रदेश			
१४	मातातिर्थ-माखु ३३ के.भि. प्र.ला. आयोजना	मातातिर्थ, फाखेल, चखेल, सिस्नेरी हुदै माल्टा सम्म ३४ कि.मि. ३३ के.भि. प्र.ला. निर्माण	श्री खिलनाथ अर्याल	ईन्जिनियर	९८५२०६३३५४
१५	मातातिर्थ-माल्टा ३३ के.भि. प्र.ला. आयोजना (उद्योग मन्त्रालय)	मातातिर्थ, चन्द्रगिरी, थानकोट हुदै नौविसे सम्म १५ कि.मि. ३३ के.भि. प्र.ला. निर्माण			
१६	काभ्रे-मकवानपुर-रामेछाप-सिन्धुली ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजना	काभ्रे-मकवानपुर-रामेछाप-सिन्धुली			
१७	Electricity Supply reliability Improvement Project (Package-2- Feeder Automation Project)	बागमती प्रदेश			
१८	खोकनानिजगढ ३३/११ के.भि. स.स. आयोजना	खोकना, निजगढ			
१९	रसुवा नुवाकोट वि.प्र. पुर्ननिर्माण सुधार आयोजना (KFW)	रसुवा, नुवाकोट	श्री प्रकाश राउत	सहायक प्रबन्धक	९८५११६५१०२

१९	खोटाङ-उदयपुर ११/०.४ के.भी. ग्रा.वि. आयोजना	खोटाङ, उदयपुर	श्री बन्नी प्याकुरेल	ईन्जिनियर	९८५११३६८०५
	Electricity Supply reliability Improvement Project (Package-10 Smart Metering Project-Banke/Bardiya)	बाँके, बर्दिया			
२०	नवलपुर गामीण विद्युतीकरण तथा छुसाङ्ग (मुस्ताङ्ग) ३३ के.भी. प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशन निर्माण आयोजना	नवलपुर, मुस्ताङ्ग	श्री विमल राज राउत	ईन्जिनियर	९८५११९८३४३
२१	ताप्लेजुङ्ग-पाँचथर-इलाम-भापा गामीण विद्युतीकरण तथा सबस्टेशन निर्माण आयोजना	ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर, इलाम, भापा	श्री गणेश शाह	सहायक प्रबन्धक	९८५१०५३३२६
२२	भोजपुर-संखुवासभा ११/०.४ के.भी. ग्रामिण विद्युतीकरण आयोजना	भोजपुर र संखुवासभा जिल्ला	श्री प्रवीण ढकाल	ईन्जिनियर	९८५१२२६८११
	Electricity Supply reliability Improvement Project (Package-6 Reinforcement of Distribution Network-Banke, Bardiya, Dang)	बाँके, बर्दिया, दाङ			
२३	दार्चुला-डोल्पा गामीण विद्युतीकरण आयोजना (Package-16-17)	दार्चुला र डोल्पा जिल्ला	श्री अनिल कुमार अधिकारी	सहायक प्रबन्धक	९८५११५२००५
	Electricity Supply reliability Improvement Project (Package-7 Reinforcement of Distribution Network-Kailali, Kanchanpur)	कैलाली, कञ्चनपुर			
२४	सौर्य उर्जा प्रवर्द्धन आयोजना	नेपाल अधिराज्यभर	श्री प्रकाश राउत	सहायक प्रबन्धक	९८५११६५१०२
२५	वितरण प्रणाली भोल्टेज सुधार आयोजना	देशका विभिन्न स्थानहरूमा	श्री राम दुलार यादव	उप प्रबन्धक	
२६	Electricity Supply reliability Improvement Project	देशका विभिन्न स्थानहरू	श्री अच्युत बाबु घिमिरे (संयोजक)	निर्देशक	९८५१०२४०२१
	Electricity Supply reliability Improvement Project Project (Package-11 Smart Metering Project-Kailali/Kanchanpur)	कैलाली, कञ्चनपुर	श्री बसन्तराज नेपाल	ईन्जिनियर	९८५११५०७२२
	Electricity Supply reliability Improvement Project (Package-4- Feeder Automation Project)	सुदुरपश्चिम प्रदेश	श्री डेगराज पौडेल	ईन्जिनियर	९८५२०५९३०४
	Electricity Supply reliability Improvement Project (Package-3- Feeder Automation Project)	बाँके, बर्दिया, कर्णाली	श्री दिपिन ढकाल	सहायक प्रबन्धक	९८४१४५७८१३

अनुसूची-१ विद्युत महशूल दर

१. ग्राहस्थ वर्ग:

१.१ सिंगल फेज तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट)

कि.वा.घण्टा (मासिक)	५ एम्पयर		१५ एम्पयर		३० एम्पयर		६० एम्पयर	
	मसिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)	मसिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)	मसिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)	मसिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)
० देखि २०	३०	०	५०	४१००	७५	५१००	१२५	६१००
२१ देखि ३०	५०	६१५०	७५	६१५०	१००	६१५०	१२५	६१५०
३१ देखि ५०	५०	८१००	७५	८१००	१००	८१००	१२५	८१००
५१ देखि १००	७५	९१५०	१००	९१५०	१२५	९१५०	१५०	९१५०
१०१ देखि २५०	१००	९१५०	१२५	९१५०	१५०	९१५०	२००	९१५०
२५० भन्दा माथि	१५०	१११००	१७५	१११००	२००	१११००	२५०	१११००

नोट : ५ एम्पयरका ग्राहकको हकमा यदि मासिक २० किलोवाट-घण्टा युनिटभन्दा बढी खपत गरेमा १ देखि २० किलोवाट-घण्टा: युनिटसम्मको इनर्जी शुल्क रु ३१०० प्रति युनिटका दरले लाग्ने छ ।

१.२ श्री फेज तल्लो भोल्टेज (४०० भोल्ट)

कि.वा.घण्टा (मासिक)	१० के.भि.ए. सम्म			१० के.भि.ए. भन्दा माथि		
	मसिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)		मसिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)	
		आषाढदेखि कार्तिकसम्म	मंसिरदेखि जेष्ठसम्म		आषाढदेखि कार्तिकसम्म	मंसिरदेखि जेष्ठसम्म
जुनसुकै खपतको लागी	१,१००।००	१०।५०	११।५०	१,८००।००	१०।५०	११।५०

१.३ श्री फेज मझौला भोल्टेज (३३/११ के.भी.)

कि.वा.घण्टा (मासिक)	मसिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा:युनिट)	
		आषाढदेखि कार्तिकसम्म	मंसिरदेखि जेष्ठसम्म
जुनसुकै खपतको लागी	१०,०००।००	१०।५०	११।००

तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट) सिंगल फेज, ५ एम्पियरको बिलिङ्ग गर्ने तरिका

क्र.स	कि.वा.घण्टा (मासिक)	न्यूनतम मासिक शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा)	बिलिङ्ग गर्ने तरिका
१.	० देखि २०	३०	०	२० युनिट सम्म न्यूनतम शुल्क रु.३० लाग्ने र इनर्जी शुल्क वापतको महशुल नलाग्ने । (उदाहरण: ५ युनिट : रु $३०+५\times ०$ = जम्मा रु ३०)
२.	२१ देखि ३०	५०	६१५०	न्यूनतम शुल्क रु. ५० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: २५ युनिट : रु $५०+२०\times ३+५\times ६१५०$ = जम्मा रु. १४२१५०)
३.	३१ देखि ५०	५०	८१००	न्यूनतम शुल्क रु. ५० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८१०० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: ३५ युनिट : रु $५०+२०\times ३+१०\times ६१५०+५\times ८१००$ = जम्मा रु. २१५१००)
४.	५१ देखि १००	७५	९१५०	न्यूनतम शुल्क रु. ७५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८ र ५१ युनिटदेखि १०० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ९१५० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: ५५ युनिट : रु $७५+२०\times ३+१०\times ६१५०+२०\times ८+५\times ९१५०$ = जम्मा रु. ४०७५०)
५.	१०१ देखि २५०	१००	९१५०	न्यूनतम शुल्क रु. १०० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८ र ५१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ९१५० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: १०५ युनिट : रु $१००+२०\times ३+१०\times ६१५०+२०\times ८+(५०+५)\times ९१५०$ = जम्मा रु. ९०७५०)
६.	२५० माथि	१५०	१११००	न्यूनतम शुल्क रु. १५० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८ र ५१ युनिटदेखि १५० प्रति युनिट रु. ९१५० र १५१ देखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. १० र २५१ देखि ४०० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ११ का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: २५५ युनिट : रु $१५०+२०\times ३+१०\times ६१५०+२०\times ८+(५०+१५०)\times ९१५०+५\times १११००$ = जम्मा रु. २३९०१००)

तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट) सिंगल फेज, १५ एम्पयरको बिलिङ्ग गर्ने तरिका

क्र.स	कि.वा.घण्टा (मासिक)	न्यूनतम मासिक शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा)	बिलिङ्ग गर्ने तरिका
१.	० देखि २०	५०	४१००	२० युनिट सम्म न्यूनतम शुल्क रु.५० लाग्ने र इनर्जी शुल्क प्रति युनिट रु. ४१०० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: ५ युनिट : रु ५०+५X४ = जम्मा रु.७०१००)
२.	२१ देखि ३०	७५	६१५०	न्यूनतम शुल्क रु. ७५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: २५ युनिट : रु ७५+२०X४+५X६१५० = जम्मा रु १८७५०)
३.	३१ देखि ५०	७५	८१००	न्यूनतम शुल्क रु. ७५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.८१०० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: ३५ युनिट : रु ७५+२०X४+१०X६१५०+५X८ = जम्मा रु.२६०१००)
४.	५१ देखि १००	१००	९१५०	न्यूनतम शुल्क रु. १०० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.४१०० र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८ र ५१ युनिटदेखि १०० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ९१५० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: ५५ युनिट : रु १००+२०X४+१०X६१५०+२०X८+५X९१५० = जम्मा रु ४५२१५०)
५.	१०१ देखि २५०	१२५	९१५०	न्यूनतम शुल्क रु. १२५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.४ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.८ र ५१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ९१५० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: १०५ युनिट : रु १२५+२०X४+१०X६१५०+२०X८+(५०+५)X९१५० = जम्मा रु.९५२१५०)
६.	२५० माथि	१७५	१११००	न्यूनतम शुल्क रु. १७५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.४ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८ र ५१ युनिटदेखि १५० प्रति युनिट रु. ९१५० र १५१ देखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. १० र २५१ देखि ४०० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ११ का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: २५५ युनिट : रु १७५+२०X४+१०X६१५०+२०X८+ (५०+१५०)X९१५०+ ५X१११०० = जम्मा रु.२४३५१००)

यसै तरिकाले ३० र ६० एम्पयरका सिंगल फेजको बिलिङ्ग गर्ने ।

२. अन्य उपभोक्ता

२.१ तल्लो भोल्टेज स्तर (२३०/४०० भोल्ट)

क्र.सं	उपभोक्ता वर्ग	डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति के.भि.ए. प्रति महिना)	ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा: युनिट)
१.	औद्योगिक		
	क. ग्रामीण तथा घरेलु उद्योग	६०१००	७८०
	ख. साना उद्योग	११०१००	९१६०
२.	व्यापारिक	३२५१००	१११२०
३.	गैह्व व्यापारिक	२१५१००	१२१००
४.	सिंचाई	०	२१२५
५.	खानेपानी		
	क. सामुदायिक खानेपानी	०	४१२०
	ख. अन्य खानेपानी	१६०१००	७२०
६.	यातायात		
	क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२००१००	५१७५
	ख. अन्य यातायात	२२०१००	८१९०
७.	धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्थल	०	६१९०
८.	सडक बत्ती		
	क. मिटर जडान भएको	०	७३०
	ख. मिटर जडान नभएको	२४७५१००	०
९.	अस्थायी कनेक्सन	०	१९१८०
१०.	गैह्व ग्राहस्थ	३५०१००	१३१००
११.	मनोरञ्जन व्यवसाय	३५०१००	१४१००

२.२ माथिल्लो भोल्टेज स्तर

क्र.सं	उपभोक्ता वर्ग	डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति के.भि.ए. प्रति महिना)	ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा: युनिट)
अ.	माथिल्लो भोल्टेज		
१.	औद्योगिक (१३२ के.भी)	२३०१००	८१२०
२.	औद्योगिक (६६ के.भी)	२४०१००	८१३०
आ.	मझौला भोल्टेज (३३ के.भी.)		
१.	औद्योगिक	२५५१००	८१४०
२.	व्यापारिक	३१५१००	१०१८०
३.	गैह्व व्यापारिक	२४०१००	१११४०
४.	सिंचाई	०	२१५०
५.	खानेपानी		
	क) सामुदायिक खानेपानी	०	४१६०
	ख) अन्य खानेपानी	१६०१००	६१६०
६.	यातायात		
	क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन	२३०१००	५१६०

	समेत)		
	ख) अन्य यातायात	२५५१००	८१६०
७.	गैह्र ग्राहस्थ	३५०१००	१२१५५
८.	मनोरञ्जन व्यवसाय	३५०१००	१३१५०
इ.	मझौला भोल्टेज (११ के.भी.)	डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति के.भि.ए. प्रति महिना)	ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा:युनिट)
१.	औद्योगिक	२५५१००	८१६०
२.	व्यापारिक	३५५१००	११११०
३.	गैह्र व्यापारिक	२४०१००	१११५०
४.	सिंचाई	०	२१६०
५.	खानेपानी		
	क) सामुदायिक खानेपानी	०	४१८०
	ख) अन्य खानेपानी	१५०१००	६१८०
६.	यातायात		
	क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२३०१००	५१६०
	ख) अन्य यातायात	२५५१००	८१८०
७.	धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्थल	२२०१००	९१९०
८.	अस्थायी कनेक्सन	३३०१००	१२१००
९.	गैह्र ग्राहस्थ	३५०१००	१२१९०
१०.	मनोरञ्जन व्यवसाय	३५०१००	१३१९०

३. टाइम अफ डे(टि.ओ.डी) महशुल दर

३.१. वैशाख देखि मंसिरसम्मको विद्युत महशुल दर

क्र.सं	उपभोक्ता वर्ग	डिमान्ड शुल्क (रु. प्रति के.भि.ए. प्रति महिना)	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा:युनिट)		
			पिक समय (साँझ ५:०० बजे देखि राति ११:०० बजेसम्म)	अफ पिक समय (राति ११:०० बजे देखि बिहान ५:०० बजेसम्म)	अन्य समय (बिहान ५:०० बजे देखि साँझ ५:०० बजे सम्म)
अ.	माथिल्लो भोल्टेज				
१	औद्योगिक (१३२ के.भी.)	२३०१००	१०१००	४१६५	८१२०
२	औद्योगिक (६६ के.भी.)	२४०१००	१०११०	४१७५	८१३०
आ.	मझौला भोल्टेज (३३ के.भी.)				
१	औद्योगिक	२५०१००	१०१२०	५१२५	८१४०
२	व्यापारिक	३५५१००	१२१३०	६१७५	१०१८०
३	गैर व्यापारिक	२४०१००	१३१२०	७१००	१२१००
४	सिंचाई	०	६१३०	२१००	३१००
५	खानेपानी				
	क) सामुदायिक खानेपानी	०	६१२०	३११०	४१६०
	ख) अन्य खानेपानी	१५०१००	१०१२०	५१२५	८१४०

६	यातायात				
	क) सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२३०१००	७००	३१७०	५१५०
	ख) अन्य यातायात	२५५१००	९१३५	३१७०	८१४०
७	सडक बत्ति	८०१००	८१४०	३१५०	४१२०
इ.	मभौला भोल्टेज (११ के.भी.)				
१	औद्योगिक	२५०१००	१०१५०	५१४०	८१५५
२	व्यापारिक	३१५१००	१२१६०	६१९०	११११०
३	गैर व्यापारिक	२४०१००	१३१५०	७१५	१२१२५
४	सिंचाई	०	६१४०	२१००	३११०
५	खानेपानी				
	क. सामुदायिक खानेपानी	०	६१३०	३१४०	४१७०
	ख. अन्य खानेपानी	१५०१००	१०१५०	५१४०	८१५०
६	यातायात				
	क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२३०१००	७१५	४१२०	५१६०
	ख. अन्य यातायात	२५५१००	९१६५	४१२०	८१५०
७	सडक बत्ति	८०१००	८१८०	३१७५	४१४०
८	धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्थल	२२०१००	१११३०	५११५	९११०
९	अस्थायी	३३०१००	१४१४०	६१६०	१११७५
ई.	तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)				
१	यातायात				
	क)सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२००१००	७२५	४१३०	५१७५
	ख) अन्य यातायात	२२०१००	९१७५	४१३०	८१६०

३.२. पौषदेखि चैत्र महिना सम्मको विद्युत महशुल दर

क्र.सं	उपभोक्ता वर्ग	डिमान्ड शुल्क (रु. प्रति के.भि.ए. प्रति महिना)	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा:युनिट)	
			पिक समय (साँझ ५:०० बजे देखि राति ११:०० बजेसम्म)	अन्य समय (राति ११:०० बजे देखि भोलिपल्ट साँझ ५:०० बजेसम्म)
अ.	माथिल्लो भोल्टेज			
१	औद्योगिक (१३२ के.भी.)	२३०१००	१०१००	८१२०
२	औद्योगिक (६६ के.भी.)	२४०१००	१०११०	८१३०
आ.	मभौला भोल्टेज (३३ के.भी.)			
१	औद्योगिक	२५०१००	१०१२०	८१४०
२	व्यापारिक	३१५१००	१२१३०	१०१८०
३	गैर व्यापारिक	२४०१००	१३१२०	१२१००

४	सिंचाई	०	६३०	३१००
५	खानेपानी			
	क) सामुदायिक खानेपानी	०	६२०	४६०
	ख) अन्य खानेपानी	१५०१००	१०१२०	८१४०
६	यातायात			
	क)सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२३०१००	७००	५१५०
	ख) अन्य यातायात	२५५१००	९१३५	८१४०
७	सडक बत्ति	८०१००	८१४०	४१२०
इ.	मभौला भोल्टेज (११ के.भी.)			
१	औद्योगिक	२५०१००	१०१५०	८१५५
२	व्यापारिक	३१५१००	१२१६०	११११०
३	गैर व्यापारिक	२४०१००	१३१५०	१२१२५
४	सिंचाई	०	६१४०	३११०
५	खानेपानी			
	क) सामुदायिक खानेपानी	०	६३०	४१७०
	ख) अन्य खानेपानी	१५०१००	१०१५०	८१५०
६	यातायात			
	क)सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२३०१००	७११५	५१६०
	ख) अन्य यातायात	२५५१००	९१६५	८१५०
७	सडक बत्ति	८०१००	८१८०	४१४०
८	धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्थल	२२०१००	१११३०	९११०
९	अस्थायी	३३०१००	१४१४०	१११७५
ई.	तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)			
१	यातायात			
	क)सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२००१००	७१२५	५१७५
	ख) अन्य यातायात	२२०१००	९१७५	८१६०

३.३. डिमाण्ड शुल्क नलाग्ने टाइम अफ डे(टि.ओ.डी) यातायात उपभोक्ताको (Automatic Swap Card)विद्युत महशुल दर

१. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)

वैशाख देखि मंसिरसम्मको विद्युत महशुल दर

विवरण	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति किलोवाट-घण्टा:युनिट)		
	पिक समय (साँझ ५:०० बजे देखि राति ११:०० बजेसम्म)	अफ पिक समय (राति ११:०० बजे देखि बिहान ५:०० बजेसम्म)	अन्य समय (बिहान ५:०० बजे देखि साँझ ५:०० बजे सम्म)
३३ के.भी.	८।४०	४।४५	६।६०
११ के.भी.	८।६०	५।०५	६।७०
तल्लो भोलेज (२३०/४०० भोलेट)	८।७०	५।०५	६।९०

पौष देखि चैत्रसम्मको विद्युत महशुल दर

विवरण	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति किलोवाट-घण्टा:युनिट)	
	पिक समय (साँझ ५:०० बजे देखि राति ११:०० बजेसम्म)	अन्य समय (राति ११:०० बजे देखि भोलिपल्ट साँझ ५:०० बजेसम्म)
३३ के.भी.	८।४०	६।६०
११ के.भी.	८।६०	६।७०
तल्लो भोलेज (२३०/४०० भोलेट)	८।७०	६।९०

२) अन्य यातायात

वैशाख देखि मंसिरसम्मको विद्युत महशुल दर

विवरण	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति प्रति किलोवाट-घण्टा:युनिट)		
	पिक समय (साँझ ५:०० बजे देखि राति ११:०० बजेसम्म)	अफ पिक समय (राति ११:०० बजे देखि बिहान ५:०० बजेसम्म)	अन्य समय (बिहान ५:०० बजे देखि साँझ ५:०० बजे सम्म)
३३ के.भी.	११।२०	४।४५	१०।१०
११ के.भी.	११।६०	५।०५	१०।२०
तल्लो भोलेज (२३०/४०० भोलेट)	११।७०	५।१५	१०।३०

पौष देखि चैत्र सम्म लागने विद्युत महशुल दर

विवरण	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति प्रति किलोवाट-घण्टा:युनिट)	
	पिक समय (साँझ ५:०० बजे देखि राति ११:०० बजेसम्म)	अन्य समय (राति ११:०० बजे देखि भोलिपल्ट साँझ ५:०० बजेसम्म)
३३ के.भी.	११।२०	१०।१०
११ के.भी.	११।६०	१०।२०
तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)	११।७०	१०।३०

नोट:

१. चार्जिङ्ग स्टेशन सञ्चालकले विद्युतिय सवारी साधनलाई चार्जिङ्ग सेवा दिएबापत उपरोक्त महशुल दरमा प्रति किलोवाट-घण्टा: युनिटमा अधिकतम २० प्रतिशतसम्म थप गरी लिन पाउने छ ।
२. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत): प्रचलित कानून बमोजिम भाडादर निर्धारण हुने सार्वजनिक यातायातको रुपमा ट्रलिवस र सार्वजनिक सवारी साधनमा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिक बस / मिनिबस, सफा टेम्पो एवम् अन्य सवारी साधनको ब्याट्री चार्ज गर्न विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने चार्जिङ्ग स्टेशनका उपभोक्ताहरु ।
३. अन्य यातायात : प्रचलित कानून बमोजिम भाडादर निर्धारण हुने सार्वजनिक यातायातका साधन जस्तै : केबलकार, रोपवे, मेट्रो आदि र अन्य विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरु ।

४. सामुदायिक थोक उपभोक्ता :

क्र.सं	उपभोक्ता वर्ग	मासिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति किलोवाट-घण्टा:युनिट)
अ.	मझौला भोल्टेज (११ के.भि./३३ के.भि.)		
	N X २० युनिट सम्म (मासिक)	N X ३०	०
	N X २० युनिट भन्दा माथि (मासिक)		६।००
आ.	तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)		
	N X २० युनिट सम्म (मासिक)	N X ३०	०
	N X २० युनिट भन्दा माथि (मासिक)		६।२५

नोट:

- १) N = सम्बन्धित सामुदायिक थोक उपभोक्ता अर्न्तगत रहेका कुल उपभोक्ता संख्या ।
- २) यस तालिका बमोजिमको महशुल सामुदायिक थोक उपभोक्ताले ने.वि.प्रा. लाई मासिक रुपमा बुझाउनु पर्नेछ ।

अनुसूचि-२
अन्य दस्तुर तथा सेवा शुल्क

सेवा	दररेट (रु.)
१. आवेदन फाराम	
क) ग्राहस्थ तर्फ	१००
ख) अन्य ग्राहक	२००
ग) अन्य प्रयोजनको निवेदनमा	१०
२. फ्यूज सेवा:	
क) सिंगल फेज रु.	१००
ख) थ्रि फेज	२००
३. मिटर सिल लगाउँदा	
क) वाकसको सिल	
१) ग्राहकले निवेदन दिएकोमा	२००
२) कार्यालयले फेला पारेमा	५००
ख) अन्य सिल	
१) टर्मिनल सिल	४००
२) रिडिङ सिल	१०००
३) सि.टि./पि.टि. सिल	१०००
४. नयाँ वस्ति जडान गर्दा:	
४.१ ग्राहस्थ वर्ग (इनर्जी मिटर क्षमता)	
क) ५ एम्पियर	१००
सेवा	दररेट (रु.)
ख) १५ एम्पियर	१५०
ग) ३० एम्पियर	३००
घ) ६० एम्पियर	५००
ड) थ्रि फेज	१०००
४.२ अन्य ग्राहक	
क) १० के.भि.ए. सम्मको	१०००
ख) १० के.भि.ए. भन्दा माथि	१५००
ग) टिओडि मिटर	१५००
५. पोल जडान गर्नु परेमा:	
क) सिंगल फेज प्रति पोलको	५००
ख) थ्रिफेज प्रति पोलको	१०००
६. मिटरको क्षमता थपघट गर्दा:	
६.१ सिंगल फेज:	
क) मिटरको क्षमता बढाउँदा	०
ख) मिटरको क्षमता घटाउँदा	३००
६.२ थ्रिफेज:	
क) मिटरको क्षमता बढाउँदा	०
ख) मिटरको क्षमता घटाउँदा	५००
७. विद्युत सप्लाई काट्ने र पुनः जोड्ने (सिंगल फेज/थ्रि फेज)	
क) लाइन काट्ने परेमा	२५०


ख) लाइन जोड्न परेमा	५००
८. ठाउँ सारी गर्दा:	
क) सिंगल फेज	७००
ख) थ्रिफेज	१०००
९. नामसारी गर्दा:	
क) ग्राहस्थ:	
१. अंशवण्डा भएको कारणले लिखित आधारमा नामसारी गरी दिनु पर्दा	५००
२. घर विक्री भएको अवस्थामा लिने दिने दुवैको रोहवरमा हक हस्तान्तरण गर्दा	१०००
३. खरिद विक्री भै घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुने अवस्थामा पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी नामसारीको कारवाही गर्नु पर्दाको अवस्थामा	१५००
ख) औद्योगिक र अन्य	२०००
१०. मिटर टेष्टिङ:	
क) सिंगल फेज	५००
ख) थ्रिफेज	१०००
ग) टिओडि मिटर	२०००
घ) सबमिटर	५००
ड) सि.टि. मिटर	१५००
११. लगत खारेज दस्तुर:	
क) सिंगल फेज	५००
ख) थ्रिफेज	१०००

५.५. प्रसारण निर्देशनालय :

५.५.१. प्रसारण निर्देशनालयको कार्य विवरण :

- नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित तथा अन्य मुलुकबाट आयातित विद्युत शक्तिलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो रूपमा नेपाल राज्य भर प्रसारण गर्नको लागि आफू अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरुलाई परिचालन गर्ने । हाल ६६ के.भी. देखि ४०० के.भी. सम्मका प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशनको योजना विकास सञ्चालन तथा सम्भार गर्ने जिम्मेवारी यस निर्देशनालयले वहन गर्दछ ।
- यस निर्देशनालय अन्तर्गत निर्माण गरिने प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशन आयोजनाहरु निर्माणको लागि विस्तृत संभाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरि सो पश्चात आयोजनाहरु निर्माण आरम्भ गर्न बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का सम्झौता, निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्न स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरि आवश्यक निर्देशन दिने, बजेट निकासी दिने तथा बजेट अपुग भएमा थप बजेट व्यवस्थापनको लागि प्रकृया अगाडि बढाउने लगायतका अन्य कार्यहरुमा सहजीकरण गर्ने ।
- यस निर्देशनालय अन्तर्गतका देहायका विभाग र विभागस्तरका कार्यालयहरु रहेका छन् :
 - * ग्रिड सञ्चालन विभाग:- विभिन्न स्तरका ग्रिड संरचनाको सञ्चालन तथा सम्भार गर्ने ।
 - * विद्युत प्रणाली सञ्चालन विभाग:- विद्युत प्रणालीलाई दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने ।
 - * उच्च भोल्टेज ग्रिड विकास विभाग:- १३२ के.भी.भन्दा माथि ४०० के.भी.सम्मका नयाँ प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशनको योजना निर्माण सुपरीवेक्षण तथा हस्तान्तरण गर्ने ।
 - * मध्यम भोल्टेज ग्रिड विकास विभाग:- ६६ के.भी.देखि १३२ के.भी.सम्मका नयाँ प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशनको योजना निर्माण सुपरीवेक्षण तथा हस्तान्तरण गर्ने ।
- विद्युत प्रसारणको लागि आवश्यकता अनुसार ६६ के.भी.देखि ४०० के.भी.सम्मका विभिन्न प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशन आयोजनाहरु निर्माण विस्तार एवं स्तरोन्नतीको कार्यहरु गर्ने ।
- प्राविधिक अध्ययनको आधारमा Congestion भएका प्रसारणलाइनहरु तथा Over load हुने सबस्टेशनहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।

५.५.२. प्रसारण निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना

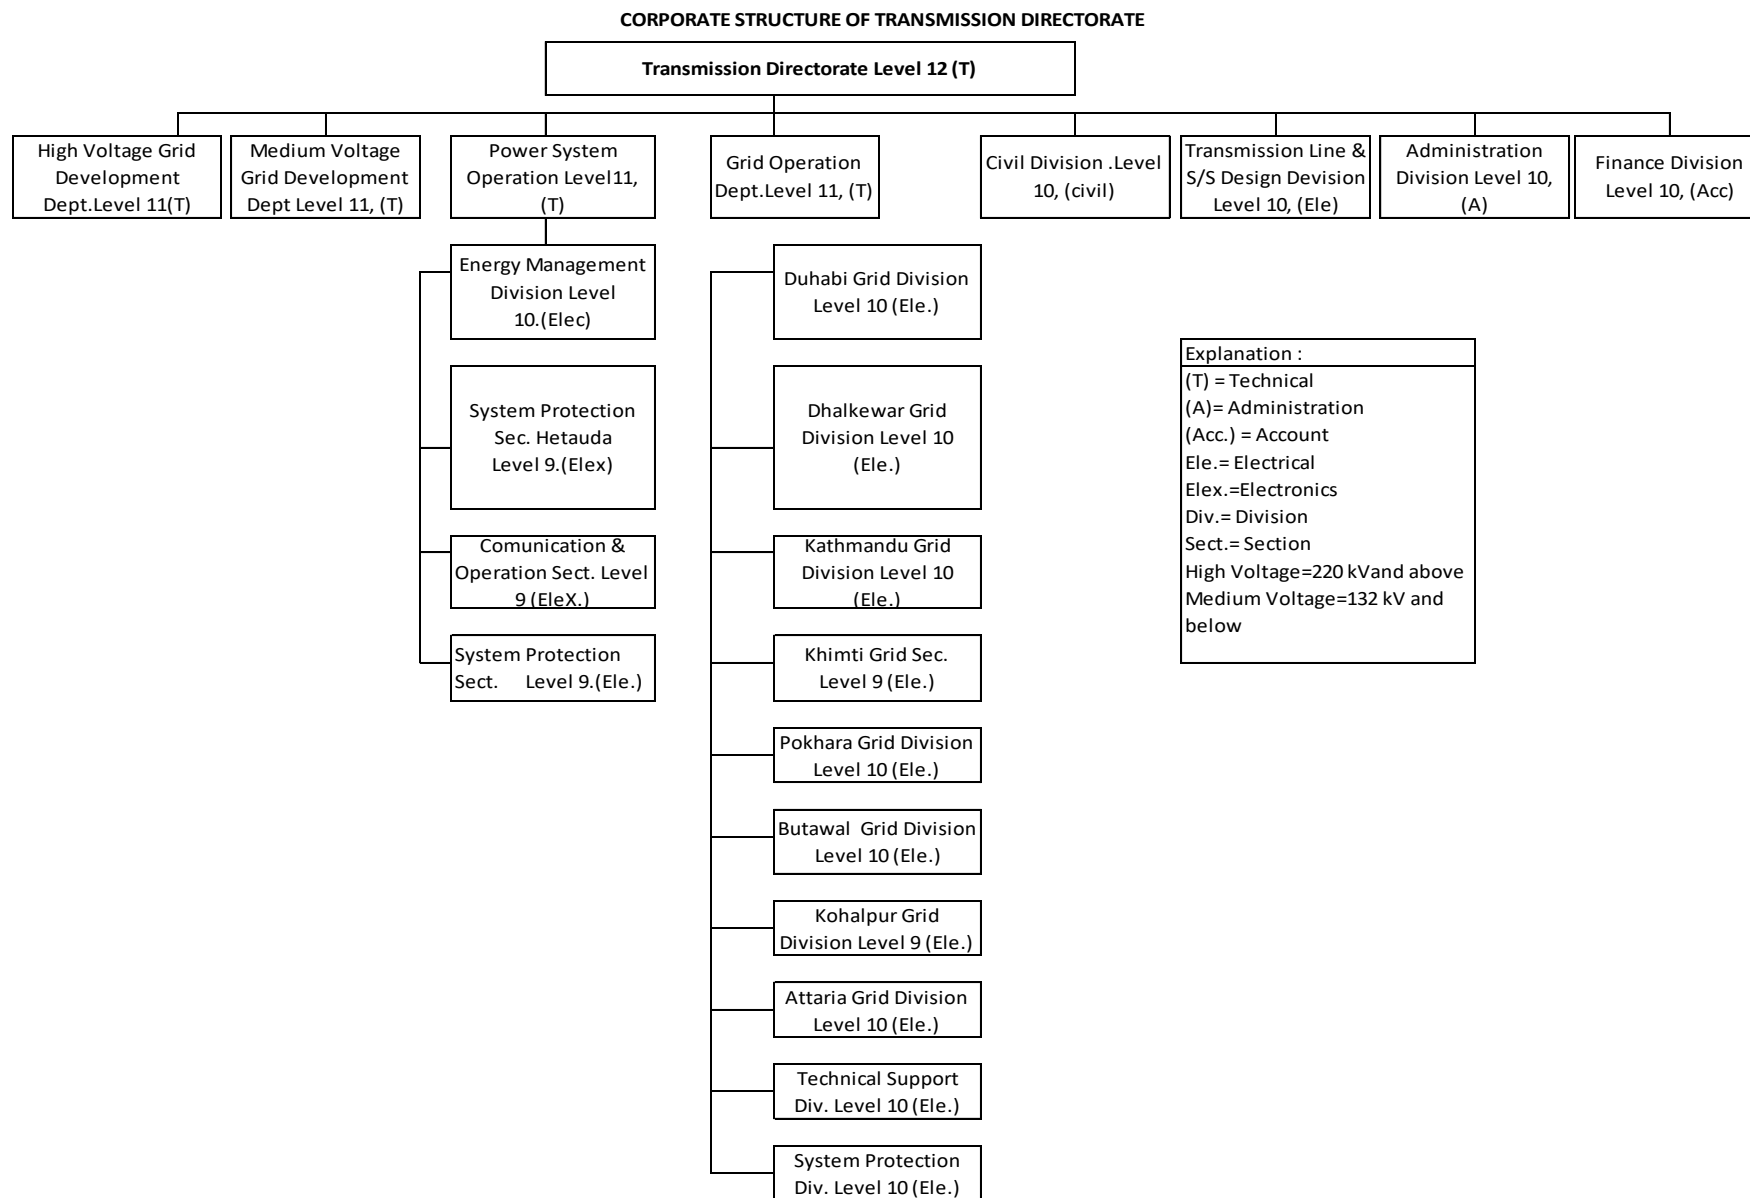

५.५.३. प्रसारण निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालय, आयोजना प्रमुखहरुको नाम तथा सम्पर्क नम्बर:

क्र.सं.	पद	कर्मचारीको नाम	कार्यालय/ आयोजनाको नाम	सम्पर्क नं.	इमेल
१	निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक	श्री कमल आचार्य	प्रसारण निर्देशनालय	९८४९९५५७४५	transmission@nea.org.np
२	निर्देशक	श्री श्याम कुमार यादव	नेपाल भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजना	९८५९९२०९३९	niettp400kv@nea.org.np
३	निर्देशक	श्री कमल आचार्य	ग्रिड सञ्चालन विभाग	९८४९९५५७४५	gridoperation@nea.org.np
४	निर्देशक	श्री रञ्जु पाण्डे	विद्युत प्रणाली संचालन विभाग	९८६९०५०९४३	ldc@nea.org.np
५	निर्देशक	श्री केदार राज सिलवाल	मध्यम भोल्टेज ग्रिड विकास विभाग	९८५९०९४४५९	griddev@nea.org.np
६	निर्देशक	श्री थर्क बहादुर थापा	उच्च भोल्टेज ग्रिड विकास विभाग	९८४९२२४९३९	hvgdd@nea.org.np
			काठमाडौं उपत्यका प्रसारण प्रणाली विस्तार आयोजना		t3b220kv@nea.org.np
			त्रिशुली ३ बी २२० के.भी. स/स आयोजना		t3b220kv@nea.org.np
७	प्रबन्धक	श्री लुनार श्रेष्ठ	ग्रिड सञ्चालन विभाग	९८४००५०२९३	gridoperation@nea.org.np
८	प्रबन्धक	श्री लक्ष्मी नारायण मूखिया	कुशाहा-कटैया १३२ के.भी.प्र.ल.आ., रक्सौल-परवानीपुर १३२ के.भी. प्र.ल.आ., प्रसौनी वीरगञ्ज १३२ के.भी.भूमिगत वि.प्र.ला.आ.	९८५५०५७६५९	kk132kv@nea.org.np
९	प्रबन्धक	श्री हरि प्रसाद पाण्डे	बुटवल (गोरुसिङ्गे)-लुम्बिनी १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना, बर्दघाट सर्दी १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना, मैनहिया सम्पत्तिया १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	९८५७०६३२७२	butwallumbini132kv@ nea.org.np bs132kv@nea.or.np ms132kv@nea.or.np
१०	प्रबन्धक	श्री सुरज गौतम	बुटवल ग्रिड महाशाखा	९८५७०२९४२८	butwalgrid@nea.org.np
११	प्रबन्धक	श्री अशोक पण्डित	हेटौंडा ग्रिड महाशाखा	९८५५०६७९६९	rp132kv@nea.org.np

१२	प्रबन्धक	श्री दीपक धिताल	काठमाडौं ग्रिड महाशाखा	९८४१५६१५४२	kathmandugrid@nea.org.np
१३	प्रबन्धक	श्री शुक्रराज देवकोटा	हेटौडा-ढल्केवर-इनरुवा ४०० के.भी. सबस्टेशन विस्तार आयोजना	९८५११३१०११	hdi400kvep@nea.org.np
१४	प्रबन्धक	श्री नविन कुमार लाभ	अत्तरीया ग्रिड महाशाखा	९८४५०७६०६	attriagrid@nea.org.np
१५	प्रबन्धक	श्री दिपक गौतम	सुनवल १३२ के.भी. स/स आयोजना		sunwal132kv@nea.org.np
			लमही-घोराही १३२ के.भी. स/स विस्तार आयोजना		lgsep132kv@nea.org.np
			भुमही हकोई १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		hakui132kv@nea.org.np
			गण्डक नेपालगञ्ज प्रसारणलाइन आयोजना		gn220kv@nea.org.np
१६	उप प्रबन्धक	श्री परमार धिरसेन	लालबन्दी सलिमपुर/ कुसाहा विराटनगर १३२ के.भी. प्र. ला. आ.	९८५११९११८८	ls132kv@nea.org.np
१७	प्रमुख	श्री विनोद लोहनी	ढल्केवर ग्रिड महाशाखा	९८४५९०३७६७	dhalkebargrid@nea.org.np
१८	प्रमुख	श्री अनिल बज्जाडे	पोखरा ग्रिड महाशाखा	९८५६०००५७७	pokharagrid@nea.org.np
१९	प्रमुख	श्री रोशन खड्का	दुहवी ग्रिड महाशाखा	९८५२०४०४१६	duhabigrid@nea.org.np
२०	उप-प्रबन्धक	श्री सतिस चन्द्र साह	का.उ.प्र.प्र. विस्तार आ. (प्याकेज ए)	९८४१२७३५०४	ktmvtsep.a@gmail.com
२१	उप-प्रबन्धक	श्री अमित गोपाल वैद्य	का.उ.प्र.सु.आ.	९८४१३६६७३७	
२२	उप प्रबन्धक	श्री दिपा श्रेष्ठ	का.उ.प्र.प्र.वि.आयोजना (प्याकेज डी)	९८४१७६७७८१	kb132kv@nea.org.np
२३	उप-प्रबन्धक	श्री सन्तोष कुमार साह	हेटौडा-भरतपुर-वर्दघाट २२० के.भी. प्र. ला. आ.	९८६९९९८५४८	hb220@nea.org.np
२४	उप-प्रबन्धक	श्री जगदीश शर्मा पौडेल	लेखनाथ-दमौली २२० के.भी. प्र. ला. आ.	९८५६०२५४७८	ld220kv@nea.org.np
२५	उप प्रबन्धक	श्री रमेश प्रसाद पौडेल	दोर्दी कोरिडोर १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८५११५७१७६	dordi132kv@nea.org.np
			कालीगण्डकी-रिडी १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		kgard132@nea.org.np
२६	उप प्रबन्धक	श्री राजन ढुङ्गेल	सिंगाटी-लामोसाँघु १३२ के.भी. प्र. ला. आयोजना	९८५१२०२३०९	singati132kv@nea.org.np
			बलेफी कोरिडोर १३२ के.भी. प्र. ला. आयोजना		balefi132kv@nea.org.np

२७	उप प्रबन्धक	श्री रोसन अग्रवाल	नयाँ मोदी-लेखनाथ १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	९८४९४८४९०३	modi132kv@nea.org.np
			कुश्मा तल्लो मोदी नयाँ मोदी १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		
२८	उप प्रबन्धक	श्री निरञ्जन साह सुडी	रुपनी १३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना	९८४९४९८००५	rupani132kv@nea.org.np
			ढल्केवर लोहारपट्टी १३२ के.भी. प्र.ला.आयोजना		loharpatti132kv@nea.org.np
			नवलपुर १३२/३३ के.भी. स/स आयोजना		nawalpur132kv@nea.org.np
२९	उप प्रबन्धक	श्री जनार्दन प्रसाद गौतम	सोलु कोरिडोर १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना, चमेलिया जौलजिवि २२० के.भी. प्र.ला.आ	९८४९४५३९०२	solu132kv@nea.org.np
३०	उप प्रबन्धक	श्री धुपेन्द्र कुमार भा	चन्द्रपुर सुकदेवचौर १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	९८५११५५०४६	cs132kvtp@nea.org.np
३१	उप प्रबन्धक	श्री सुनिल कुमार महतो	थानकोट-चापागाँउ-भक्तपुर १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	९८५११२६३१६	tcb132kv@nea.org.np
			रुपनी बोदेबसाईन १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		rb132kv@nea.org.np
			लहान सुखीपुर १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		ls132kv@nea.org.np
३२	उप प्रबन्धक	श्री अनुप गौतम	अमरपुर-ढुङ्गेसाँघु १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	९८४९२३१४१२	ad132kv@nea.org.np
			गोदक न्यू अनारमनी १३२ के.भी. प्र.ला.आयोजना		godak.anarmani132kv@nea.org.np
			रामेछाप-गज्याङ्ग-खिम्ती १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		rgk132kv@nea.org.np
			गोदक स्वयाक १३२ के.भी. प्र.ला.आ.		godak.soyak132kv@nea.org.np
			सुनकोशी १३२ के.भी.स/स आयोजना		
३३	उप प्रबन्धक	श्री राघवेन्द्र कुमार भा	तुम्लिङ्गटार-सितलपाटी २२० के.भी.प्र.ला.आ.	९८४९७८८३३४	ts220kv@nea.org.np
			धरान २२०/३३		

			के.भि.स/सआयोजना कोशी कोरीडोर २२० के.भि.प्र.ला.आ		
३४	उप प्रबन्धक	श्री कोमल नाथ आत्रेय	रातमाटे -रसुवागढी-केरुङ्ग ४०० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	९८४१३९०१९३	rrk400kv@nea.org.np
३५	सहायक प्रबन्धक	श्री विष्णु प्रसाद देवकोटा	पथलैया हरनिया ४०० के.भी.प्र.ला.आयोजना	९८५१३२०८३७ ९८४१९८८८९८	ph132kv@nea.org.np
			धौवादी फलामखानी विद्युत प्र.ला.आ., धौवादी मेघौली १३२ के.भी.प्र.ला.आ		dimetlp@nea.org.np
३६	सहायक प्रबन्धक	श्री मनोज प्रसाद चौधरी	बुर्तिवाड-पौदी अमराई- तम्घास-सन्धिखर्क-गोरुसिङ्गे १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	९८५११०३६२१	gac132kv@nea.org.np, manojprasadcha@gmail.co m
३७	सहायक प्रबन्धक	श्री रवि कुमार चौधरी	कोहलपुर सुर्खेत दैलेख १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	९८४१३७८९०९	sdkj132kv@nea.org.np
			सुर्खेत १३२ के.भी. सर्वस्थान आयोजना		
३८	सहायक प्रबन्धक	श्री उपेन्द्र श्रेष्ठ	कोहलपुर ग्रिड शाखा	९८५१०६२७३०	
३९	सहायक प्रबन्धक	श्री बलभद्र अधिकारी	बफिकोट खुंग्री १३२ के.भी.प्र.ला.आ.	९८१३६७७९२३	gkm132kv@nea.org.np
			भेरी कोरिडोर ४०० के.भी.प्र.ला.आ.		bheri400kv@nea.org.np
			घोराही माडीचौर १३२ के.भि.प्र.ला.आयोजना		gkm132kv@nea.org.np
४०	सहायक प्रबन्धक	श्री रुपेश कुमार शाह	गल्छी रातमाटे २२० के.भी. प्र.ला.आ.	९८०१०८६२६७	t3br220kv@nea.org.np t3br220kv@gmail.com
			का.उ.प्र.प्र.विस्तार आ. (प्याकेज-बी)		
			ढल्केवर-बालगंगा १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		balganga132kv@nea.org.np balganga132kv@gmail.com
४१	सहायक प्रबन्धक	श्री भुपेश श्रेष्ठ	अरुण-इनरुवा-तिङ्गला- मिर्चैया ४०० के.भी. प्र.ला.आ.	९८५१२१२००२	bhupesh.nea@gmail.com.
४२	सहायक प्रबन्धक	श्री अनिल कुमार अधिकारी	चमेलिया-स्याउले-अत्तरिया १३२ के.भी. प्र.ला.आयोजना	९८५११५२००५	csa132kv@nea.org.np

			स्याउले साँफेबगर १३२ के.भी.प्र.ला.आ.		
४३	सहायक प्रबन्धक	श्री कैलाश पन्थ	पोखरा विरौटा १३२/११ के.भी. प्र.ला.आ. का.उ.प्र.प्र.विस्तार आ. (प्याकेज-सी)	९८४१७५००८९	
४४	सहायक प्रबन्धक	श्री शिवराम ताम्राकार	भक्तपुर-वानेश्वर-पाटन ६६ के.भी. प्र.ला. क्षमता अ.आ.	९८४१७८०१२४	bbp66kv@nea.org.np
			न्यू खिम्ती लामोसाँघु काठमाडौं प्र.ला.क्ष. अ.आ.		
			मलेखु १३२ के.भी. स/स वि.आयोजना		malekhu132@nea.org.np
४५	सहायक प्रबन्धक	श्री मनोज साह	खिम्ति ग्रिड शाखा	९८४५९०३७६७	
४६	इञ्जिनियर	श्री सुभारम्भ विक्रम शाह	चिलिमे-त्रिशुली २२० के.भी. प्र.ला.आ.	९८५८०३६६६६	ch220kv@nea.org.np
४७	इञ्जिनियर	श्री अर्जुन महर्जन	पाल्पा २२० के.भी. सर्वस्थान आयोजना	९८४९१०२०६७	palpa220kv@gmail.com
४८	इञ्जिनियर	श्री नारायण प्रसाद सापकोटा	औराह १३२ के.भी. सर्वस्थान आयोजना	९८५१२३४१५१	
			हेटौडा-विरगंज ६६ के.भी.क्ष.अ.आयोजना		hb66kv@nea.org.np
			दमक केरुवन वर्जु दुहवी १३२ के.भी. प्र.ला.आ.		
			पूर्वी चितवन १३२ के.भी.स/स आ.		ec132kv@nea.org.np
४९	इञ्जिनियर	श्री रितेश जयसवाल	लम्की चौकुने १३२ के.भी.प्र.ला.आ.	९८५६०३५११९	
५०	इञ्जिनियर	श्री रवि श्रेष्ठ	का.उ.प्र.प्र.विस्तार आ. (प्याकेज-ई)	९८४१००६७०४	Ktmvtsep.e@gmail.com

प्रसारण निर्देशनालयद्वारा आ.व.०८०/०८१ को लागि संचालित प्रसारणलाइन तथा सवस्टेशन आयोजनाहरुको तेश्रो त्रैमासिक प्रगति सारांश

१३२ के. भि. तथा अन्य प्रसारण लाइन विस्तार

व. उ. शि. नं. ५०१०८१०१

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	तेश्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण												अवधिको खर्च प्रतिशत	शुरुदेखि यस अवधि सम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कुल) लागतको (तुलनामा	शुरुदेखि यस अवधि सम्मको प्रगति प्रतिशत	कैफियत	
		भारित प्रगति प्रतिशत	नेपाल सरकार		वैदेशिक		ने.वि.प्रा.	तेश्रो त्रैमासिक कुल बजेट	नेपाल सरकार		वैदेशिक		ने.वि.प्रा.					तेश्रो त्रैमासिक कुल खर्च
			शेयर	ऋण	ऋण	अनुदान			शेयर	ऋण	ऋण	अनुदान						
	प्रसारण निर्देशनालय (१३२ के.भी.)																	
1	सिंगटि-लामोसाँघु १३२ के .भी. प्रसारणलाइन आयोजना	४४.२२	५०.००	०.००	०.००	०.००	४२५०.००	४३००.००	५०.००				१०५०.००	११००.००	२५.५८	९२.३०	८३.६८	स.स. तर्फको ठेक्का सम्झौता रद्द भई हाल ग्रिड संचालन विभागलाई संचालन हस्तान्तरण/ भएको र सनिर्माणको .स. बाकि कार्य गर्न खिम्ती ग्रिड शाखा बाट नया ठेक्का सम्झौता बमोजिम हुने गरी estimate तयार भईरहेको ।

																		प्रको बाकि .ला. कार्य ठेकेदारबाट सम्पन्न गर्न Commitment गरी MOM गरिएको । ठेक्का सम्झौताको म्याद थप सम्बन्धमा ने .प्रा.वि. व्यवस्थापनबाट निर्णय हुने गरी फाईल पेश भएको ।
2	रामेछाप – गङ्गाङ्ग-खिम्ती १३२ के .भी. प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	१५.००	०.००	०.००	०.००	५९५.००	६१०.००						०.००	०.००	८१.७०	९७.८१	यस आयोजना ०६६/६७ देखी शुरु भई प्रसारणलाइन र सवस्टेशनको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भई १३२ के.भी Khimti line -2,१३२ के.भी Khimti line -1 ट्रांसफोर्मर bay, ३३ के.भी. वितरण लाइन तथा ११ के.भी. वितरण लाइनको relay setting, testing तथा commissioningको कार्य सम्पन्न भई सकेको
3	कुश्मा तल्लो मोदि मोदि	४९.३०	३००.००	०.००	०.००	०.००	२७२००.००	२७५००.००	३००.००				१४१५५.३०	१४४५५.३०	५२.५६	४२.४७	४२.७९	ठेकेदार कम्पनी COSMIC ले Check survey, Soil

१३२ के .भी. प्रसारणलाइन आयोजना																		Investigation resistivity test, switchyard foundation, erection & earthing, 3 no. of Tower Foundation कार्य सम्पन्न गरिसकेको साथै supply तर्फ ACSR Conductor, CB, CVT, CT, LA, CRP, SAS, communication equipment, line hardware & accessories etc. सामान आयात गरिसकेको । आयोजनाले प्रसारणलाइन अन्तर्गत वन क्षेत्र भोग गर्नका लागि आवश्यक प्रकृया बमोजिम हाल विभागबाट जिल्लामा फिल्ड विवरण लिन साथै सामुदायिक वनको सहमतिपत्र लिने कार्य सम्पन्न। टावर प्याड जग्गा अधिग्रहणका लागि उपसमितिबाट प्रतिवेदन तयार भई मूल समितिमा पेश भएको ।
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4	कुसाहा-कटैया १३२ के .भी. प्रसारणलाइन दोस्रो सर्किट निर्माण सहित	०.००	८.००	०.००	०.००	०.००	४२.००	५०.००						०.००	०.००	८८.९०	९६.९५	2nd Circuit तथा LILLO कार्य सम्पन्न भई सबस्टेशन र लाइन चार्ज भईसकेको ।
5	रक्सौल परवानीपुर १३२ के .भी. प्रसारणलाइन दोस्रो सर्किट निर्माण सहित	०.००	८.००	०.००	०.००	०.००	१९२.००	२००.००						०.००	०.००	११४.००	९९.९२	2nd Circuit को निर्माण कार्य सम्पन्न भई Bay निर्माण कार्य ८० % सम्पन्न भएको र ROW क्षतिपुर्तीको काम भईरहेको ।
6	नयाँ मोदी- लेखनाथ १३२ के .भी. प्रसारणलाइन आयोजना	१४.४९	३००. ००	०.००	५०० ०.००	०.००	१७४२८.० ०	२२७२८.० ०	३००.० ०				२५५३.६०	२८५३.६०	१२.५६	९४.१८	९७.२३	सम्पूर्ण सस तथा / को भौतिक .ला.प्र निर्माण कार्यहरु २०७९सम्पन्न गरी गते बाट १४पौष सम्पूर्ण charging कार्य गरी संचालनमा आएको छ । 5% Retention भुक्तानी गर्न बाकि रहेको । वन जग्गा सट्टा भर्ना वापत रुकरोड वन ३३.१४. गको खातामा विभा जम्मा गर्नुपर्ने र पहिलो किस्ता वापत रु ५८.२. करोड भुक्तानी भएको ।

7	सोलु कोरिडर १३२ के .भी. प्रसारणलाइन आयोजना	१००.० ०	५५.० ०	०.००	०.००	०.००	४४७८.० ०	४५३३.००	५५.००				१९२६.००	१९८१.००	४३.७०	९९.९०	९९.९४	निर्माण कार्यको Waranty Period समाप्त भएको, ROW क्षतिपुर्ती भईरहेको ।
8	बुर्तीबाड-पौदी- -अमराई -तम्घास -सन्धिखर्क गोरुसिंगे १३२ के.भी प्रसारणलाइन आयोजना	८९.०४	१५०० .००	०.००	०.००	०.००	१०३२१६. ५२	१०४७१६. ५२	१५००. ००				३५४५९.८ ८	३६९५९.८८	३५.३०	८९.६२	९९.९६	मोतिपुर सन्धिखर्क, तम्घास र बुर्तिबंग १३२/३३ के.भी सबस्टेशन चार्ज भईसकेको तथा पौदी स.स. को निर्माण सम्पन्न । मोतिपुर- सन्धिखर्क-तम्घास खण्ड ८४.६ सर्किट कि.मी प्रसारणलाइन चार्ज भईसकेको । सन्धिखर्क बुर्तिबंग प्रसारण लाईन खण्डमा पर्ने बान क्षेत्रको रुख कटानमा दिलाई भईरहेको ।
9	कुशाहा विराटनगर १३२ के .भी. प्रसारणलाइन आयोजना	०.६८	७००. ००	०.००	०.००	०.००	५७३००.० ०	५८०००. ००	७००.० ०				३४९५.००	४१९५.००	७.२३	७०.०८	६८.७५	सबस्टेशन तर्फ स्टाफ क्वार्टर, कन्ट्रोल बिल्डिङ तथा गार्ड हाउसको निर्माण कार्य भईरहेको, Electrical Equipments को फाउण्डेशन डिजाईनहरु Approve भई

																		फाउण्डेशन कार्य भइ रहेको, Major Equipments Site Deilver भैसकेको । प्रसारणलाइन तर्फ ४६ सर्किट कि.मी मध्ये ४५.५ सर्किट कि.मि. लाइन तान्ने कार्य सम्पन्न ।
10	वलेफि- वाह्विसे १३२ के .भी. प्रसारणलाइन आयोजना	७०.६१	३००.००	०.००	०.००	०.००	३०४००.००	३०७००.००	३००.००				७२००.००	७५००.००	२४.४३	९०.८६	७४.७९	Tower Foundation, Errection कार्य चालु रहेको । ठेकेदारबाट बिल पेश नभएकोले भुक्तानी हुन बाकि रहेकोले वित्तिय प्रगति कम देखिएको ।
11	दोर्दी कोरीडोर १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	१५.००	०.००	०.००	०.००	१२३५.००	१२५०.००					०.००	०.००	९०.१५	९९.३०	प्रसारणलाइन निर्माणको कार्य सम्पन्न भई २०७९/१२/२३ मा लाइन चार्ज भएतापनि केहि साना कार्य हरु बाकि रहेकोहुदा अन्तिम बिल पेश हुन बाकि रहेको ।	
12	पूर्वी चितवन १३२ के .भी. सवस्टेशन आयोजना	०.००	७.००	०.००	०.००	०.००	५५३.००	५६०.००	७.००				६९५.००	७०२.००	१२५.३६	१०२.८७	९३.८८	आयोजनाबाट Facility Part A अन्तर्गतको पूर्वी चितवन १३२/३३/११ के.भी.

																		स./स निर्माण कार्य सम्पन्न भई हाल चालु अवस्थामा रहेको र ११ के.भी फिडर मार्फत करीब ८ मे.वा. विद्युत आपूर्ति भैरहेको। Facility Part B अन्तर्गतको ३३ के.भी. प्र.ला निर्माण कार्य मध्ये टावर foundation निर्माण कार्यमा खैरहनी न.पा. १० का स्थानीय वासिन्धाबाट अवरोध सिर्जना भएकोले काम रोकिएको । उक्त अवरोध हटाउन विभिन्न चरणमा छलफल गरी स्थानीय न.पा, जी.प्र.का. मा समन्वयका लागि पहल गरेपनि हालसम्म समस्या समाधान हुन नसकेको ।
13	ढल्केबर-लोहारपट्टी १३२ के.भी प्रसारणलाइन आयोजना	९५.८३	१५०.००	०.००	०.००	०.००	३६७५.००	३८२५.००	१५०.००				१२८२०.००	१२९७०.००	३३९.०८	८८.००	९९.५१	प्रसारणलाइन तथा सब स्टेशन मिति २०८१/४/२८ मा चार्ज भई संचालनमा रहेको ।

	(२० कि.मि)																	
14	अमरपुर ढुंगेसाँगु १३२ के .भी. प्रसारणलाइन अयोजना	२७.४१	७००. ००	०.००	०.००	०.००	८१८००. ००	८२५००. ००	७००.० ०				१९३००.० ०	२००००.० ०	२४.२४	१३.२०	१६.९९	प्रसारणलाइन टावरहरुको जग निर्माण हुँदै ।
15	कोहलपुर- सुर्खेत-दैलेख १३२ के भी. प्रसारणलाइन अयोजना	११४.२ २	१००० .००	०.००	०.००	०.००	८००००. ००	८१०००. ००	१०००. ००				९२०१९.८ ८	९३०१९.८८	११४.८४	४९.२४	४९.४५	कोहलपुर - सुर्खेत प्रसारणलाइन निर्माण (५० कि.मि) पहिलो खण्ड अन्तर्गत प्रसारण लाइन समान उपलब्धि / निर्माण कार्य भईरहेको साथै बन कटान कार्य जारी रहेको ।
16	ढल्केबर बाल गंगा १३२ के .भी. प्रसारणलाइन अयोजना	३८.९३	१००० .००	०.००	०.००	०.००	९५०००. ००	९६०००.० ०	१०००. ००				३६५२१.० ०	३७५२१.००	३९.०८	४५.००	४१.०४	77 टावर मध्ये Tower Foundation 75, Errection 69 सम्पन्न भएको । सबस्टेशन निर्माणको ठेक्का सम्झौता भई Design/Drawing review साथै निर्माण ठेकेदार site mobilize भएको । Control Room Building तथा staff quarter building निर्माण हुदै गरेको । साथै १३२ के.भी. को Gantry Tower को

																		Foundation निर्माण हुदै गरेको।
17	लालबन्दी – नवलपुर – सलिमपुर १३२ के भी. प्रसारणलाइन अयोजना	४७.८२	६००.००	०.००	०.००	०.००	७८३६५.००	७८९६५.००	६००.००				३९६७२.००	४०२७२.००	५९.००	३०.२९	३०.९६	खरिद गरिएको जग्गामा कम्पोड वाल तथा स्टोर सहित गार्ड हाउस निर्माण कार्य सम्पन्न, Construction license को काम सम्पन्न भएको । प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशनको लागि २०७९/१२/२७ मा ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको
18	भुमहि –हकुई १३२ के.भी. प्रसारणलाइन अयोजना (१६ कि.मि)	१०२.१५	११००.००	०.००	०.००	०.००	८८४००.००	८९५००.००	११००.००				२८९००.००	३००००.००	३३.५२	५०.०३	५६.२५	ROW मा परेको वनजंगल कटानको/ लागि वन विभागमा सम्झौताको लागि किस्तावान्धिमा रकम जम्मा भएको । 47 मध्ये 14 वटा Tower Foundation सम्पन्न । Substation तर्फ Power Transformer जडान सम्पन्न । Capacitor Bank, Communication Equipment बाहेक अन्य सामान Delivery भएको । 33 kv Switchyard

																		Side को Civil Foundation को निर्माण कार्य भईरहेको ।
19	गोदक-अनारमनि १३२ के.भी. प्रसारणलाइन अयोजना (३५ कि.मि)	३.८५	७५.००	०.००	०.००	०.००	७७२५.००	७८००.००	७५.००				१२५.००	२००.००	२.५६	०.४६	०.०६	नयां अनारमनि सबस्टेशनको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न प्रारम्भिक कारबाही भईरहेको ।
20	वाफिकोट-खुंग्री १३२ के .भी. प्रसारणलाइन अयोजना	०.००	४५०.००	०.००	०.००	०.००	६८००.००	७२५०.००	४५०.००				१३४५५०.००	१३५०००.००	१८६२.०७	८.६८	१०.०८	रोल्पा जिल्लाको कुटिचौरमा निर्माणहुने १३२/३३ के।भी सबस्टेशनको लागि जग्गा अधिकरणको काम सम्पन्न भई compound wall तथा स्टोर भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको । साथै प्रसारण लाइनको ठेक्का सम्झौता भई सर्भेको काम सुरु भएको ।
21	सुनकोशी १३२ के .भी. सबस्टेशन अयोजना	०.००	१४.००	०.००	०.००	०.००	१२३६.००	१२५०.००					०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	'यस आयोजना ०६६/६७ देखी शुरु भइ ०७२/७१ सम्म प्रारम्भिक कार्यमै समय व्यतित भएको, साथै बर्हबिसेमा २२०/१३२ के.भी

																		सबस्टेशनको निर्माण कार्य समेत आर्थिक वर्ष (०७५/७६) बाट शुरु भएको तर निर्माण अनुमतिपत्रको अवाभ/ प्राप्तिको पहिचान नभएकोले निर्माण कार्य आगाडी बढाउन समस्या भएकोमा मिति २०७९/०७/२३ को कार्यकारी निर्देशक ज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठक अनुसार निर्माण कार्य अघि बढाएको ।
22	सम्पत्तिया- मैनहिया १३२ के.भी. प्रसारणलाइन अयोजना (३५ कि.मि.)	०.००	६००.००	०.००	०.००	०.००	२०८००.००	२१४००.००	०.००					०.००	०.००	८०.००	६२.१६	लाइन निर्माणको काम सम्पन्न भइ लाइन चालु भएको क्षतिपुर्ति र मुअब्जाको काम भइरहेको ।
23	गोदक- स्वायाक १३२ के.भी. प्रसारणलाइन अयोजना (१६ कि.मि.)	४२.०१	२५०.००	०.००	०.००	०.००	१४७५०.००	१५०००.००	२५०.००				७५०.००	१०००.००	६.६७	२७.११	८.७५	प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भई कार्य प्रारम्भ। वन जंगल कटानको लागि लगत तयार गर्ने कार्य जारी रहेको । टावर प्याडको जग्गा अधिग्रहण

																		सम्बन्धि सूचना प्रकाशन भई प्रक्रियामा रहेको ।
24	रुपनि बोदेबरसाइन १३२ के .भी. प्रसारणलाइन आयोजना	६६.६७	२७.००	०.००	०.००	०.००	२०३५.००	२०६२.००	२७.००				२०८.००	२३५.००	११.४०	३.२०	३.८६	जग्गा अधिग्रहणको लागि check survey, जग्गा यकिन गर्ने, जग्गा नापजाच लगायतको कार्य भईरहेको । बजेट अभावले बोलपत्र सम्बन्धि कार्य बढ्न नसकेको ।
25	चन्द्रपुर सुकदेबचौक १३२ के .भी. प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	३२.००	०.००	०.००	०.००	१९६८.००	२०००.००	३२.००				१३६३.००	१३९५.००	६९.७५	६.३१	८.१५	बोलपत्र आह्वान गरी खरिद सम्झौता गर्न र १० %Mobilization दिन चालु आ .व. मा थप बजेट व्यवस्थापन हुन आवश्यक रहेको ।
26	लहान सुखिपूर १३२ के .भी. प्रसारणलाइन आयोजना	७३.४७	३२.००	०.००	०.००	०.००	१९७८.००	२०१०.००	३२.००				७९४.००	८२६.००	४१.०९	३.२८	४.२९	IEE स्वीकृत भईसकेको, Boundary Wall निर्माणको कार्य सम्पन्न भईसकेको र प्रसारण लाइनको Estimate स्वीकृतिको लागि पेश भएको । जग्गा अधिग्रहणको लागि check survey, जग्गा यकिन गर्ने, जग्गा नापजाच

																		लगायतको कार्य भईरहेको ।
27	LDC सुदृढीकरण आयोजना	०.००	२.००	०.००	०.००	०.००	१२३.००	१२५.००						०.००	०.००	९९.००	९९.००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
28	भक्तपुर-बानेश्वर-पाटन ६६ के.भी. प्रसारणलाइन क्षमता अभिवृद्धि आयोजना	०.००	२.००	०.००	०.००	०.००	१२३.००	१२५.००						०.००	०.००	९०.१३	९८.०५	भक्तपुर बानेश्वर पाटन तथा पाटन स्युचाटार ६६ के.भी (सर्किट १ तथा सर्किट २) तथा चपली चाबहिल ६६ के.भी प्रसारणलाइनको तर बदलि कार्य बिगत आ.व मै सम्पन्न भईसकेको . ठेक्का सम्झौता अनुसारका Spare parts(Except one drum 3.015 km ACCC Conductor) हरु गिड कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको . बाकि रहेको conductor समेत निर्माता कम्पनीबाट निर्माण भई आयोजनाको site मा आउने क्रममा रहेको ।
29	चमेलिया-स्याउले-अतरिया १३२ के.भी. दोश्रो	०.००	३.००	०.००	०.००	०.००	९७.००	१००.००						०.००	०.००	७९.१५	१००.००	निर्माण कार्य सम्पन्न । आयोजनाको सम्पन्न कार्य हरु

	सर्किट आयोजना																	मध्ये केहि कार्यको भुक्तानी हुन बाकि रहेकोले वित्तीय प्रगति कम देखिएको ।
30	झुरझुरे 132 के.भी. प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशन आयोजना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००					०.००	०.००	०.३५	०.२१	सर्भेक्षण अध्ययनको कार्य अन्तिम अवस्थामा रहेको,सर्वे सर्वेक्षण अनुमति पत्रको लागि DoED पेश गरिएको । आयोजनाको IEE कार्यको लागि परामर्शदाता संग सम्झौता भई सो कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ ।	
31	सुर्खेत १३२ के .भी. सबस्टेशन आयोजना	८०.४ ८	२३०. ००	०.००	०.००	०.००	६०६९३.० ०	६०९२३.० ०	२३०.० ०				४७०९६.० ०	४७३२६.००	७७.६८	६५.२४	७९.३२	सब स्टेशनको समान उपलब्धि / निर्माण कार्य भईरहेको ।
32	पोखरा विरौटा १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	१००.० ०	५५.० ०	०.००	१४० ००.० ०	०.००	१६३३.२५	१५६८८.२ ५	५५.००		१६२१ ६.७८		२८१४.०५	१९०८५.८३	१२१.६६	१.८२	२.४०	Bid Document तयार गर्ने कार्य भईरहेको ।
33	स्याउले साँफेबगर १३२ के .भी. प्रसारणलाइन आयोजना	३०.७७	३०.० ०	०.००	०.००	०.००	१३७०.००	१४००.० ०					०.००	०.००	०.००	०.००	सर्बेक्षण / अध्ययन कार्य भईरहेको ।	

34	काठमाण्डौ उपत्यका प्रणाली सुदृढिकरण आयोजना	१८४.२१	५०.००	०.००	२००००.००	०.००	११५१९.००	३१५६९.००	५०.००		३७८३९.००		६४८७.००	४४३७६.००	१४०.५७	१.८८	१.७१	परामर्शदाता छनौट भई हाल Design को कार्य भईरहेको ।
35	मलेखु १३२ के.भी. सवस्टेशन विस्तार आयोजना	९६.४४	१९०.००	०.००	०.००	०.००	१६४९०.००	१६६८०.००	५०.००					५०.००	०.३०	५५.८६	९१.७२	सवस्टेशन विस्तार कार्यका लागि आवश्यक सामानहरु मध्ये बाकी रहेको SAS को Factory Inspection भई सामान आई पुग्ने क्रममा रहेको र सो पश्चात सबस्टेशनको Testing कार्य आरम्भ गरिने र ठेक्काको म्याद थप स्वीकृत नभएकोले ठेकेदारलाई भुक्तानी रोकिएकोले वित्तीय प्रगति कम देखिएको ।
36	न्यु खिम्ती लामोसाँघु काठमाण्डौ प्रसारणलाइन क्षमता अभिवृद्धि आयोजना	१००.००	३०५.००	०.००	०.००	०.००	२५९५.००	२९००.००	३०५.००				४२४२२.००	४२७२७.००	१४७३.३४	४५.००	४७.२३	'चालु आ.व. मा ४५ कि.मि. लम्बाईको न्यु खिम्ती लामोसाँघु १३२ के.भी. प्र.ला.को क्षमता अभिवृद्धि कार्य सम्पन्न भई सोको पुँजीकरण समेत सम्पन्न भएको र

																		२२०/१३२ के.भी. न्यु खिम्ती स/स को विधमान १०० एम.भी.ए. को पावर ट्रान्सफर्मरलाई २०० एम.भी.ए. को अटो ट्रान्सफर्मरले विस्तापन गर्ने कार्यको ठेक्का सम्झौता भई Design Review भई रहेको । ठेकेदारलाई अग्रिम भुक्तानी दिईएकोले खर्च प्रतिशत बढी देखिएको ।
37	प्रसौनी विरगंज १३२ के .भी. भुमिगत विधुत प्रसारणलाइन आयोजना	१७०.३ ५	२०० ०.००	०.००	०.००	०.००	६८८८६० .००	६९०८६०. ००	२०००. ००				११३५५२४ .००	११३७५२४. ००	१६४.६५	७६.२०	७२.०७	निर्माण कार्य ७० % सम्पन्न ।
38	बुटवल लुम्बिनी १३२ के .भी. प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	७.००	०.००	०.००	०.००	३३४.००	३४१.००					०.००	०.००	९३.८४	९९.५९	कार्य सम्पन्न भएको ।	
39	अत्तरीया - धनगढि १३२ के .भी. प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	२७.० ०	०.००	०.००	०.००	०.००	२७.००					०.००	०.००	०.००	०.००	आयोजनाको अध्ययन कार्य हरु भई रहेको हुदा उल्लेख्य प्रगतिहरु नरहेको ।	

40	दमक - केरौन विराटनगर - १३२ के .भी. प्रसारणलाइन आयोजना	१००.० ०	५०.० ०	०.००	०.००	०.००	२७५०.००	२८००.० ०	५०.००				६६.००	११६.००	४.१४	०.११३	०.१४	आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा सर्वेक्षणको कार्य भईरहेको ।
41	धौबादी - मेघौली १३२ के भी. प्रसारणलाइन आयोजना	२२५.० ०	१८०. ००	०.००	०.००	०.००	१२७१५.० ०	१२८९५.० ०	१८०.० ०				२६२४४.० ०	२६४२४.० ०	२०४.९२	५.३१	५.३१	सर्वेक्षण अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको र बातावरण अध्ययन कार्य भईरहेको ।
42	औराहा - सिमरा १३२ के भी. प्रसारणलाइन आयोजना	२.३४	७.००	०.००	०.००	०.००	१४१३.००	१४२०.००	७.००				६२.००	६९.००	४.८६	०.१०	०.३५	आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न तथा वातावरणीय अध्ययन अन्तर्गत प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यको TOR स्वीकृत ।
43	१३२ के .भी. प्रसारणलाइन क्षमता अभिवृद्धि आयोजना	४७.२९	२३०० .००	०.००	०.००	०.००	४११३४.० ०	४३४३४. ००	२३००. ००				७३९००.० ०	७६२००.००	१७५.४४	५३.००	९१.७०	यस आयोजना अन्तर्गत Package A,B,C का conductor, insulator, hardware लगायतका सामानहरु साईटमा आई पुगेको र Package C अन्तर्गत कुशाहा इनरुवा दुहवी तथा दमौली भरतपुर खण्डको कार्य सम्पन्न भई लाइनको क्षमता

																		अभिवृद्धी कार्य भएको ।
44	सिंगटी १३२ के .भी. सवस्टेशन आयोजना	०.००	२६०.००	०.००	०.००	०.००	३११७.००	३३७७.००	१००.००					१००.००	२.९६	९.२९	९.६१	ठेक्का सम्झौता भई Advance Payment भईसकेको । उपकरणहरुको Drawing Approval को कार्य भईरहेको।
45	नेपालगंज नानपारा १३२ के .भी. प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	५००.००	०.००	०.००	०.००	४९१००.००	४९६००.००	५००.००				२२७२८.००	२३२२८.००	४६.८३	६.६९	८.०८	ठेक्का सम्झौता भई Equipment and Tower Design Drawings Approve भएको, Cadastral Survey सम्पन्न भएको, माटो परिक्षण सम्पन्न भएको । प्रारम्भिक अधिकृत नहुँदा कारबाही अगाडि बढ्न नसकेको ।
46	प्रसारणलाइन अध्ययन आयोजना	०.००	२७.००	०.००	०.००	०.००	२९२३.००	२९५०.००						०.००	०.००	०.००	०.००	अध्ययन ।
47	काबेली कोरिडोर १३२ केभी . प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	३.००	०.००	०.००	०.००	१९७.००	२००.००						०.००	०.००	०.००	०.००	निर्माण कार्य सम्पन्न, OPGW Maintainance कार्य जारी रहेको ।
48	हेटौडा-भरतपुर २२० के .भी. प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	२००.००	०.००	०.००	०.००	५५७०.००	५७७०.००	२००.००				११४१२.००	११६१२.००	२०१.२५	९९.७४	९७.६६	प्रसारणलाइन तर्फ कार्य सम्पन्न तथा सको केहि .स. सामान्य कार्यहरु बाकि रहेको ।

49	भरतपुर- बर्दघाट २२० के .भी. प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	४०.० ०	०.००	०.००	०.००	२१२६.००	२१६६.००	४०.००				५२६.००	५६६.००	२६.१३	९२.७५	९५.२६	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
50	कोशी कोरिडोर २२० के .भी. प्रसारणलाइन आयोजना	९३.३३	१५०. ००	०.००	५०० ००.० ०	०.००	६०२५०.० ०	११०४००. ००	१५०.० ०				५२५८१.६ २	५२७३१.६२	४७.७६	७४.३४	७४.५९	Package 1: Inaruwa- Basantapur- Tumlingtar section 2079/04/19 बाट २२० केमा .भी. चार्ज भएको ; Package 2: Inaruwa, Baneshwor, Tumlingtar, Basantapur Substaion हरू संचालनमा आएको; Package 3: Basantapur - Dhungesanghu प्रसारण लाइन संचालनमा आएको र सबस्टेशन संचालनको लागि तयार रहेको Package 4: Basantapur - Dhungesanghu प्रसारणलाइनको दोश्रो सर्किट लाइन तान्ने कार्य सम्पन्न तथा Basantapur Substation मा Bay Extension कार्यको सिभिल निर्माण कार्य भईरहेको । 6

																		मध्ये ५ बे को निर्माण सम्पन्न भएको, १ बे संचालनमा आएको ।
51	त्रिशुली ३ बी.हब सवस्टेशन आयोजना	९६.४८	१४४.००	०.००	०.००	२०००६.००	२०००६.००	४०१५६.००	१४४.००			४२७७४.००	३०५०५.००	७३४२३.००	१८२.८४	९४.३२	९६.०२	सब स्टेशन चार्ज भएर संचालनमा रहेको ।
52	चिलिमे त्रिशुली २२० के .भी . प्रसारणलाइन आयोजना	१०८.७७	०.००	०.००	०.००	०.००	३३२८६.९०	३३२८६.९०				२३५४०.००	१६३२२.७८	३९८६२.७८	११९.७६	८६.२०	९८.००	2081.07.21 मा चार्ज भएको तथा केहि साना कार्यहरु जारी रहेको ।
53	लेखनाथ-दमौली २२० के .भी. प्रसारणलाइन आयोजना	५२.१७	०.००	०.००	०.००	०.००	१४२०५०.००	१४२०५०.००				९०८५.००	४९९४४.००	५९०२९.००	४१.५६	७.०९	८.३३	प्रसारणलाइनको सम्झौता भई check survey, design,supply कार्य भईरहेको । Substation निर्माणको पुन बोलपत्र आह्वान भई मुल्यांकन भईरहेको ।
54	रान २२०/३३ के.भी. सब्सटेशन अयोजना	८.८९	१५५.००	०.००	४००००.००	०.००	५३९५.००	४५५५०.००	१५५.००				२२००.००	२३५५.००	५.१७	५.४१	५.६३	बजेटको सुनिश्चितता नभएकोले सबस्टेशन निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान हुन नसकेको हुँदा भौतिक र बित्तिय प्रगति नदेखिएको ।

55	तुम्लिङटार- सीतलपाटी २२० के .भी. प्रसारणलाइन आयोजना	१२.३७						२९५०००. ००						५४२००.० ०	१८.३७	२३.३९	३८.५४	प्रसारणलाइन तथा सवस्टेशन निर्माणको लागि मिति २०७९।०४।१८ मा ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई मिति २०७९।०७।२१ मा ठेक्का प्रभावकारी भईसकेको तथा ठेकेदारबाट निर्माण कार्य भईरहेको ।लाईन तथा सवस्टेशन निर्माणको ठेक्कामा सोतमा कर कट्टि सम्बन्धमा द्विविधाका कारण प्रति पत्र खोल्न नसकेकोले निर्माण कार्यमा ढिलाई भएको । ठेकेदारलाई भुक्तानी हुन नसकेकोले गर्दा वित्तीय प्रगति कम देखिएको ।
56	गल्छी – रातमाटे २२० के भी. प्रसारणलाइन योजना	८२.०५	९००. ००	०.००	०.००	०.००	४८१००. ००	४९०००. ००	९००.० ०				६०४९९. ००	६१३९९.००	१२५.३०	४.४५	५.५७	गल्छीरातमाटे- खण्डको लागि ठेकेदारद्वारा डिजाईन कार्य भईरहेको तथा परामर्शदाताद्वारा Design review हुने कार्य भईरहेको ।

																		साथै Conductor आयात भई सईटमा आइसकेको । त्रिशुली ३ बी- रातमाटे खण्डको Estimate स्वीकृतिको लागि पेश भएको तथा बोलपत्र दस्तावेज तयार कार्य भईरहेको ।	
57	पाल्पा २२०/१३२ के.भी. सवस्टेशन आयोजना	५५.५६	३०.० ०	०.००	४०० ००.० ०	०.००	५०००.० ०	४५०३०.० ०	३०.००					१२११.५०	१२४१.५०	२.७६	४.६६	४.७०	जग्गा मुआब्जा वितरण गर्न निकासामा समस्या रहेको ।
58	गण्डक नेपालगंज प्रसारणलाइन आयोजना	२४.२९	१९०. ००	०.००	०.००	०.००	२९६१०.० ०	२९८००. ००	१९०.० ०					८१०.००	१०००.००	३.३६	०.००३	०.००२	विस्तृत सर्भे कार्य तथा माटो परिक्षण भईरहेको ।कार्यालय स्थापनाको लागि अफिस उपकरण कार्य उपलब्धि सम्बन्धि कार्य हुदै
59	दक्षिण कोरिडोर प्रसारण प्रणाली परामर्श सेवा आयोजना	०.००	१२५. ००	०.००	५०० ००.० ०	०.००	४४०५.० ०	५४५३०.० ०						०.००	०.००	०.९७	०.७९		परामर्श सेवा ।
60	काठमाण्डौं उपत्यका प्रसारण प्रणाली	०.००	१२.० ०	०.००	०.००	०.००	९८८.००	१०००.००						०.००	०.००	३.८५	५.२०		अध्ययन ।

	विस्तार आयोजना																	
61	काठमाण्डौ उपत्यका प्रसारण प्रणाली विस्तार आयोजना (Package A) (गोलढुंगा, बा लकोट, बागडो ल, रत्नपार्क, हरिसिद्धि)	१५.९१	५००. ००	०.००	०.००	०.००	३६०३०.० ०	३६५३०.० ०	५००.० ०				२४७०.० ०	२९७०.००	८.१३	२.८६	३.५५	अध्ययन, सब स्टेशन जग्गा अधिग्रहण संग सम्बन्धित कार्य हरु जारी रहेको गोलढुंगा सब स्टेशनको लागि जग्गा प्राप्ति सम्पन्न । Boundary Wall Estimate अन्तिम चरणमा रहेको र Bid document तयार भईरहेको बलकोट स को .स. Boundary Wall Estimate प्रारम्भिक चरणमा ।
62	काठमाण्डौ उपत्यका प्रसारण प्रणाली विस्तार आयोजना (Package B) (तिनपिप्ले, दहचोक, कपन गुम्बा, टोखा)	४.२६	६५०. ००	०.००	०.००	०.००	११८८५०. ००	११९५००. ००	६५०.० ०				४२२९.००	४८७९.००	४.०८	२.५०	३.००	प्रसारणलाइनको सर्भ तथा अध्ययन र IEE भईरहेको, सबस्टेशनहरुको soil investigation कार्य सम्पन्न । कपनगुम्बा र टोखा सबस्टेशनको जग्गा खरिद कार्य जारी रहेको । दहचोक सबस्टेशनको जग्गा खरिद कार्य सम्पन्न ।

63	काठमाण्डौ उपत्यका प्रसारण प्रणाली विस्तार आयोजना (Package C) (मनहरा, मैतीदेवी, मुलपानी)	३६.१३	४५०.००	०.००	०.००	०.००	७६०५३.००	७६५०३.००	४५०.००				१८८.००	६३८.००	०.८३	०.००२	५.७१	अध्ययन, सब स्टेशन जग्गा अधिग्रहण संग सम्बन्धित कार्य हरु जारी रहेको । सर्भे तथा प्रसारणलाइन अध्ययनको कार्य भएतापनि भुक्तानी हुन बाकि रहेको ।
64	काठमाण्डौ उपत्यका प्रसारण प्रणाली विस्तार आयोजना (Package D) (डुकुछाप , मातातिर्थ, टेकु, सुनाकोठी)	२७.४०	७००.००	०.००	०.००	०.००	७५०५७.००	७५७५७.००	७००.००				२०५४५.२८	२१२४५.२८	२८.०४	०.८८	४.६१	अध्ययन, सब स्टेशन जग्गा अधिग्रहण संग सम्बन्धित कार्यहरु जारी रहेको ।
65	काठमाण्डौ उपत्यका प्रसारण प्रणाली विस्तार आयोजना (Package E) (खरिपाटी, बनेपा, नाला गुम्बा, सिरुटार)	२०.१९	३००.००	०.००	०.००	०.००	४३२०२.५०	४३५०२.५०	१७४.१६					१७४.१६	०.४०	७.५२	१.२०	२२० के.भी र १३२ के.भी भूमिगत प्रसारणलाइन बिस्तृत अध्ययन तथा सर्भे कार्य भईरहेको ।

66	निजगढ ४०० के.भी सवस्टेशन आयोजना	०.००	१४५.००	७५०००.००	२५०००.००	०.००	२८४४४.६१	१२८५८९.६१						०.००	०.००	०.००	०.००	। IEE तथा विस्तृत सर्भे कार्य ने.वि.प्रा.को निजगढ पोखरिया ४०० के.भी. प्र.ला.आ. अन्तर्गत भईरहेको ।
67	निजगढ हर्नैया ४०० के .भी. प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	१२५.००	०.००	०.००	०.००	१८१९३.००	१८३१८.००	१२५.००				१४१०.००	१५३५.००	८.३८	१.८७	५.२५	साबिकमा पथलैया हर्नैया १३२ के.भी प्र.ला.आ को रुपमा अघि बढेको आयोजनाको स्कोप परिवर्तन भई हाल निजगढ हर्नैया ४०० के.भी. प्र.ला.आ को रुपमा अघि बढाइएको ।
68	हर्नैया ईनरुवा प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	७९०१.५६	७९०१.५६						०.००	०.००	०.९६	०.०२	अध्ययन ।
69	हेटौडा-ढल्केवार-इनरुवा ४०० के .भी. सवस्टेशन विस्तार आयोजना	९५.००	४५०.००	०.००	०.००	०.००	१६९४४.६१	१७३९४.६१	४५०.००				४३४३१.८८	४३८८१.८८	२५२.२७	९७.६८	९९.८१	ढल्केबर स.स. निर्माणको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई DLP समेत सम्पन्न भएको ४०० के.भी. हेटौडा तथा इनरुवा स.स. संचालनमा रहेको तथा Minor Outstanding कार्यहरु भई रहेको।विगतमा सम्पन्न कार्यहरुको भुक्तानी माग

																		भएकोमा हाल मात्र निकास प्राप्त भएको हुँदा यस अवधिमा वित्तीय प्रगति धेरै देखिन आएको ।
70	अरुण-ईनरुवा तिङ्गला मिर्चैया ४०० के .भी. प्रसारणलाइन आयोजना	१३९.४२	५३०.००	०.००	०.००	०.००	५८६३.००	६३९३.००	५३०.००				१७९४०.७०	१८४७०.७०	२८८.९२	४५.८६	९१.१९	साविकको परामर्शदातासंगको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी बाकि रहेको कामको लागि नयाँ परामर्शदाता नियुक्त भएको ।
71	ईनरुवा अनारमनि ४०० के .भी. प्रसारणलाइन आयोजना	०.०४	३२०.००	०.००	०.००	०.००	६१८०.००	६५००.००	३२०.००				५.००	३२५.००	५.००	०.०३	०.०२९०	Construction License को प्रक्रिया बढेको ।
72	रातेमाटे-रसुवागढी-केरुङ ४०० के भी. प्रसारणलाइन आयोजना	५५.८४	२९.००	०.००	०.००	०.००	२९३९.००	२९६८.००	२९.००				२६८.१०	२९७.१०	१०.०१	३२.२५	३२.७३	मिति २०८०/०४/१८ को मा.मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार भविष्यमा ४०० के.भी. प्र.ला, निर्माण गर्ने गरी हाललाई चिनको केरुंग स/स बाट नेपालको चिलिमे हब स/स सम्म २२० के.भी. प्र.ला.को विकास निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति

																		प्रदान गरिएको । सम्माननीय प्रधानमन्त्रिज्युको चिन भ्रमणको क्रममा भएको MOU अनुरूप २२० के.भी. प्र.ला. निर्माणको लागि वित्तिय अनुदान प्राप्त गर्न अर्थ मन्त्रालय मार्फत China International Development Cooperation Agency (CIDCA) लाई प्रस्ताव पठाइएको ।
73	थानकोट- चापागाउँ- भक्तपुर १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	७४.७०	६००. ००	०.००	०.००	०.००	२५५००.० ०	२६१००.० ०	४६७.० ०					४६७.००	१.७९	७५.००	८०.००	काठमाण्डौमा ६ कि.मी (पुरै सम्पन्न), भक्तपुर जिल्लामा २ कि.मि. सम्पन्न (४ कि.मि. मध्ये) लाईन तान्ने काम सम्पन्न । ललितपुर जिल्लामा प्रसारणलाइनको ROW को ९।९ मिटर दाँया बाँयाको क्षतिपूर्ति सतप्रतिशत माग गरीएको कारण सम्पूर्ण लाईनको काम बन्द हुन

																		पुगेको ।
74	नेपाल भारत विद्युत व्यापार प्रसारणलाइन (हेटौडा- ढल्केवार- इनरुवा ४०० के.भी. प्रसारण लाईन) (व.उ.शि.नं. ५०१०८११५)	४०.७४	१२५० ००.० ०	०.००	०.००	०.००	३३१५००. ००	४५६५००. ००	१२५०० ०.००				७५४६५.० ०	२००४६५. ००	४३.९९	९०.८९	९९.९८	कुल ७९२ मध्ये जम्मा ७72 स्थानमा Tower Foundation, ७71 स्थानमा Tower Errection र 524 ckt km तार तान्ने कार्य सम्पन्न Dhalkebar- Inaruwa खण्ड संचालनमा आएको । Hetauda- Dhalkebar खण्डको ७० कि.मि. लाइन १३२ के.भी.मा संचालनमा रहेको । Hetauda Substation, Inaruwa Substaion र Dhalkebar Substation संचालनमा रहेको
75	कालिगण्डकी रिडी १३२ के .भी. प्रसारणलाइन आयोजना उद्योग) मन्त्रालय (अन्तर्गत	९९.५९	०.००				१४३०३६. ७५	१४३०३६. ७५					१२९०६४. ००	१२९०६४.० ०	९०.२३	५३.७०	६९.६५	सामान आयात गर्ने तथा साइटमा निर्माण कार्य भईरहेको तर बजेट निकास प्राप्त नभएको कारण यस त्रैमाशिकमा भएको कार्यको विल भुक्तानी नभएकोले बजेट खर्च देखिएपनि ६.५ करोड

																		बराबरको दायित्व सिर्जना भएको छ ।
जम्मा			१४७, २६१. ००	७५,० ००.० ०	२४४, ०००. ००	२०,०० ६.००	२,९२१,०८ ९.७०	३,७०२,३५ ६.७०	१४५,६ ५९.१६	-	५४,० ५५.७ ८	७५,३९ ९.००	२,३११,९२ ९.५७	२,६४१,२४३ .५१				
औषत भौतिक (भारित) प्रगति (प्रतिशत)							७६.६५											
औषत वित्तीय प्रगति खर्च तथा) (प्रतिशत) बजेटको रकमको (आधारमा							७१.३४											

५.६.योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय


५.६.१. पृष्ठभूमी

नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत रहेका ९ वटा निर्देशनालयहरु मध्ये एक महत्वपूर्ण निर्देशनालय योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय हो । यस निर्देशनालय अन्तर्गत देहायका ३ वटा विभागहरु रहेका छन् :

- १) सूचना प्रविधि विभाग
- २) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग
- ३) विद्युत प्रणाली व्यवस्थापन विभाग

५.६.२. संगठनात्मक स्वरूप

Organization Structure of Planning, Monitoring & Information Technology Directorate

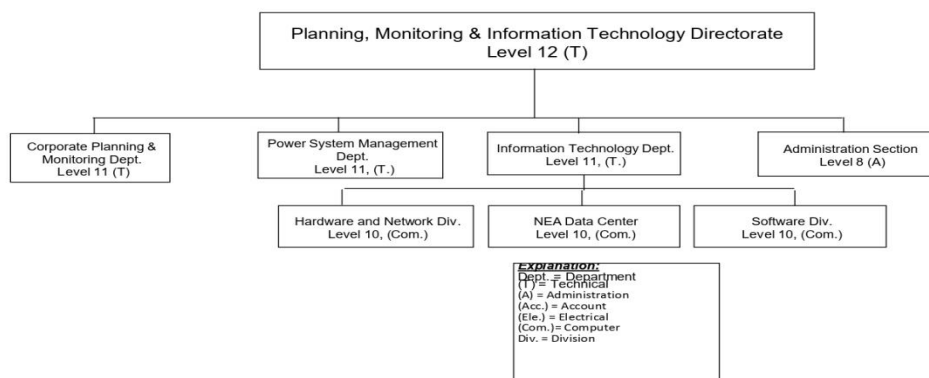

५.६.३. निर्देशनालयका प्रमुख कार्यहरु

यस निर्देशनालय अन्तर्गत रहेका विभिन्न विभागहरुको प्रमुख कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् :

१) विद्युत प्रणाली व्यवस्थापन विभाग

- Grid Impact Study (GIS) गर्ने ।
- Load Forecast गर्ने ।
- Transmission Plan Study and Energy Simulation Analysis गर्ने ।

२) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग

- नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालन हुने आयोजनाहरुको बजेट/वार्षिक विकास कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयको सफ्टवेयर LMBIS मा इन्ट्र गरी टुंगो लगाउने र वार्षिक विकास कार्यक्रम, उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउने ।
- नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालन हुने आयोजनाहरुबाट प्राप्त मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण अध्ययन, विश्लेषण तथा सारांश तयार गर्ने ।
- आर्थिक सर्वेक्षण तथा पूँजीगत खर्चहरुको विवरण मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउने ।
- बजेट कार्यन्वयन कार्य योजना तथा संशोधनको लागि श्री कार्यकारी निर्देशकज्यू समक्ष सिफारिश गर्ने ।
- संस्थागत विकास योजना (Corporate Development Plan) तयार गरी कार्यकारी निर्देशकज्यू समक्ष पेश गर्ने ।
- आयोजनाहरुको स्थलगत अवलोकन, लगायत अनुगमनको कार्य गर्ने ।
- ने.वि.प्रा.को वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्ने ।

३) सूचना प्रविधि विभाग

- कम्प्युटर नेटवर्किङ व्यवस्थापन गरी चुस्त दुरुस्त राख्ने ।
- ने.वि.प्रा.को वेबसाइट तथा इमेल ठेगानाहरु अद्यावधिक गर्ने ।
- CIS Software संचालन, व्यवस्थापन तथा अद्यावधिक गर्ने ।
- हाजिरी सफ्टवेयर संचालन तथा अद्यावधिक गर्ने ।

५.६.४. निर्देशनालय र यस अन्तर्गत रहेका विभागका जिम्मेवार अधिकारी र सम्पर्क नम्बर :

क्र.सं	निर्देशनालय/विभाग	जिम्मेवार अधिकारी	मोबाइल नम्बर	कार्यालय नं.
१	योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय	प्रमुख श्री दुर्गा नन्द बडियैत	९८४९२२८२२२	४९५३०६६
२	सूचना प्रविधि विभाग	निर्देशक श्री अनिलमान श्रेष्ठ	९८५९०४६९९९	४९५३०६३
३	संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग	निर्देशक श्री बसन्तध्वज श्रेष्ठ	९८९३४५८०९८	४९५३०७३
४	विद्युत प्रणाली व्यवस्थापन विभाग	निर्देशक श्री चन्दन कुमार घोष	९८५९०८५९९९	४९५३०७५

विभागहरूले सम्पादन गरेको कामको विवरण

१) विद्युत प्रणाली व्यवस्थापन विभाग

ने.वि.प्रा.को विभिन्न विभाग मार्फत आएको अनुरोध बमोजिम २०८१ साल माघ महिना देखि चैत्र महिनासम्म यस विद्युत प्रणाली व्यवस्थापन विभागले विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरूको प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न गरेको छ ।

● २०८१ साल माघ महिना देखि चैत्र महिनासम्म GIS सम्पन्न भएका जलविद्युत आयोजनाहरू

S.N.	NAME OF HPP	CAPACITY (MW)	COD	Substation Name	Voltage Level
1	Chandaha Khola HPP	4.356	28/29	Bhiman	33
2	Madhya Ghunsa Khola HPP	30.2	29/30	Dhungesangu	132
3	Upper Lapche HPP	52	27/28	Barahbise	400
4	Balephi A HPP	22.144	26/27	Pantang	33
5	Tadi Khola Small	6.6	26/27	Samundratar	33
6	Madame Khola	24	24/25	Lekhnath (Switchyard of Super Madi HPP)	132
7	Kalika Kaligandaki	47.485	28/29	New Bhartpur	132
8	Ikhuwa Khola	47.7	32/33	Haitar	132
9	Sirsagad Khola Small	2.5	28/29	Jogbuda	33
10	Landruk Modi HPP	99	28/29	Kushma	220
Total		335.985			

● २०८१ साल माघ महिना देखि चैत्र मसान्तसम्म GIS सम्पन्न Bulk Load Consumer

S.N.	Name of Load	Capacity MVA
1	Khanepani Prasodhan Kendra Surkhet	5

१. नयाँ बृटवल-लमही ४०० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजनाको अनुरोधमा उक्त प्रसारणलाइनमा Compensation आवश्यक भए/नभएको अध्ययन गरिएको ।

२) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग

- नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा वैदेशिक सहयोगमा संचालित आयोजनाहरूको तेस्रो त्रैमासिक तथा आ.ब. २०८१/८२ को प्रगति प्रतिवेदन तयार गरेको ।
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको लागि सरकार गठन भएको एक सय दिनका सूचकांकहरू तयार गरी पेश गरेको ।
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका निकायहरूबाट माग भएको विवरणहरू तयार गरी उपलब्ध गराएका ।

३) सूचना प्रविधि विभाग

- १) सूचना प्रविधि विभागले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अत्यावश्यक गतिविधिहरूलाई विद्युतीयमाध्यमबाट digitalized गरी स्वचालित रूपमा सञ्चालन गर्न अग्रगामी भूमिका खेल्दै आएको छ ।
- २) सूचना प्रविधि विभाग तथा अन्य कार्यालयहरू अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको Application Server, Network System हरूलाई स्यूचार्टर स्थित नवनिर्मित डाटा सेन्टरमा Migrate गर्ने कार्यको व्यवस्थापन भइरहेको र सो अन्तर्गत हाल केन्द्रिय कार्यालय स्थित सूचना प्रविधि विभाग तथा डाटा सेन्टर बीच Optical Fibre Communication Link र Redundancy link test भई सञ्चालनमा रहेको छ ।
- ३) सूचना प्रविधि विभाग अन्तर्गत रहेका Server Systems, Networking Devices and Applications लाई सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले SIEM (Security Incidence Event Management) प्रणाली जडान भई सञ्चालनमा रहेको छ, जसले ने.वि.प्रा.को नेटवर्क र IT संरचनामा हुने सुरक्षा खतराहरू जस्तै DDoS तथा Cyber Attack आदिलाई संकलन, अनुगमन तथा विश्लेषण गर्न

मदत गर्दछ । यसले नेटवर्कमा हुने सुरक्षा उलंघन अनौठौ गतिविधि र संभावित आक्रमणहरूलाई पहिचान गरी सजग गराउँदछ ।

- ४) ने.वि.प्रा.मा सञ्चालित Email System (Mail Box) बाट पनि Phishing like attack etc. हरूलाई Minimize गर्न नयाँ Email System मा Upgrade गरि सञ्चालन गर्ने कार्य भई रहेको छ ।
- ५) ने.वि.प्रा.का ग्राहकहरूलाई विद्युत महसुल तथा लाईन काट्ने सम्बन्धी पूर्व सूचना दिन SMS Portal तयार गरी सञ्चालन गरिएको छ ।
- ६) ने.वि.प्रा.का ठुला ग्राहकहरूको विद्युत महसुल भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्न Corporate Payment System लागु गर्ने कार्य भईरहेको छ ।
- ७) ने.वि.प्रा.मा सञ्चालित विभिन्न Software, Hardware & Network System हरूमा आइपने समस्याहरु कार्यलय बीच समाधान गर्न तथा समन्वय गर्न Ticket Management System Upgrade गरि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
- ८) ने.वि.प्रा. कानुन विभागमा हुने कार्यहरूलाई सहजीकरण तथा व्यवस्थित गर्न digital प्रणालीमा रुपान्तरण गरी Kanoon Management System को Testing कार्य भईरहेको छ ।
- ९) Meeting Management System लाई हालको आवश्यकतानुसार upgrade गरि सञ्चालनमा ल्याउने कार्य भईरहेको छ ।
- १०) ने.वि.प्रा.को गुनासो सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली (Grievance Management System) तयार गरी लागु गरिएको छ ।
- ११) Centralized Accounting System बाट VAT Payment सम्बन्धी सूचनाहरूलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको RMIS प्रणाली सँग Integration गर्ने कार्य भईरहेको छ ।
- १२) ग्राहकवर्ग तथा ने.वि.प्रा. अन्तरगत कार्यालयहरु बिच सूचना प्रवाह तथा समन्वय गर्नका लागि CRM (Customer relationship Management System) लाई Upgrade गर्ने कार्य भईरहेको छ ।

५.७. आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय

५.७.१. परिचय :


नेपाल विद्युत प्राधिकरण, आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय विशेष गरी एशियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा विभिन्न आयोजनाहरू मार्फत उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार, सबस्टेशन निर्माण तथा क्षमता अभिवृद्धि, वितरण लाइन एवं वितरण सबस्टेशन क्षमता विस्तार गर्ने उद्देश्यले ने.वि.प्रा. संचालक समितिको ६७८ औं बैठकबाट मिति २०७१।०३।२४ मा स्थापना भएको हो । यस निर्देशनालयले आयोजनाहरूको तयारी गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र आयोजना सम्पन्न भए पश्चात ने.वि.प्रा.का सम्बन्धित ग्रिड तथा वितरण केन्द्रहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य गर्दछ ।

५.७.२. निर्देशनालयको प्रमुख कार्यहरू:

- क) एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा विभिन्न आयोजनाहरू निर्माण गर्ने एवं तिनको अनुगमन तथा मूल्यांकनको कार्य गर्ने ।
- ख) एशियाली विकास बैंकको ऋण नं. २५८७, २८०८, ३५४२, ३९३९, २९९०, २९९१ तथा अनुदान नं. ०३६९, ५२० अन्तर्गत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण तर्फ आवश्यक आयोजनाहरू तर्जुमा गरी सो को कार्यान्वयन गर्ने ।
- ग) आयोजनाहरूको वार्षिक बजेट तयार गर्ने, कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृत गराउने, आवधिक लक्ष्य निर्धारण गर्ने, नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने तथा आवश्यक पृष्ठपोषण दिने ।
- घ) आयोजनाहरूको उपलब्धि सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू गर्ने ।
- ङ.) आयोजनाहरूको मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी तालुक निकाय एवं एशियाली विकास बैंकमा पेश गर्ने ।
- च) आयोजनाहरूको लेखापरीक्षण गराई सो को प्रतिवेदन तयार गरी तालुक निकाय एवं एशियाली विकास बैंकमा पेश गर्ने ।
- छ) निर्देशनालय तथा अन्तर्गतका आयोजनाहरूको दैनिक प्रशासनिक कार्यहरू संचालन गर्ने ।

५.७.३ . निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना :

Organization Structure of Project Management Directorate



Explanation:

Dept. = Department
 Misc. = Miscellaneous
 (T) = Technical
 (A) = Administration
 (Acc.) = Account
 (Ele.) = Electrical
 Div. = Division
 Env.=Environment

५.७.४ आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालय तथा आयोजनाहरुको प्रमुखहरुको नाम तथा सम्पर्क नम्बर :

सि.नं.	पद	नाम	कार्यालय/आयोजनाको नाम	सम्पर्क नं.
१	उप-कार्यकारी निर्देशक	तारा प्रसाद प्रधान	आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय	९८४१३३७०६८ ९८४१३३७०६८
२	निर्देशक	जुजुरत्न शाक्य	प्रमुख, प्रसारण लाईन तथा सबस्टेशन विभाग काठमाण्डौ उपत्यका प्रसारण क्षमता सुदृढीकरण आयोजना	९८४००५०१०६
३	निर्देशक	अच्युत दवाडी	प्रमुख, सामाजिक सुरक्षण तथा वातावरण व्यवस्थापन विभाग	९८४१३६९९११
४	निर्देशक	चन्धा न्यौपाने	संस्थागत सुदृढीकरण आयोजना	९८४१२४८२४०
५	निर्देशक	चन्दनकुमार घोष	कालीगण्डकी प्रसारण कोरिडोर आयोजना	९८५१०८५१११
६	निर्देशक	थर्कवहादुर थापा	समुन्द्रटार त्रिशुली ३ वी हव १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	९८४१२२४९३९
७	प्रबन्धक	बोधराज ढकाल	प्रमुख, वितरण लाईन तथा सबस्टेशन विभाग वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तार आयोजना तनहुँ विद्युतिकरण आयोजना संयोजक, प्रदेश नं २ ग्रामिण विद्युतिकरण आयोजना	९८४१२३९७७७
८	प्रबन्धक	रञ्जन राज गुरूङ्ग	कोहलपुर नेपालगंज १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना अरुणखोला दुम्किवास १३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना	९८५११५५७५२
९	प्रबन्धक	नितिश पौडेल	तामाकोशी काठमाण्डौ २००/४०० के.भि. तथा १३२ के.भि.प्रसारणलाइन आयोजना लप्सीफेदी तथा चांगुनारायण सबस्टेशन निर्माण आयोजना	९८५११५३१४६
१०	प्रबन्धक	विवेन्द्र कुमार भ्ना	नयाँ बटवल लमहि कोहलपुर ४०० के.भी.प्र.ला. आयोजना	९८५११२२९३२
११	प्रबन्धक	नारायण रेग्मी	मर्स्याडुदी कोरीडोर २२० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	९८५५०५७६५९
१२	प्रबन्धक	शुक्रराज देवकोटा	निजगढ-रमौली-पोखरीया १३२ के.भि. प्र.ला. आयोजना	९८५५०५७६५९
१३	प्रबन्धक	रमणराज शर्मा	आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय	९८५१२३२९९५
१४	प्रबन्धक	रविन्द्र श्रेष्ठ	काठमाण्डौ उपत्यका स्मार्ट मिटरिंग आयोजना डाटा तथा नियन्त्रण केन्द्र निर्माण आयोजना डिजास्टर रिक्भरी केन्द्र आयोजना	९८५११५७४२८
१५	उप निर्देशक	सुसान्त वास्तोला	अर्थ शाखा प्रमुख	९८५१२१५२५९
१६	उप निर्देशक	सिताराम त्खाछे	प्रशासन शाखा प्रमुख	९८४१४७६३६६
१७	उप-प्रबन्धक	रमेश प्रसाद पौडेल	बोरांग भर्लांग रातमाटे नैविसे २२० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	९८५११५७१७६
१८	उप प्रबन्धक	अभय प्रसाद न्यौपाने	काठमाण्डौ उपत्यका सबस्टेशन अटोमेशन आयोजना हेटौंडा परवानिपुर पोखरिया १३२ के.भि. प्र.ला. आयोजना वितरण प्रणाली/ग्रा. वि. गुरु योजना आयोजना	९८४१२९५६३०
१९	उप प्रबन्धक	अभिषेक अधिकारी	का.उ. मध्य तथा उत्तर वि. प्र. सुदृढीकरण आयोजना ग्रिड जडित सौर्य विद्युत उत्पादन आयोजना कर्णाली सौर्य उर्जा आयोजना सुपरीवेक्षण परामर्श सेवा आयोजना	९८४१३२४३९०
२०	उप प्रबन्धक	सुमन श्रेष्ठ	का.उ. पूर्व तथा दक्षिण वि.प्र.सुदृढीकरण आयोजना प्रसारण तथा वितरण सुपरिवेक्षण परामर्श आयोजना	९८५११८१६६६
२१	उप प्रबन्धक	धुपेन्द्र कुमार भ्ना	प्रदेश नं २ ग्रामिण विद्युतिकरण आयोजना लट नं. ५ आयोजना प्रमुख	९८५११५५०४६
२२	उप प्रबन्धक	उकेश श्रेष्ठ	चोभार-पाटन-चापागाउँ भूमिगत १३२ के.भी. प्र.ला.आ. का.उ. प्रसारण क्षमता सुदृढीकरण आयोजना (फेज २)	९८५१०७७७१२

२३	उप प्रबन्धक	प्रकाश पौडेल	खिम्ति बाह्रविसे लप्सीफेदी ४०० के.भि. सवस्टेशन आयोजना प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परामर्श आयोजना	९८५११७६५७
२४	उप प्रबन्धक	विश्वरञ्जन मिश्र	न्यू बूटवल-वर्दघाट २२० के.भी. प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशन आयोजना न्यू बूटवल कुश्मा सवस्टेशन विस्तार आयोजना	९८५११४०६२३
२५	उप प्रबन्धक	रोशन अग्रवाल	डाँडाखेत राहुघाट १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	९८४९४८४९०३
२६	उप प्रबन्धक	राजन हुंगेल	पाङ्गताड १३२ के.भी. सवस्टेशन आयोजना	९८५१२०२३०९
२७	उप प्रबन्धक	वलभद्र अधिकारी	घोराही माडीचौर १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	९८१३६७७९२३
२८	उप प्रबन्धक	पियुष मालाकार	का.उ. पश्चिम वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना	९८४९२८५३१२
२९	उप प्रबन्धक	दर्शन राय यादव	केरौन १३२ के.भी. सवस्टेशन आयोजना	९८५१०७३२७३
३०	उप-प्रबन्धक	सुशिल अर्याल	ओखरपौवा - तिन पिप्ले २२० के.भी. प्र.ला. तथा सवस्टेशन आयोजना	९८५११८०६६६
३१	उप-प्रबन्धक	शिषिर पोखरेल	दैलेख-कालीकोट-जुम्ला १३२ के.भी. प्र.ला. तथा सवस्टेशन आयोजना	९८५७०११२६५
३२	सहायक प्रबन्धक	बोधनाथ न्यौपाने	अरुणपुल तिडलन हव न्यु खिम्ति तामाकोशी ३ सुनकोशी हव ढल्केवर ४०० के.भि. प्र.ला. आयोजना वितरण तथा ट्रान्सफर्मर खरिद आयोजना	९८५११२६७००
३३	सहायक प्रबन्धक	अमित भगत	ग्रिड सवस्टेशन अटोमेशन आयोजना फेज २ प्रदेश नं २ ग्रामिण विद्युतिकरण आयोजना लट नं. २ आयोजना प्रमुख	९८५१३४३७१२
३४	सहायक प्रबन्धक	विजयकुमार श्रेष्ठ	स्मार्ट मिटरिंग आयोजना (फेज २)	९८४९२४५६०७
३५	सहायक प्रबन्धक	सागरमणी ज्ञवाली	चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण आयोजना	९८५११४०२३०
३६	सहायक प्रबन्धक	लक्ष्मण फुयाल	मस्र्याङ्दी काठमाण्डौ २२० के.भी. प्र. ला. आयोजना दुधकोशी जलविद्युत ४०० के.भी. प्र.ला. आयोजना	९८४९३३८२०१
३७	सहायक प्रबन्धक	योगेन्द्र ठाकुर	ललितपुर भक्तपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना	९८५१३४३५३७
३८	सहायक प्रबन्धक	सुमित श्रेष्ठ	अमलेखगञ्ज सवस्टेशन निर्माण आयोजना	९८४९५३४९३७
३९	सहायक प्रबन्धक	राजेन्द्र कोईराला	१३२ के.भी कन्डक्टर अपग्रेड आयोजना	९८५११४९२४४
४०	सहायक प्रबन्धक	बिरेन्द्रकुमार भ्ना	प्रदेश नं २ ग्रामिण विद्युतिकरण आयोजना लट नं. १ आयोजना प्रमुख	९८५२०२४९४०
४१	सहायक प्रबन्धक	गजेन्द्र नारायण यादव	खिम्ती - लामोसाँघु - राकाथुम (रामेछाप) १३२ के.भी. प्र.ला. आयोजना	९८४९७५२३५६
४२	सहायक प्रबन्धक	सुरेन्द्र चौधरी	Distributed Solar Energy Project	९८५११३४६११
४३	ईन्जिनियर	रणधिर पाठक	प्रदेश नं २ ग्रामिण विद्युतिकरण आयोजना लट नं. ३ र लट नं. ४ आयोजना प्रमुख	९८५४०३३३७७
४४	ईन्जिनियर	आनन्द सुवेदी	भरतपुर पोखरा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना	९८४९९७४४५५

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय
नेपाल सरकार तथा ने.वि.प्रा.द्वारा सञ्चालित आयोजनाहरूको आ.व. २०८१/०८२ को तेस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	बजेट शिर्षक नम्बर	तेस्रो त्रैमासिक अवधिको बजेट (रकम रु हजारमा)		तेस्रो त्रैमासिक अवधिको खर्च (रकम रु हजारमा)	तेस्रो त्रैमासिक अवधि लक्ष्यको तुलनामा खर्च प्रतिशत	शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा)	शुरुदेखि यस अवधिसम्मको प्रगति प्रतिशत	कैफियत
			भारित प्रगति प्रतिशत	जम्मा बजेट	जम्मा खर्च				
	१३२ के.भी. तथा अन्य भोल्टेजस्तरका प्रसारणलाइन विस्तार आयोजनाहरू	५०१०८१०१							
१	समुद्रटार-त्रिशुली ३"वी" हब १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना		०.००	४४६३.००	२५३.००	५.६७	९९.९८	९९.९८	त्रिशुली ३ वि हब सबस्टेन निर्माण कार्य अन्तर्गत १३२ के.भी. Bay Extension कार्य टेष्टिङको चरणमा रहेको तथा सोको भुक्तानी कार्य समेत टेष्टिङ कार्य सम्पन्न पश्चात अगाडी बढाईने भएकोले यस त्रैमासिक अवधिमा भौतिक र वित्तीय दुवै प्रगती नदेखिएको ।
२	ग्रिड सबस्टेशन सुदृढीकरण तथा क्षमता विस्तार आयोजना		०.००	१२५००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	आयोजना सम्पन्न भैसकेको र रिटेन्शन रकम भुक्तानी गर्न बाँकी भएकोले वित्तीय र भौतिक प्रगति नभएको ।

३	काठमाडौं उपत्यका प्रसारण क्षमता सुदृढीकरण आयोजना फेज १		१०१.७४	३०५००.००	८४०६२.००	२७५.६१	४१.०८	४३.६०	चोभारमा निर्माणाधिन GIS सबस्टेशनको कन्ट्रोल विल्डीङ्ग को Roof Casting को कार्य सम्पन्न भई फिनिसिङ्गको कार्य भईरहेको । फुटुङ्गमा निर्माणाधिन GIS सबस्टेशनको कन्ट्रोल विल्डीङ्गको तेस्रो तला निर्माण भई फिनिसिङ्गको अन्तिम चरणमा रहेको तथा GIS, Transformer Installation को कार्य सम्पन्न भई Testing कार्य प्रारम्भ भएको । थिमिमा निर्माणाधिन सबस्टेशनको कन्ट्रोल विल्डीङ्ग को Roof Casting को कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको । दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको सामाग्री यस अवधिमा प्राप्त भएको र सोको भुक्तानी समेत यस अवधिमा भएको कारण वित्तीय प्रगती बढी देखिएको ।
४	काठमाडौं उपत्यका सबस्टेशन अटोमेशन आयोजना		०.००	३०९००.००	२८०.००	०.९१	८६.००	८४.९२	वनेपा सबस्टेशनको अटोमेशन सम्पन्न भई Master Control Centre,

									मिनभवनबाट डाटा Read गर्न सुरु भएको ।
५	प्रसारण तथा वितरण सुपरिवेक्षण परामर्श आयोजना		२०.७३	३०७९२.००	५८७१.००	१९.०७	७२.३४	७६.३७	परामर्शदाताबाट परामर्शसेवा उपलब्ध भईरहेको । GIS Mapping कार्य सम्पन्न भएको ।
६	काठमाडौं उपत्यका प्रसारण क्षमता सुदृढीकरण आयोजना फेज २		१३.३३	२१०००.००	१६४३९७.००	७८२.८४	८.२३	७.९७	भक्तपुर, ठिमी भुमिगत प्रसारणलाइन अन्तर्गत १ कि.मी. १३२ के.भी. क्षमताको केबल तान्ने कार्य सम्पन्न भइको, HDPE Pipe २ कि.मी.विच्छ्याउने कार्य सम्पन्न भएको, आयोजना निर्माण लागि आवश्यक अधिकांश सामग्री साईटमा डेलिभरी भएको । दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा उपलब्ध भएको निर्माण सामग्रीको भुक्तानी समेत यसै अवधिमा भएको कारण वित्तीय प्रगती बढी देखिएको ।
७	हेटौडा परवानीपुर पोखरीया १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		८५.७१	६८०००.००	६७८७८.००	९९.८२	१०.५६	९.३०	पोखरियामा Site Labeling and Boundry Wall निर्माणको कार्य भईरहेको । स्टाफ क्वार्टर र गार्ड हाउस निर्माण तथा आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक

									डिजाइन र ड्रॉइङ्ग Approval को कार्य भईरहेको ।
८	प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण सुपरिवेक्षण परामर्श आयोजना		७९.७८	१७५२६.००	५७२१.००	३२.६४	४६.१७	५३.५२	आयोजनाको Design तथा Drawing हरू Review and Recommendation को कार्य परामर्शदाताबाट भईरहेको । निर्माणको क्रममा रहेका आयोजनाहरुको साईट सुपरभिजनको कार्य परामर्शदाताबाट भईरहेको र यस अवधिमा परामर्शदाताबाट सम्पन्न परामर्श सेवा बापातको बिल पेश नभएको कारण वित्तिय भौतिक र वित्तीय प्रगतीमा फरक देखिएको ।
९	१३२ के.भी. प्रसारण कन्डक्टर अपग्रेड आयोजना		०.००	१६२०००.००	३४१५.००	२.११	६२.८६	६४.२९	स्थानीयबासीको अवरोधको खुलाई आयोजना निर्माणको कार्य सुचारु गर्ने विषयमा छलफल भैरहेको ।
१०	ग्रीड सबस्टेशन अटोमेशन आयोजना फेज २		०.००	२४०००.००	५३९५.००	२२.४८	४९.५८	७०.०९	आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक सामग्रीहरु आयोजनाको साईटमा उपलब्धी भई Installation कार्य भईरहेको ।
११	डाडाखेत राहुघाट १३२ के.भी. प्रसारणलाइन		१०९.३०	३००००.००	२२३१५४.००	७४३.८५	५०.७०	६७.६५	डाँडाखेत-राहुघाट सबस्टेशन तथा प्रसारण लाईनको ठेक्का

	आयोजना								सम्झौता सम्पन्न भई डाँडाखेत सवस्टेशनमा Control Building तथा Switchyard Finishing को कार्य भईरहेको । प्रसारणलाइन अन्तर्गत सबै टावरहरुको मुआब्जा निर्धारणको काम सम्पन्न भई रकम वितरणको कार्य भईरहेको । ५२ वटा टावरको Foundation तथा ३८ वटा टावरको Erection, ८ वटा टावरको Foundation निर्माणको कार्य भईरहेको । वन विभागसँग जग्गाको सट्टाभर्ना कार्य सम्पन्न भई करिब ५०४ रोपनी जग्गा वन विभागको नाममा पास भईसकेको वृक्षारोपण तथा व्यवस्थापनको लागि लागत अनुमान तयारीको चरणमा रहेको । तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा राखिएको लक्ष्य भन्दा बढी कार्य सम्पन्न भई सोको भुक्तानी समेत भएकोले वित्तीय प्रगति बढी देखिएको ।
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

१२	घोराही-माडीचौर १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		४३०.००	१५०००.००	६५०००.००	४३३.३३	३८.८९	४९.६२	रोल्पा, प्यूठान तथा दाङ जिल्लामा पर्ने टावर प्याडको जग्गा अधिग्रहणको कार्य सम्पन्न भएको । सर्भेको Detail Study कार्य सम्पन्न भएको EIA कार्य सुरु भएको । वातावरण विभागबाट TOR स्विकृत भई EIA कार्य सम्पन्न भएको । सिभिल निर्माण अन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भएको । प्रसारण लाईनको Detail Survey को काम सम्पन्न भएको । टावर प्याडको जग्गा अधिग्रहणको कार्य सम्पन्न हुने क्रममा रहेको । १२२ वटा टावर मध्ये ४५ वटा टावरको Foundation र २ वटा टावरको Erection कार्य सम्पन्न भएको । खुप्री सबस्टेशनको लागि २ वटा Transformer आयात भई सोको भुक्तानी समेत भएको लगायतको कारण भौतिक र वित्तीय प्रगती बढी देखिएको ।
----	--	--	--------	----------	----------	--------	-------	-------	--

१३	पन्नाताड १३२ के.भी. सब्सटेशन आयोजना		३६.२४	७१५०००.००	६९००.००	०.९७	४१.८१	४७.२०	Swichard Protection तथा Staff Quarter निर्माणको कार्य भईरहेको , सिभिल निर्माण अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएका कार्यको डकुमेन्ट ठेकेदारबाट पेश नभएको कारण वित्तीय प्रगती कम देखिएको ।
१४	केरौन १३२ के.भी. सब्सटेशन आयोजना		१०८.२९	१२०००.००	४१२७३.००	३४३.९४	६२.०४	५७.९२	विस्तृत ईन्जिनियरीङ्ग डिजाईनका कार्यहरु तथा Outdoor सिभिल निर्माण कार्य अन्तर्गतका कार्यहरु अन्तिम चरणमा रहेको । Outdoor तथा Indoor Cable Trench तथा Control Room फिनिसिङ्गको कार्य भईरहेको । सामान उपलब्धी तथा सम्पन्न गरिएका कार्यको भुक्तानी यस अवधिमा हुन नसकेको कारण वित्तीय भौतिक प्रगतीमा फरक देखिएको ।
१५	कोहलपुर-नेपालगञ्ज १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		१९.०१	१९५०००.००	३४६८१.००	१७.७९	२२.९१	२३.७०	आयोजनाको सिभिल निर्माण कार्य अन्तर्गत Boundry Wall तथा Retaining Wall निर्माणका कार्यहरु भईरहेको । गर्ड हाउस,

									स्टाफ क्वार्टर, पार्किङ्ग सेड निर्माणको चरणमा रहेको । प्रसारणलाइनको सर्भे कार्य सम्पन्न भई भएको ।
१६	अरूणखोला-दुम्कीबास १३२ के.भी. सब्सटेशन आयोजना		९९.९०	५७९२.००	११३५२४.००	१९६०.०१	६६.९४	७२.११	केवल ट्रेन्च, स्वीचयार्ड तथा स्टोर रुम ढलानको कार्य सम्पन्न भई Equipment जडान कार्य भैरहेको तथा कन्ट्रोल रुम, स्टोर रुम, स्टाफ क्वार्टर आदी निर्माण कार्य भईरहेको ।
१७	मूलपानी १३२ के.भी. सब्सटेशन आयोजना		२९१.८९	११५०००.००	३०३२३२.००	२६३.६८	७६.६६	८६.५७	सब्सटेशन उपकरणहरूको जडान कार्य सम्पन्न भई १३२ के.भी. GIS सब्सटेशन चार्ज कार्य सम्पन्न भएको । अधिल्ला त्रैमासिक अवधिमा राखिएको लक्ष्य बमोजिमको सामग्री यस त्रैमासिक अवधिमा प्राप्त भई सोको भुक्तानी समेत भएका कारण भौतिक तथा वित्तीय प्रगती बढी देखिएको ।
१८	चोभार पाटन चापागाँउ १३२ के.भी. भूमीगत प्रसारणलाइन आयोजना		६१.३४	११५०००.००	९७९६८.००	८४.४९	३.८६	३.७५	पाटन सब्सटेशनमा Raft ढलान कार्य सम्पन्न भएको । GIS PEB foundation कार्य सम्पन्न भएको । PEB Equipment साईटमा डेलिभरी भएको । भूमिगत

									प्रसारण लाईन अन्तर्गत Joint Bay निर्माण कार्य १ वटा सम्पन्न भएको ।
१९	अमलेखगंज सबस्टेशन निर्माण आयोजना		०.००	१२०००.००	७२७१.००	६०.५९	६६.३८	९१.७४	१३२ के.भी. हेटौँडा पिलुवा प्रसारण लाईन र ६६ के.भी. प्रसारणलाइन Lop in Lop Out (LILO) को कार्य भईरहेको । जडान गरिएको Power Transformer चार्जिङ तथा सप्लाईको कार्य सम्पन्न भएको ।
२०	EGMP सुपरिवेक्षण परामर्श आयोजना		७८.४७	२८५१५.२०	१६६६४.००	५८.४४	४०.७०	४८.६०	परामर्शदाताबाट परामर्शसेवा प्रदान भईरहेको ।
२१	कालीगण्डकी कोरिडर २२० के.भी. प्रसारण आयोजना		१०४.५५	३१५००.००	५२०२९.००	१६५.१७	९९.६०	९९.५२	प्रसारण लाईन अन्तर्गतको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भई लाईन सञ्चालनमा आएको । यस अवधिमा प्रसारण लाईनको ROW मा पर्ने जग्गाहरुको क्षतिपूर्ति वितरणको कार्य तथा रिटेन्सन रकम भुक्तानी लगायतको कार्य भएको ।

२२	मर्स्याङ्दी कोरिडर २२० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		२६९.७६	१०५०००.००	६६६१०.००	६३.४४	७०.४६	६९.९६	उदिपुर भरतपुर प्रसारण लाईन अन्तर्गत Fall Back Plan मा Stringing कार्य करिब सम्पन्न भएको छ भने १२६ वटा टावर Erection र १५८ वटा टावर Foundaion कार्य सम्पन्न भएको छ । उदिपुर भरतपुर प्रसारणलाइन अन्तर्गतका सामाग्रीहरु साईटमा आपूर्ति भईरहेको छ । खुदि उदिपुर खण्डमा १८ वटा टावर फाउण्डेशन कार्य सम्पन्न भई १३ वटा टावर Erecting कार्य सम्पन्न भएको छ । दोस्रो त्रैमासिक तथा यस अवधिमा भएको कार्यको भुक्तानी गर्न बाँकी भएको कारण वित्तीय प्रगती कम देखिएको ।
२३	मर्स्याङ्दी-काठमाडौं २२० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		१६३.७९	६१०००.००	८१२५३.००	१३३.२०	९०.००	९६.००	मातातीर्थ २२० के.भी. सबस्टेशन निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको । तनहुँ, माकिचोकमा निर्माणाधिन २२० के.भी GIS Substation निर्माण कार्य अन्तर्गत ईलेक्ट्रिकल सामाग्री साईटमा उपलब्धि र

									जडान, सिभिल निर्माण कार्य अन्तर्गतका कार्यको भुक्तानी तथा रिटेन्शन रकमको भुक्तानी भएको कारण प्रगती बढी देखिएको ।
२४	सुपरीवेक्षण परामर्श सेवा आयोजना		०.००	१४३७४.९०	९८.००	०.६८	९०.५८	८४.१७	परामर्शदाताबाट परामर्शसेवा उपलब्ध भईरहेको ।
२५	न्यूबुटवल-बर्दघाट २२० के.भी. प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशन आयोजना		१५.५३	४१०००.००	७८२७.००	१९.०९	९०.१३	८९.५३	न्यू बुटवल सबस्टेशनको निर्माण कार्य सम्पन्न भई आ.व. २०८०/०८१ देखी पूर्ण सञ्चालनमा आईसकेको । न्यू बुटवल बर्दघाट प्रसारणलाइनको टावर निर्माण कार्य सम्पन्न भई एक सर्किट तारतान्ने कार्य सम्पन्न भई चार्जिङ्ग कार्य सम्पन्न भएको छ ।
२६	लप्सीफेदी-चाँगुनारायण सबस्टेशन निर्माण आयोजना		५९.३३	३४५०००.००	१८९०७२.००	५४.८०	७२.९९	७४.३५	लप्सीफेदी सबस्टेशनमा Control Room, GIS hall, Transfermer तथा Quarter Building को फाउन्डेसन Structure को निर्माण कार्य सम्पन्न भएको । चाँगुनारायण सबस्टेशनमा Gis Testing कार्य सम्पन्न भएको ।
२७	बोरंग-झर्लाङ-रातमाटे-नोविसे २२० के.भी.		५५.६१	२१०००.००	१२५२८.००	५९.६६	१९.७०	१२.५०	बोराङ्ग तथा लपाङ मा निर्माण हुने सबस्टेशनको

	प्रसारणलाइन आयोजना								लागि Soil Cutting and Site Labeling तथा Boundry Wall निर्माणको कार्य भईरहेको । ठेकेदारबाट Detail design र Detail Survey को कार्य भईरहेको Design तथा Drawing Approval को चरणमा रहेको तथा बोराडमा निर्माण हुने १३२ के.भी. क्षमताको सवस्टेशन तथा लापाडमा निर्माण हुने २२० के.भी. क्षमताको सवस्टेशनको लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा निर्धारणको कार्य सम्पन्न भई सोको भुक्तानी कार्य सम्पन्न भएको ।
२८	नयाँ बुटवल-लमही-कोहलपूर-नयाँ अतरिया ४०० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		१०८.७७	६०००.००	१९९१४.००	३३१.९०	२६.४६	२४.३६	परामर्शदाताले १३२ के.भी. सुर्खेत सवस्टेशन र ४०० के.भी. दोधारा सवस्टेशनको डिजाईन गरी सोको प्रतिवेदन आयोजनालाई पेश गरेकोमा आयोजनाबाट Approval दिईएको । मोतिपुर सवस्टेशनको लागि जग्गा अधिग्रहण कार्य गर्न प्रारम्भिक अधिकृत चयन कार्य सम्पन्न भएको ।

									ADB बाट EIA सहमति प्राप्त भएको । विद्युत विकास विभागबाट लमही देखी छिन्चु तथा दोधारा देखी नयाँ अत्तरीया सम्मको प्रसारण लाईनको IEE को TOR सहमती प्राप्त गरि सार्वजनिक सुनुवाईको कार्य सम्पन्न भएको तथा दोस्रो त्रैमासिक अवधिको परामर्श सेवाको भुक्तानी समेत यसै अवधिमा भएको कारण वित्तीय प्रगती बढी देखिएको ।
२९	नयाँ बुटवल लमही ४०० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		२४.६२	६००००.००	१३३१२.००	२२.१९	०.१८	०.१०	आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक Construction License प्राप्त भईसकेको । आयोजनाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने डिभिजन वन कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र ROW मा पर्ने रुखहरु गणनाको कार्य भईरहेको साथै आयोजनाको बोलपत्र कागजातहरु, लागत अनुमान लगायतका कागजात Review तथा No Objection को लागि ADB पठाईएको ।

३०	न्यू बुटवल— कुश्मा सवस्टेशन विस्तार आयोजना		०.००	३१०००.००	०.००	०.००	१०.८६	६.९०	यस अवधिमा ADB बाट Dcoument Review, Loan Agreement Tender Document Review गरी कागजात आयोजनामा प्राप्त भई बोलपत्र आव्हानको काम भएको ।
३१	ETDSP सुपरिवेक्षण परामर्श सेवा आयोजना		०.००	३२९००.००	४५१.००	१.३७	०.०२	०.०१	आयोजनाको TOR लागत ईष्टिमेट तथा Evaluation Criteria सम्बन्धि कागजातहरु सम्बन्धमा ADB बाट No Objection Letter प्राप्त भई EOI को लागि पठाईएको ।
३२	दैलेख —कालिकोट— जुम्ला १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		०.००	१५०००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	बोलपत्र कागजात तयारी हुने क्रममा रहेको ।
३३	अरूणपूल तिडला न्यूखिमित तामाकोशी ३ सुनकोशी हब ढल्केवार ४०० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		३१.२१	७२३४०.००	२२२८२.००	३०.८०	४६.३४	५३.६९	सवस्टेशन तथा प्रसारणलाइनको विस्तृत डिजाईन प्रतिवेदन तथा लागत तयार भएको । परामर्शदाताबाट पेश भएका रिपोर्टहरु स्वीकृती हुने चरणमा रहेको ।

३४	तामाकोशी-काठमाण्डौ २२०/४०० के.भी. प्र.ला. आयोजना		३३.८२	३०००००.००	१०८८१७.००	३६.२७	७६.६६	७८.८१	खिम्ती - बाह्रबिसे ४०० के.भी. प्रसारणलाइन निर्माण तर्फ ११८ वटा टावर फाउण्डेशन तथा ११६ वटा टावर इरेक्सन कार्य सम्पन्न भई ४३.० कि.मी. तार तान्ने कार्य सम्पन्न भएको । बाह्रबिसे -लप्सीफेदी र लप्सीफेदी - दुवाकोट १३२ के.भी. प्रसारणलाइनको ११९ वटा टावर फाउण्डेशन तथा ११८ वटा टावर इरेक्सन कार्य सम्पन्न भई कार्य भई ४३ कि.मी. तार तान्ने कार्य सम्पन्न भएको । बाह्रबिसे २२०/१३२/११ के.भी. सबस्टेशन निर्माणको सम्पूर्ण कार्य समाप्त भई पहुँचमार्ग पिच गर्ने तथा १३२ के.भी. Supply पश्चात सबस्टेशनको Testing & Maintenance र चार्ज गर्ने क्रममा रहेको ।
३५	दूधकोशी जलविद्युत ४०० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		२४.१४	२३२६.८०	५४७.००	२३.५१	३८.१४	२७.६९	विद्युत विकास विभागबाट TOR स्वीकृत भई IEE को प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा रहेको । आयोजनाको फिल्ड भिजिट भई सामाजिक तथा

									वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका कार्यहरु सम्पन्न भई सार्वजनिक सुनुवाईका कार्यहरु सम्पन्न भईसकेको ।
३६	लामोसाँघु रामेछाप १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		०.००	४५०००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	लागत अनुमान तथा डिजाईनका डकुमेन्टहरु Review को चरणमा रहेको ।
३७	दमौली कुश्मा बुर्तिबांग बाफिकोट ४०० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		०.००	३००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	लागत अनुमान तथा डिजाईनका डकुमेन्टहरु Review को चरणमा रहेको ।
३८	बुढीगण्डकी कोरिडोर ४०० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		०.००	३००.००	०.००	०.००			लागत अनुमान तथा डिजाईनका डकुमेन्टहरु Review को चरणमा रहेको ।
३९	निजगढ रमौली पोखरिया ४०० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		३४.६२	६००००.००	९७१.००	१.६२	३.९४	०.४३	रमौली सबस्टेशनको माटो परिक्षणको क्रममा रहेको, आयोजना निमाणको लागि IEE स्वीकृतीको चरणमा रहेको । रमौली सबस्टेशनको लागी आवश्यक जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति मुल्याङ्कनको कार्य भईरहेको । प्रसारण लाईन तथा सबस्टेशनको बोलपत्र कागजात तयारीको कार्य भईरहेको ।

४०	ओखरपौवा-तिनपिप्ले २२० के.भी. प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशन आयोजना		०.००	४५०००.००	४७.००	०.१०	०.००	०.००	आयोजना निमाणको लागि IEE को लागि TOR विद्युत विकास विभागमा पेश भएको । आयोजनाले निर्माण गर्ने सबस्टेशनको जग्गा अधिग्रहणको कार्य अगाडी बढाईएको । Drawing का कार्यहरु भईरहेको ।
	५०१०८१०१ जम्मा			२९३४०२९.९०	१८२१८९७.००				
	अन्य ३३ के.भी. लाइन तथा सबस्टेशन आयोजना	५०१०८१०३		०.००	०.००		०.००	०.००	
४१	वितरण प्रणाली सुद्विडिकरण तथा विस्तार आयोजना		३७.८१	४५०००.००	८०३८.००	१७.८६	९२.७६	९७.६९	सामान आपूर्ति पहिलेनै भई हाल सबै सबस्टेशनहरु सञ्चालनमा आईसकेको । यस अवधिमा भएका कामको भुक्तानी गर्न बाँकी भएको कारण वित्तीय प्रगति कम देखिएको ।
४२	तनहुँ विद्युतीकरण आयोजना		५०.१३	९१२५.००	५३९५.००	५९.१२	९५.२४	९९.४२	सामान आपूर्ति पहिलेनै भई हाल सबै सबस्टेशनहरु र विद्युतीकरणका लाईनहरु जडान तथा निर्माण कार्य सम्पन्न भई सबस्टेशन र प्रसारणलाइन हस्तान्तरणको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको पूँजीकरणका कामहरु भईरहेको ।

४३	ग्रिड जडित सौर्य विद्युत उत्पादन आयोजना ग्रिड जडित सौर्य विद्युत उत्पादन आयोजना (VGF)		०.००	६०२००.००	३३.००	०.०५	५८.२७	७०.३३	प्रस्तावकहरूसँग Contract Agreement गरिएको । पाँचवटा २४ मे.वा. प्रस्तावकहरु मध्ये पाँच वटाले ने.वि.प्रा. सँग PPA गरेको र सो मध्ये ३ वटा कम्पनिले ११ मे.वा. निर्माण सम्पन्न तथा Commissioning कार्य सम्पन्न गरी ने.वि.प्रा. लाई PPA बमोजिम सौर्य विद्युत विक्री गरिरहेको ।
४४	कर्णाली सौर्य उर्जा आयोजना		७.१३	२६७५००.००	१८४०८.००	६.८८	९.७२	१०.२९	Topography Survey तथा Grid Connectivity Survey कार्य सम्पन्न भईसकेको, General Plant Layout, Civil Design & Major Equipment हरुको Detail Engineering अन्तर्गतका कार्यहरु भईरहेको ।
४५	काठमाडौं उपत्यका मध्य तथा उत्तर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना		०.००	६२५००.००	१२२०८.००	१९.५३	७८.१२	७७.२७	हालसम्म महाराजगंज स/स अर्नात बुढानिलकण्ठ, चपली, गोल्फुटार, हात्तीगौडा, महाराजगंज, मण्डिखाटार, धापासी हाईट, चुनदेवी, रानिवारी, बानियाटार, बालुवाटार लागयतका

								विभिन्न स्थानमा भुमिगत कार्य भई हालसम्म १८०५ वटा सर्भिस फिडर प्यानल, ६४९ वटा फिडर प्यानल र २६ वटा RMU फाउन्डेशनको निर्माण कार्य भईसकेको र १६९१ वटा सर्भिस फिडर प्यानल, ६१४ वटा फिडर प्यानल र २५ वटा RMU जडानको कार्य सम्पन्न भएको छ । महाराजगंज वितरण केन्द्रको वितरण प्रणाली भुमिगत गर्ने तथा सुदृढीकरण गर्ने तथा सुदृढीकरण गर्ने कार्यमा ५७८ कि.मी. HDPE Pipe Laying गरेको र १७२ कि.मि. PLB HDPE Pipe Laying, ३३१ कि.मी. LT(XLPE) र १८५ कि.मी. HT(XLPE) को Cable Laying कार्य सम्पन्न भईसकेको छ । महाराजगंज सबस्टेशन अन्तर्गत १३२ कि.मी. HT(XLPE), १६२ कि.मी. LT(XLPE), २० वटा RMU र २७४ वटा फिडर प्यानल र ८२६ वटा
--	--	--	--	--	--	--	--	---

									सर्भिस फिडर प्यानल Commissioning कार्य भईसकेको । तीनकुने - माईतीघर खण्डमा HDPE Pipe Laying कार्य सम्पन्न भई केबल विछ्याउने कार्य सुरु गरिएको ।
४६	काठमाडौं उपत्यका पूर्व तथा दक्षिण वितरण सुदृढीकरण आयोजना		४.७१	४२५००.००	८९३१.००	२१.०१	१०.७२	८७.२६	सेतोपुल- डिल्लीबजार - पुतलीसडक र तीनकुने - एयरपोर्ट - गौशाला सडकखण्डमा भूमिगत कार्य भईरहेको सम्पन्न भएको । त्रिपुरेश्वर-सुन्धारा-जमल- लैनचौर सडकखण्डमा भूमिगत कार्य हुँदै ।
४७	काठमाडौं उपत्यका पश्चिम वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना		५३.८२	१६२५००.००	९४२४४.००	५८.००	१०.९२	९९.००	१९० कि.मी. ११ के.भी. XLPE Cable तथा १७७ कि.मी. ४०० भोल्ट XLPE Cable जडान भईसकेको छ । कालिमाटी- कलंकी, कालिमाटी-बल्खु-चोभार, जडिबुटी-पेप्सीकोला, बाग्मती कोरिडोर, किर्तीपुर एरिया तथा कलंकी- थानकोटमा एकतर्फको कार्य सम्पन्न भईसकेको । कोटेश्वर वालकुमारी खण्डमा पाईप Laying

									कार्य सम्पन्न भएको तथा कलंकी थानकोट खण्डमा बाँकी रहेको Under Ground कार्य अन्तर्गत पाईप Laying कार्य सम्पन्न भई केवल बिछ्याउने कार्य प्रारम्भ हुने चरणमा रहेको ।
४८	ललितपूर भक्तपूर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना		९.८५	२८२५००.००	३१२७८.००	११.०७	४४.९७	४९.१०	LT XLPE Cable Laying 69 KM, HT XLPE Cable Laying 127 KM, LT Feeder Pillar & Service Pillar 790 Installation, RMU 41 Installation, HDPE Pipe Laying 255 Km, Pole Installation 141 Pcs, Civil Foundation Works 1013 Nos
४९	पोखरा भरतपूर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना		५१.०२	२१८५००.००	३३८८७.००	१५.५१	५२.१७	७३.१७	पोखरामा ५ वटा फिडर चार्ज गरिएको र भरतपुरमा ३ वटा फिडर चार्ज कार्य सम्पन्न भएको । भरतपुरमा ६ कि.मी. केवल र पोखरामा १० कि.मी. केवल तथा पोखरामा ५ कि.मी. पाईप बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको । HDPE Pipe, ABC Cable, DO Fuse, Feeder Pillar लगायतका निर्माण उपकरणहरु साईटमा

									डेलिभरि भएको तर सोको भुक्तानी हुन बाँकी भएको कारण वित्तिय प्रगति कम देखिएको ।
५०	कर्णाली बिद्युतिकरण आयोजना		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	आयाजनाको यस आ.व.मा कुनै लक्ष्य नरहेको ।
	५०१०८१०३ जम्मा			११५०३२५.००	२१२४२२.००				
	विद्युत विकास दशक सम्बन्धी कार्य योजना	५०१०८१२७							
५२	स्मार्ट मिटरिङ्ग आयोजना		०.००	५८२१.४०	८७०.००	१४.९४	८९.७३	१००.००	हाल यस आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई Completion Certificate पनि जारी भईसकेको । FMS, AMC Period मा रहेको ।
५३	विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन पूर्वाधार तथा विकास आयोजना		१३.७४	२६५००.००	९५०.००	३.५८	१००.००	१००.००	कम्प्लीसन सर्टिफिकेट जारी गरिएको ।
५४	डाटा तथा नियन्त्रण केन्द्र निर्माण आयोजना		०.००	५०८००.००	७३४.००	१.४४	८४.४१	९२.००	Data Center निर्माण कार्य सम्पन्न भई Capitalization को प्रक्रियामा रहेको छ । सिभिल निर्माण अन्तर्गतका कार्यहरु सम्पन्न भई डाटा सेन्टर चार्जिङ्ग गरी हाल टेष्टिङ्ग फेजमा रहेको । थापाथली स्विचिङ्ग स्टेशन लगायत

									उपत्यका बाहिरका पोखरा, भरतपुर, बनेपा र पाँचखालको सबस्टेशनहरुमा समेत आयोजनाले RTU Installation को कार्य सम्पन्न गरी डाटा संकलन गर्ने कार्य भईरहेको छ ।
५५	डिजास्टर रिक्भरी सेन्टर आयोजना		०.००	३०००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	सिभिल सर्भे तथा नेटवर्क सर्भेको कार्य भईरहेको । परामर्शदाताको सहयोगमा बोलपत्र तयारीको कार्य सम्पन्न गरी स्वीकृतीको प्रक्रियामा रहेको ।
५६	स्मार्ट मिटरिङ्ग आयोजना (फेज २)		०.००	३०००.००	८३.००	२.७७	०.००	०.००	बोलपत्र कागजात तयारी हुने क्रममा रहेको । MDMS Software को प्रयोगका विषयमा छलफल भईरहेको ।
५७	NEA Digital Network and SCADA Expansion Project		०.००	३०००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	परामर्शदाताको सहयोगमा बोलपत्र तयारीका कार्यहरु भईरहेको ।
	५०१०८१२७ जम्मा			९२१२१.४०	२६३७.००				
	सासेक विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना	५०१०८१२८							
५८	प्रदेश नं. २ ग्रामिण विद्युतिकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण		१९.२६	३५२४७५.००	६७२९३.००	१९.०९	५२.५१	६८.४९	३२,००० PSC Pole मध्ये १७,००० थान PSC Pole गाड्ने कार्य सम्पन्न भएको


	आयोजना								१० वटा सबस्टेशन मध्ये २ वटा सबस्टेशन चार्ज सम्पन्न भएको । २ वटा सबस्टेशन चार्ज हुने अवस्थामा रहेको र ६ वटा सबस्टेशनमा सिभिल निर्माण कार्य भईरहेको ।
५९	खिम्ती—बाह्रबिसे— लप्सिफेदी ४०० के.भी. सबस्टेशन आयोजना		९७.०८	३०००००.००	३३४५३०.००	१११.५१	६०.८१	७१.५१	अघिल्लो त्रैमासिक अवधिमा सम्पन्न भएको कार्यको भुक्तानी यस अवधिमा भएको तथा यस अवधिको सामान उपलब्धी, निर्माण कार्य तथा Installation कार्यको भुक्तानी नभएको कारण वित्तीय र भौतिक प्रगतीमा फरक देखिएको ।
	५०१०८१२८ जम्मा			६५२४७५.००	४०१८२३.००				
	कुल जम्मा		४९.५१	४८२८९५१.३०	२४३८७७९.००	५०.५०			

५.८. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालयः

५.८.१. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालयको कार्य विवरण :

१. पूर्वाधार तथा जलविद्युत विकास सम्बन्धी कार्यहरु,
२. जलविद्युत, पानीको बहुपक्षीय उपयोग वा अन्य पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा ईन्जिनियरिङ्ग, वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुगमन, माटो परिक्षण तथा ड्रिलिङ सम्बन्धी कार्य,
३. ट्रान्सफर्मर तथा अन्य महत्वपूर्ण विद्युत सम्बन्धी यन्त्रहरुको परीक्षण र मर्मत सम्बन्धी कार्य,
४. गुणस्तरीय कंक्रीट पोलको उत्पादन र बिक्री गर्ने सम्बन्धी कार्य,
५. जलविद्युतसँग सम्बन्धित प्राविधिक तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति तयार गर्न तालिम सञ्चालन गर्ने कार्य,
६. जलविद्युत ईन्जिनियरिङ्ग र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवसायिक सेवा व्यापारिक रुपमा प्रदान गर्ने कार्य,
७. प्राधिकरणको काममा बाधा नपुग्ने गरी विभिन्न उपकरण तथा भौतिक साधन/सुविधा पूर्व निर्धारित दरमा अन्य निकायलाई उपलब्ध गराउने कार्य,
८. निर्देशनालय अर्न्तगतका विशेषज्ञ दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिलाई निर्धारित पारिश्रमिक, ओभरहेड आदि लिई कामको विवरण र कार्यविधि तोकी सरकारी, अर्ध सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई आवश्यकतानुसार उपलब्ध गराउने कार्य,
९. जलविद्युत विकास र सोसँग सम्बन्धित काम संयुक्त रुपमा गर्ने कार्य,
१०. निर्देशनालय अर्न्तगतका सम्पूर्ण कार्यालय तथा आयोजनाहरुको अध्ययन अनुगमन, निरीक्षण तथा सूपरिवेक्षण गर्ने कार्य आदि ।

५.८.२. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना :

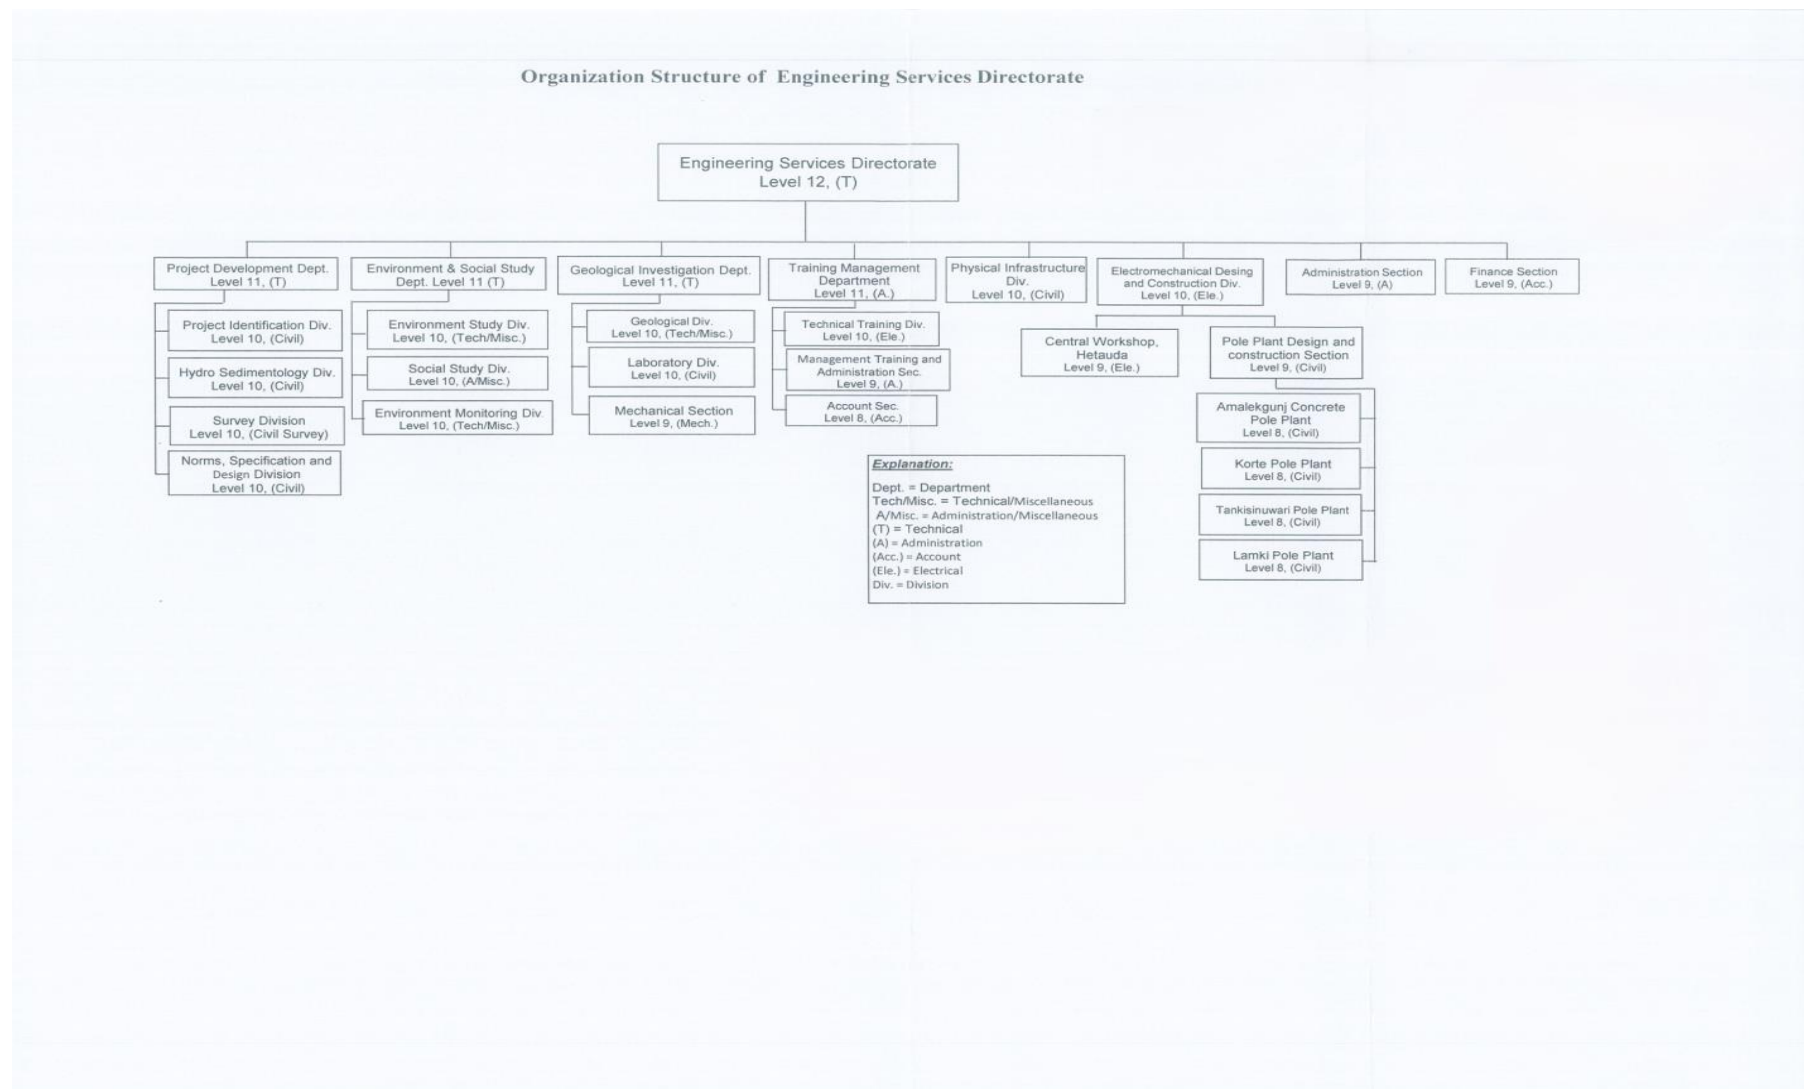

५.८.३. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय अन्तर्गतका आयोजनाहरुको नाम :

१. भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण आयोजना ।

५.८.४. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय अन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखहरु :

सि नं.	कार्यालयको नाम	कार्यालय प्रमुखको नाम	फोन नं	इमेल ठेगाना
१	श्री ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय	श्री मोतिलाल महतारा	९८५१०७०४९८	engineering@nea.org.np
२	श्री आयोजना विकास विभाग/रुपा बेगनास जलाशययुक्त जविआ	श्री नसिबमान प्रधान	९८५११३२८७६	pdd@nea.org.np
३	श्री वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग	श्री मिलन दाहाल	९८५११४९६५९	env.social@nea.org.np
४	श्री भौगर्भिक परीक्षण विभाग, ने.वि.प्रा.	श्री टिकाराम पौडेल	९८४९३९१७२०	srcl@nea.org.np
५	श्री तालिम विभाग, खरिपाटी	श्री मोतिलाल महतारा	९८५१०७०४९८	training@nea.org.np
६	श्री ईलेक्ट्रो मेकानिकल डिजाइन महाशाखा	नारायण कुमार प्रसाई	९८४९३४८९१४	electromech@nea.org.np
७	श्री भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण आयोजना	श्री प्रनिल पराजुली	९७६७२८६६६७	bpicp@nea.org.np
८	श्री केन्द्रीय वर्कशप हेटौडा	श्री माधव प्रसाद पौडेल	९८५५०३६५५५	central.workshop@nea.org.np
९	श्री कंक्रीट पोल प्लान्ट, अमलेखगञ्ज	श्री शम्मी कर्ण	९८५५०२४७०४	poleplant.amlekhganj@nea.org.np
१०	श्री कंक्रीट पोल प्लान्ट, लम्की आयोजना	श्री सुरेन्द्र कैनी	९८४९६९९६५९	pplamki2079@nea.org.np
११	श्री कंक्रीट पोल प्लान्ट, कोत्र तनहुँ	श्री सुजित घिमिरे	९८५६०२५४३७	poleplant.kotre@nea.org.np
१२	श्री कंक्रीट पोल प्लान्ट टाँकि	श्री विजय कुमार गुप्ता	९८४९५६९८७६	cppt@nea.org.np

५.८.५. Building and Physical Infrastructure Construction Project

1. Introduction

The Nepal Electricity Authority, one of the largest organizations in Nepal, was formed by merging the Electricity Department, the Nepal Electricity Corporation, and various Development Boards in 1985. At the central level, NEA is divided into various Directorates consisting of Departments and Divisions. The existing office space in the NEA head office complex at Durbarmarg is not adequate to accommodate all the central offices due to haphazard space planning and the layout of existing old buildings.

For optimum utilization of land located at prime locations, NEA established the new project named Building and Physical Infrastructure Construction Project (BPICP) on 2074/06/09. The main objective of this project is to construct the corporate office building at Durbarmarg and other similar infrastructure all over Nepal.

Corporate Office Building (COB)

BPICP revised the design drawing of COB and presented the design at the Board meeting held on 29th Chaitra 2079 for consent on "Construction of NEA Corporate Office Building at Durbarmarg" and the board acceded. BPICP invited the National Competitive Bidding to the eligible bidders of Nepal for the construction of COB at Durbarmarg on 13 Sep 2023. Eight bidders participated in the bidding process and the Bid evaluation committee is assessing the proposals submitted by the bidders.

New Office Buildings at Bhagwanpau and Lainchaur

NEA Board Meeting held on 31st Bhadra 2078, had decided to initiate the construction of NEA Office buildings at Lainchaur and Bhagwanpau. BPICP published the notice of Invitation for Bid (IFB) in the national daily Gorakhapatra on 2078/10/21 and selected the substantially responsive bidder with lowest price quote.

Work done in FY 2081/82

BPICP executed following activities in FY 2081/82.

1.1. Lainchaur Building

- a. Excavation of foundation
- b. Foundation Pile boring works for 155 number of piles
- c. Setup of Internal Laboratory
- d. Dewatering works
- e. Protection of side wall at north side
- f. Cumulative Financial Progress = 11.11%

1.2. Swayambhu Building

- a. Completion of Superstructure of Block C up to second floor.
- b. Fair faced brickwork in West, East and North side.
- c. Local Chimney made Brickwork.
- d. Plaster work on wall and ceiling surface.
- e. Wood work for windows and doors.
- f. Cable conducting works for electric wiring.
- g. Cumulative Financial Progress = 28.25%

५.८.६. आयोजना विकास विभागबाट सम्पादन गरीएका कामको विवरण

आयोजना विकास विभागको मिति २०८१।४।१ देखि २०८१।१२।३१ सम्म स्वतः प्रकाशनको लागी कार्य प्रगति विवरण

कर्णाली चिसापानी बहुउद्देशीय जल विद्युत आयोजना:

१. कर्णाली चिसापानी बहुउद्देशीय जल विद्युत आयोजनाको Detail Engineering Design and Preparation of Tender Documents को परामर्श सेवा अन्तर्गत आव्हान भएको Expression of Interest (EOI) मा प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन कार्य सम्पन्न गरी परामर्शदातृ संस्थाहरुलाई सुचिकृत (Short-listing) गरि Request of Proposal (RFP) को कागजात तयार भई स्वीकृतिका लागि पेश भएको ।
२. यस आयोजनास्थलको Sediment sampling सम्बन्धी कार्य गर्न साईट भिजिट गरिएको । साथै DHM सँग Sediment sampling का लागि सहकार्य गर्न प्रस्ताव गरिएको ।
३. कर्णाली चिसापानी बहुउद्देशीय जलविद्युत आयोजनाको Environmental and Social Studies कार्यको लागि Terms of Reference को कागजात तयार पार्ने जारी रहेको ।

सुनकोशी-३ जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजना:

- १) सुनकोशी-३ जल विद्युत आयोजनाको Detail Engineering Design and Preparation of Tender document तयार गर्न परामर्शदाता छनोटको लागि Expression of Interest (EOI) को मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी Shortlisted प्रस्तावदाताहरूसँग Request of Proposal (RFP) माग गरेको र उक्त प्रस्तावदाताहरुबाट पेश भएको Request of Proposal (RFP) को मूल्याङ्कन कार्य चालु रहेको ।
- २) सुनकोशी-३ जल विद्युत आयोजनाको Environmental and Social Studies कार्यको लागि Terms of Reference को कागजात तयार भई (EOI) Document तयारीको चरणमा रहेको ।
- ३) सुनकोशी-३ जलविद्युत आयोजनाको Hydropower Sustainability Assessment तयार पार्ने कार्य सम्पन्न भएको ।

अरुण-४ अर्ध-जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना:

- अरुण-४ जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन कार्य गर्नको लागि Survey License अनुमति पत्रको नविकरण गरिएको ।
- अपर अरुण जलविद्युत कम्पनीको अपर अरुण जलविद्युत आयोजनासंग समन्वय गरि अरुण-४ जलविद्युत आयोजनाको Headwork's Layout Optimization गर्ने कार्य गरिएको ।

जावा तिला अर्ध-जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना:

- Capacity optimization कार्य सम्पन्न भई आयोजनाको dam height 18m र Installed capacity 72.86 MW निर्धारण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको ।
- Electrical Resistivity Tomography (ERT) कार्य गर्न भौगर्भिक परीक्षण विभाग र आयोजना विकास विभाग बीच MOU सम्झौता सम्पन्न भई कार्य चालु रहेको ।
- जावातिला आयोजनाको Gauge Height र discharge मापन कार्य चालु रहेको ।

स्यापु दह पम्प जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना:

- Capacity optimization कार्य सम्पन्न भई आयोजनाको माथिलो जलाशयको dam height 7m, तल्लो जलाशयको dam height 67 m र Installed capacity 363 MW निर्धारण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको ।
- Electrical Resistivity Tomography (ERT) कार्य गर्न भौगर्भिक परीक्षण विभागसँग MOU सम्झौता भई कार्य चालु रहेको ।
- यस आयोजनाको Gauge Height र discharge मापन कार्य चालु रहेको ।

आँधिखोला जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजना:

१. आँधिखोला जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजनाको Project cost estimate Update गरिएको ।
२. आँधिखोला जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजनामा Pump storage को सम्भाव्यता अध्ययनको लागि Reservoir simulation को कार्य सम्पन्न भएको ।

वेगनास रुपा पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजना:

१. वेगनास रुपा पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) को लागी वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग मार्फत अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको ।

२. वेगनास रुपा पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजनाको तल्लो ताल रुपा तालमा नेपाल सरकारद्वारा निर्माणाधीन रुपा ताल सिचाई आयोजनासँग एकरूपता कायम गर्न सभै गर्ने कार्य सम्पन्न भएको ।
३. वेगनास रुपा पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजनाको Different Tunnel options को अध्ययन गरी Economical analysis गर्ने कार्य गरेको ।

साना जल विद्युत क्षमता अभिवृद्धि तथा सुदृढीकरण आयोजना:

१. खुम्बु बिजुली कम्पनी लि. सोलुखुम्बुलाई बाढीले पुर्याएको क्षतिको फिल्ड भिजिट गरेर बन्द रहेको विद्युत केन्द्र संचालन तथा निर्माणको लागी प्राविधिक प्रतिवेदन पेश गरिएको ।
२. ने.वि.प्रा. का प्रादेशिक कार्यालयहरूलाई साना जल विद्युत सुधार तथा मर्मत कार्य गर्न जल विद्युत केन्द्रहरूको सूची माग गरिएको । प्राप्त सूची अनुसार जलविद्युत केन्द्रहरूका बारेमा अध्ययन गरी आवश्यक कागजात संकलन गरी स्थलगत भ्रमण गर्ने योजना तयार गरिएको ।

जलविद्युत अध्ययन आयोजना:

१. कर्णाली नदी बेसिनमा पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजनाको गुगल नक्सा र उपलब्ध नक्साबाट आयोजना पहिचान कार्य चालु रहेको ।
२. हुलिङ्गटार डम्किन पम्प जलाशययुक्त जल विद्युतको साईट भिजिट गरिएको ।

सभै महाशाखा:

१. हुलिङ्गटार डम्किन पम्प जलाशययुक्त जल विद्युतको LIDAR Drone survey गर्ने कार्य सम्पन्न भएको ।
२. GIS Data Base Mapping work को २ महिनाको LIDAR Drone मार्फत फिल्ड सभै सम्पन्न गरी Office work अन्तर्गत Data analysis चालु रहेको ।
३. Damak-Keraun-Biratnagar 132 KV Transmission line को झापा जिल्लाको Cadastal सभै गर्ने कार्य सम्पन्न भएको ।
४. Godak-Anarmani 132 KV Transmission Line Project को Desk Study चालु रहेको ।
५. कुलेखानी जल विद्युत केन्द्रको जलाशय क्षेत्रको Bathymetric survey अन्तर्गत Field कार्य सम्पन्न भएको ।
६. तालिम व्यवस्थापन विभागबाट सन्चालित Advanced GIS Training को लागि यस महाशाखाबाट प्रशिक्षक खटाई उक्त तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको ।

व्यावसायिक कार्य:

१. बुटवल ग्रिडसँग Design relocation and replacement of Suspension Type Lattice Tower of Butwal-Motipur 132 KV Transmission Line by Monopole कार्यको लागि भएको Memorandum of Understanding (MOU) बमोजिम Design review गर्ने कार्य सम्पन्न भएको ।
२. Study and Design of Protection works of Barhabise Substation को कार्य सम्पन्न गरी Final report पेश गरिएको ।

५.८.७. भौगर्भिक परिक्षण विभागबाट सम्पन्न कार्य विवरण:

Geological Investigation Department (GID) earlier Soil, Rock and Concrete Laboratory (SRCL), NEA was established in 1986 as a Geological and geotechnical study Department under Nepal Electricity Act. Since the year of its establishment, GID has carried out various consulting services in the fields of Geology, Geotechniques, Geophysics and Laboratory Testing. SRCL is a pioneer institution for providing services for Geological and Geotechnical Investigation for hydropower, road and transmission line projects within NEA and outside.

The recent activity of GID is summarized as follows (FY 2081/2082 – Magh - Chaitra):

A. The Investigation works performed by GID are as:

1. Upper Arun Hydroelectric Project

As per the MoU with Upper Arun Hydroelectric Limited (UAHEL); Exploratory core Drilling works has been completed and the draft final report has been submitted on February 02, 2025. The additional investigation works comprises, Geological Mapping, Topographic survey, Geophysical study, core drilling, In-situ tests, Laboratory tests, Optical/ acoustic/ Tripple sonic scanning etc. at the Project site. Final quantity of drilling works was 4,211.25 m at 35 holes having depth 30m to 400.0m.

2. Geotechnical Investigation of Ikhuwa Khola Hydropower Project

As per the MoU with Upper Arun Hydroelectric Limited; 50% of Exploratory core Drilling works has been completed, and the field progress report has been submitted to UAHEL Drilling works at Tailrace located at Samatar has been completed. The drilling works at proposed Powerhouse location (IKDH-2) and drilling works at proposed Surge Shaft location

(IKDH-3) are going on and are anticipated to be completed soon. The drilling depth of these holes is 150.0 m and 320.0m respectively.

3. Jawa Tila Hydroelectric Project

Electrical Resistivity Tomography survey work has been completed. The total ERT Length was 3000m. Draft report of the ERT works has been submitted.

4. Syarphu Lake Pump Storage Hydroelectric Project

Electrical Resistivity Tomography survey work has been completed. The total ERT Length was 3680m. Draft report of the ERT works has been submitted.

5. Televiwer Study in Chomanthang, Sindhupalchowk

The Optical Televiwer Study was completed in 50m depth in the Sindhupalchowk district for the research project. Final report has been submitted.

6. Facilities with equipment at the Test Adit Tunnel of UAHEP is being provided for the rectification work and Rock Mechanical Tests inside the Tunnel Cavern.

B. Civil works: The bidding for the civil maintenance work has been completed (NEA-GID-2081/82-CIVIL-SQ-01) as well as the related maintenance works have been recently completed.

The bidding for the Procurement of Manpower Supply for Geological and Geotechnical Investigation Work (2081/82-GID-TC-SQ-02), has been completed.

The tendering process for the purchase of Rock Dilatometer Equipment (Contract Identification No.: 2081/82-GID-Goods-T1) is in progress.

५.८.८ .नेपाल विद्युत प्राधिकरण वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभागले सम्पन्न गरेका कार्यहरूको विवरण:

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ ले वातावरणीय अध्ययनलाई आयोजना निर्माण अघि पालना गर्नुपर्ने पूर्व शर्तको रूपमा व्याख्या गरेको छ। सोही ऐनको परिधिभित्र रही नेपाल विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाहरूको वातावरणीय अध्ययन तथा अनुगमनको कार्य वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग मार्फत गरिदै आएको छ। हालका वर्षहरूमा सामाजिक समावेशिकरण एवं दातृ निकायहरूको ऋणको शर्त बमोजिम अन्य थप अध्ययन समेत गर्नुपर्ने भएको कारणले यस विभागको कार्य क्षेत्र समेत बढ्दै गएको छ।

विभागको कार्यक्षेत्र :

यस विभागले नेपालको विद्यमान कानूनी प्रावधान तथा नीतिगत व्यवस्था बमोजिम विभिन्न खालका वातावरणीय अध्ययन, प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुगमनका कार्यहरू गर्दै आएको छ।

- ने.वि.प्रा. अन्तर्गतका विद्युत (उत्पादन, प्रसारण वा वितरण) आयोजनाहरूको भौतिक, जैविक, सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरण सम्बन्धी अध्ययन कार्य गर्ने।
- निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुगमनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
- आयोजनाका सकारात्मक प्रभावहरू अभिवृद्धिको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
- निर्माणाधीन आयोजनाको आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा रहेका समुदायहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न खालका सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
- विभिन्न दातृ निकायहरूको वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षण नीति विश्लेषण गरी विभिन्न अध्ययन तथा अनुगमन कार्यहरू सञ्चालन गर्ने।
- ने.वि.प्रा. अन्तर्गतका विभिन्न आयोजनाहरूको सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय प्रभाव सम्बन्धी डाटावेस तयार गर्ने।
- वातावरण सम्बन्धी नीतिगत विषयहरूमा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव पेश गर्ने।
- माग भई आएका अन्य निकायहरूलाई समेत वातावरणीय कार्य तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने।

अध्ययन आयोजना तर्फ :-

क्र.सं.	अध्ययन आयोजना	कार्य प्रगति
१	निजगढ-पोखरिया ४०० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट २०८२/०१/१२ मा स्वीकृत भएको
२	औराहा-सिमरा १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदन विद्युत विकास विभागमा स्वीकृतिका लागि पेश भएको
३	लेखनाथ-दमौली २२० के.भी. LILO प्रसारणलाइन आयोजना	प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट २०८१/११/२३ मा स्वीकृत भएको
४	लेखनाथ-दमौली २२० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदनको लागि स्थलगत अध्ययन कार्य सम्पन्न
५	धन्सार-हर्निया ४०० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदनको कार्यसूची (ToR) तयार भई स्वीकृतिका लागि विद्युत विकास विभागमा पेश भएको

६	जगतपुर-माडी ३३ के.भि. प्रसारणलाइन आयोजना	अद्यावधिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (Updated EIA) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयबाट सिफारिस भइ स्वीकृतिको लागि वन मन्त्रालयमा पेश भएको र स्वीकृतिको चरणमा रहेको
७	जावा तिला अर्धजलाशययुक्त (PROR) जलविद्युत आयोजना (८७ मेगावाट)	वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (IEE) को क्षेत्रनिर्धारण कार्यसूची (ToR) को लागि आवश्यक स्थलगत अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन विद्युत विकास विभागमा स्वीकृतिको लागि पेश भएको
९	हेटौडा-ढल्केवर-दुहवी ४०० के.भि. प्रसारणलाइन आयोजना	परिमार्जित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (Revised IEE) प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि विद्युत विकास विभागमा पेश भएको
१०	स्यार्पु दह पम्प जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (३३४ मेगावाट)	वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (IEE) को क्षेत्रनिर्धारण कार्यसूची (ToR) को लागि आवश्यक स्थलगत अध्ययन कार्य सम्पन्न
११	दमक-केरुन-विराटनगर १३२ के.भि. प्रसार लाइन आयोजना	प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदनको कार्यसूची (ToR) को लागि स्थलगत अध्ययन कार्य सम्पन्न
१२	सुर्खेत-दैलेख १३२ के.भि. प्रसारणलाइन आयोजना	MoU हुने प्रक्रियामा रहेको

अनुगमन आयोजना तर्फ :-

क्र.सं.	अनुगमन आयोजना	कार्य प्रगति
	तामाकोशी- काठमाण्डौ २२०/४०० के.भि. प्रसारणलाइन आयोजना	वातावरणीय अनुगमन तथा प्रभाव न्यूनिकरण कार्य निरन्तर भइरहेको
	SASEC PSEP अन्तर्गत मस्याङ्दी करिडोर २२० के.भि. प्रसारणलाइन आयोजना (मनाङ्ग-खुदी-उदीपुर तथा उदीपुर-माकेचोक-भरतपुर)	वातावरणीय अनुगमन तथा प्रभाव न्यूनिकरण कार्य सम्पन्न
	चिलिमे-त्रिसुली २२० के.भि. प्रसारणलाइन आयोजना	प्रभाव न्यूनिकरण कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको
	दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (६७० मेगावाट)	आयोजना निर्माण पूर्वको चरणमा गरिने Environmental and Social Safeguard Implementation सम्बन्धी कार्य भैरहेको
	कोहलपुर-सुर्खेत १३२ के.भि. प्रसारणलाइन आयोजना	वातावरणीय अनुगमन तथा प्रभाव न्यूनिकरण कार्य निरन्तर भइरहेको
	हेटौडा-ढल्केवर-दुहवी ४०० के.भि. प्रसारणलाइन आयोजना	वातावरणीय अनुगमन तथा प्रभाव न्यूनिकरण कार्य निरन्तर भइरहेको
	अपर अरुण जलविद्युत आयोजना (१०६३ मेगावाट)	आयोजनाको पहुँचमार्ग लगायतको Environmental and Social Safeguard Implementation सम्बन्धी कार्य भैरहेको

Proposal to be Submitted

1. Amarpur-Dhungesanghu 132 KV TL Environmental Mitigation and Monitoring -MoU Process
2. Inaruwa-Tumlingtar 220 KV TL(107KM) and Basantapur Dhungesanghu (30.93km)- Livelihood Impact Assessment- Proposal Submission
3. Karnali-Chisapani Multi Proposal Preparation Stage
4. Sunkosi Third Hydropower Project -Fisheries Studies- Proposal Submission
5. Tanahun - Damak 220 KV TL Mitigation and Monitoring

५.८.९. तालिम केन्द्रको कार्य विवरण:

इन्डक्सन लगायतका विविध तालिम नियमित रूपमा संचालन भईरहेका ।

५.८.१०. पोल प्लाण्ट बाट सम्पादित कार्य

१. कोत्रे पोल प्लाण्टबाट २०८१ श्रावण १ बाट २०८१ चैत मसान्तसम्म ९ मिटर र ११ मिटरको जम्मा ९०४८ उत्पादन र ८०५२ बिक्रि भएको ।
२. कंक्रीट पोल प्लाण्ट, अमलेखगंजबाट २०८१ श्रावण १ बाट २०८१ चैत मसान्तसम्म ९ मिटर र ११ मिटरको जम्मा १४१२८ उत्पादन र १३०३० बिक्रि भएको ।
३. कंक्रीट पोल प्लाण्ट, टंकी बाट २०८१ श्रावण १ बाट २०८१ चैत मसान्तसम्म ९ मिटर र ११ मिटरको जम्मा ९६३० उत्पादन भएको र ७८७० बिक्रि भएको ।
४. कंक्रीट पोल प्लाण्ट, लम्कीबाट २०८१ श्रावण १ बाट २०८१ चैत मसान्तसम्म ९ मिटर र ११ मिटरको जम्मा ९४३२ उत्पादन र ८६१४ बिक्रि भएको ।

५.८.१०. केन्द्रिय वर्कसप हेटौँडाको कार्य विवरण

२०८१ श्रावण १ बाट २०८१ चैत मसान्तसम्म वितरण ट्रान्सफरमर मर्मत संभार जम्मा १४०९ थान पावर ट्रान्सफरमर मर्मत संभार जम्मा ५ थान गरिएको । मिटरिङ युनिट टेष्ट ४३८ थान ट्रान्सफरमर टेष्ट २१९३ थान ट्रान्सफरमर तेल नमुना टेष्ट १७ थान ।

५.९. व्यवसाय विकास निर्देशनालय


५.९.१. पृष्ठभूमी

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सञ्चालक समितिको मिति २०८०।११।२४ को ९६५ औ बैठकबाट स्वीकृत प्राधिकरणको संगठन संरचना अनुसार नयाँ निर्देशनालयका रूपमा स्थापना भएको निर्देशनालय व्यवसाय विकास निर्देशनालय हो । उर्जा दक्षता अभिवृद्धी, चुहावट नियन्त्रण, सौर्य, वायु, हरित हाईड्रोजन उर्जा विकास र प्रर्वद्धन, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय विद्युत व्यापार, व्यवसाय प्रर्वद्धन र सहायक कम्पनीहरुको व्यवस्थापन लगायतका क्रियाकालापहरुको समग्र योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्याङ्कन यस निर्देशनालयबाट हुन्छ ।

यस निर्देशनालय अन्तर्गत देहायका विभाग, महाशाखा र शाखाहरु रहेका छन :

- १) उर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभाग
- २) विद्युत व्यापार विभाग
- ३) कम्पनी व्यवस्थापन महाशाखा
- ४) व्यवसाय प्रर्वद्धन महाशाखा
- ५) प्रशासन शाखा

५.९.२. संगठनात्मक स्वरूप :

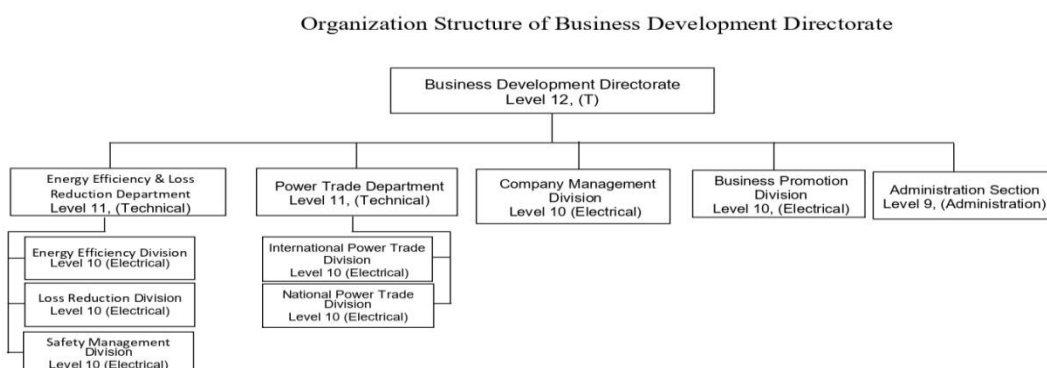

५.९.३. निर्देशनालयका प्रमुख कार्यहरु

यस निर्देशनालयले अन्तर्गतका निकायहरु मार्फत उर्जा दक्षता अभिवृद्धी, चुहावट नियन्त्रण, सौर्य, वायु, हरित हाईड्रोजन उर्जा विकास र प्रबर्द्धन, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय विद्युत व्यापार, व्यवसाय प्रबर्द्धन र सहायक कम्पनीहरुको व्यवस्थापन लगायतका क्रियाकालापहरु गर्न/ गराउन योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्याङ्कन सम्बन्धी समग्र कार्यहरु गर्दछ ।

१) उर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभाग

- Energy Efficiency Guidelines Preparation and implementation to all NEA Functions
- Energy Efficient Electrical tools and equipment/appliances promotion
- Demand side Management initiatives and its linkage to smart meter
- Electrical, Mechanical, Civil safety standard and guidelines preparation
- Training and Development safety officer and employees
- Safety awareness programs
- Safety Monitoring and Evaluations
- Preparing Energy losses standards within NEA Business
- Inter Branch Metering
- Calibration of Metering Units
- Identification of Technical Losses within NEA Business and Corrective Actions
- Cross checking/Inspection of High Consumption Customers

२) विद्युत व्यापार विभाग

- NEA Power Demand Analysis
- Searching Probable Power Producers within country
- Power Sales Planning and searching Bulk Power Purchasers
- Negotiation for Purchase of power and sales
- Monitoring and evaluation of National Power Trading Situations
- National Power Demand and Supply Analysis
- Import and Export of Power through power trading
- Negotiation and agreement of Import and Export of power
- Initiative to Regional Grid Establishment
- Power exchange initiatives
- Power Backup Initiatives
- Power Trading activities through energy Pool Market, Day ahead Market and online energy market

३) कम्पनी व्यवस्थापन महाशाखा

- Preparing Guidelines to stablish subsidiary Company of NEA for energy sector development
- Review and evaluation of the Companies activities

- Perform Financial closure for New Company
- Preparing Monitoring and Evaluation Guidelines for Subsidiary company
- Feedback of company activities
- Review and evaluation for the creation, liquidation and amalgamation of the companies

३) व्यवसाय प्रबर्द्धन महाशाखा

- Commercial use of Land of NEA
- Commercial use of Transmission Line and Distribution Line
- Internet, Cable Carrier and Data Center Business
- Consulting Services to other person, institutions by expert Human Resources
- Review and explore the optical fiber, cable net, advertisement business etc.
- Regulatory Compliance in related business
- Hydrogen development related study, execution, Monitoring and Evaluation.
- Exploring new business and innovations in changing perspectives

५.९.४. निर्देशनालय र यस अन्तर्गत रहेका विभागका जिम्मेवार अधिकारी र सम्पर्क नम्बर :

क्र.सं.	निर्देशनालय/विभाग	जिम्मेवार अधिकारी	मोबाइल नम्बर	कार्यालय नं.
१	व्यवसाय विकास निर्देशनालय	निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक श्री नवराज ओझा	९८५११५३१४६	४१५३१३२
२	कम्पनी व्यवस्थापन महाशाखा	उप प्रबन्धक श्री सुरेन्द्र कुमार शाह	९८४३६०६२२८	
३	व्यवसाय प्रबर्द्धन महाशाखा			
४	प्रशासन शाखा	उप निर्देशक श्री बिष्णु गैरे	९८५११८८३८४	४१५३१३२
५	विद्युत व्यापार विभाग	निर्देशक श्री राजन ढकाल	९८४१२२९२२९	४१५३११०
६	राष्ट्रिय उर्जा व्यापार महाशाखा	प्रबन्धक श्री बिक्रम पौडेल	९८५१२२४५६९	४१५३१०९
७	अन्तराष्ट्रिय उर्जा व्यापार महाशाखा			
८	उर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभाग	निर्देशक श्री नवराज ओझा	९८५११५३१४६	४१५३३०१
९	उर्जा दक्षता महाशाखा	उप प्रबन्धक श्री प्रमोद रिजाल	९८५१३३५५००	४१५३२४७
१०	सुरक्षा व्यवस्थापन महाशाखा	प्रबन्धक श्री जागेश्वर महासेठ	९८४१४८१८१४३	
११	चुहावट नियन्त्रण महाशाखा	प्रबन्धक श्री सुर्यनारायण मण्डल	९८५४०३१३१०	

५.९.५. विभागहरूले सम्पादन गरेको कामको विवरण

१) विद्युत व्यापार विभाग

व्यवसाय विकास निर्देशनालय अन्तर्गत रहेको यस विभागको मुख्य कार्य नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २० (च) बमोजिम निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूले उत्पादन गर्ने उर्जा खरिद गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २० (घ) अनुसार विदेशी मुलुकबाट विद्युत खरिद तथा विदेशी मुलुकलाई विद्युत बिक्री कार्य गर्ने अधिकार समेत यस विभागले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

यस विभाग अन्तर्गत राष्ट्रिय उर्जा व्यापार महाशाखा र अन्तर्राष्ट्रिय उर्जा व्यापार महाशाखा गरी दुई महाशाखा रहेका छन् र यस विभागले गर्ने मुख्य कार्यहरु निम्नानुसार वर्गीकरण गरिएका छन्:

१. कारोवार विकास:

निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले प्रवर्द्धन गर्ने विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन गर्ने उर्जा खरिद गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र प्रवर्द्धक कम्पनीहरुवित्त विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न गर्ने ।

२. निर्माण कार्यान्वयन:

विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाहरुबाट व्यापारिक उत्पादन सुरु नभएसम्म उक्त आयोजनाहरुको लागि सम्पन्न सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने/गराउने ।

३. व्यापार तथा अर्थ

व्यापारिक उत्पादन सुरु भएका आयोजनाहरुको सम्पूर्ण व्यापारिक कार्यहरु गर्ने तथा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने/गराउने ।

४. संसाधन व्यवस्थापन

विभागको आवश्यक प्रशासनिक कार्य ।

हालको मिति सम्ममा (मिति: २०८१।१२।३१) यस विभागबाट ४७६ विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल ११,३१७ मे.वा. जडित क्षमताका लागि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । जसमध्ये कुल २,८५० मे.वा. जडित क्षमताका १९६ विद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादन भएको उर्जा राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान भैसकेका छन् भने बाँकीकुल ८,४६७ मे.वा.जडित क्षमताका २८० विद्युत आयोजनाहरु निर्माणधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

**NEPAL ELECTRICITY AUTHORITY
POWER TRADE DEPARTMENT**

IPPs' Hydro Power Projects (Operation from 2081-10-01 to 2081-12-31)

S.N.	Developer	Projects	Location	Installed Capacity (kW)	PPA Date	Commercial Operation Date
1	Sabha Pokhari Hydro Power (P.) Ltd.	Lankhuwa Khola	Sankhuwasabha	5000	2074.02.21	2081.10.24
2	Salasungi Power Limited	Sanjen Khola	Rasuwa	78000	2072.12.02	2081.10.29
3	Shikhar Power Development Pvt. Ltd.	Bhim Khola	Baglung	4960	2075.06.10	2081.11.25
4	Hilton Hydro Energy Pvt. Ltd.	Super Kabeli	Taplejung	12000	2075.11.02	2081.12.02
5	Tarai Solar Pvt. Ltd.	Jeera Bhawani Sedhwa Solar	Parsa	7700	2080.07.15	2081.12.13
6	Tarai Energy Pvt. Ltd.	DDB Solar	Parsa	2300	2080.07.15	2081.12.13
			SUB-TOTAL	10996		

२) उर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभाग

यस विभाग अर्न्तगत रहेका उर्जा दक्षता महाशाखा, सुरक्षा व्यवस्थापन महाशाखा, चुहावट नियन्त्रण महाशाखा र विभिन्न आयोजनाहरु मार्फत उर्जा दक्षता अभिवृद्धी र चुहावट नियन्त्रण नियन्त्रणका लागी विभिन्न कार्यहरु गर्दै आईरहेको छ । यस विभागले सम्पादन गरेका मुख्य कार्यहरु निम्न छन् :

१) नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विभिन्न स्थानीय तहहरु बिचको लागत साभेदारीमा स्मार्ट सडक बत्ती तथा हाईमास्ट लाईट जडान कार्य भइआएको छ । हालको मिति सम्ममा (मिति: २०८१।१२।३१) यस विभागबाट विभिन्न १६ वटा स्थानीय तहहरुमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सँगको लागत साभेदारीमा ११८१७ वटा स्मार्ट सडक बत्ती तथा ५६ वटा हाईमास्ट लाईट जडान कार्य सम्पन्न भएको छ ।

२) यस विभागबाट चुहावट नियन्त्रणका लागी विभिन्न गतिविधिहरु सञ्चालन गरिएका छन् । यस आर्थिक वर्षको मिति २०८२।१२।२९ सम्ममा विभिन्न प्रदेश अन्तर्गतका ७ वटा वितरण केन्द्रहरु अन्तर्गतका ग्राहकहरुको जम्मा १९८ वटा श्रीफेज तथा सिङ्गल फेज इलेक्ट्रोमेकानिकल/डिजिटल मिटर तथा २६४ वटा TOD मिटरको निरीक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ ।

३) कम्पनी व्यवस्थापन महाशाखा

विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा अन्य पक्षको समेत सहभागीता प्रवर्द्धन गर्दै व्यावसायिक रूपमा अगाडी बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न सहायक कम्पनीहरु स्थापना गरेको छ । सहायक कम्पनीहरु स्थापनाको लागी मार्गदर्शन तयार गर्ने, कम्पनीका कार्यहरुको मुल्यांकन गर्ने लगायतका कार्य यस महाशाखाले गर्दै आएको छ । हाल सम्म सहायक कम्पनीहरु अवस्था निम्नानुसार रहेको छ ।

१. चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड

यस कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ५१% शेयर स्वामित्व रहेको छ । यस कम्पनी अन्तर्गत स्याफ्रुवेशी, रसुवामा सञ्चालित चिलिमे जलविद्युत केन्द्र (२२.१ मे.वा.) बाट वि.सं. २०६० भाद्र ८ देखि व्यापारिक विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड अन्तर्गतका सहायक/सम्बद्ध कम्पनी तथा आयोजनाहरु निम्नानुसार रहेका छन् ।

क) बुढी गण्डकी प्रोक जलविद्युत आयोजना (८१ मे.वा.)

गोरखा जिल्लामा अवस्थित यस आयोजनाको विस्तृत प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न गरी EIA प्रतिवेदन समेत स्वीकृत भै सकेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग Energy Lock गरी Connection Agreement सम्पन्न गरी PPA को चरणमा रहेको छ । विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र मिति २०८१/०७/०९ मा प्राप्त भएको छ ।

ख) बुढी गण्डकी प्रोक -१ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (९३ मे.वा.)

गोरखा जिल्लामा अवस्थित यस आयोजनाको लागि सर्वेक्षण अनुमति पत्र मिति २०७९/०३/२७ गते प्राप्त भएको र आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अनुमतिको लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा मिति २०७९/०७/२५ गते अनुरोध गरिएकोमा हालसालै मात्र प्राप्त भएको । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अनुमति अत्यन्तै ढीलो गरी प्राप्त भएकोले समय मै विस्तृत प्राविधिक तथा वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न गर्न चुनतिपूर्ण देखिएको छ ।

ग) चुम्चेत स्यारखोला जलविद्युत आयोजना (४५ मे.वा.)

गोरखा जिल्लामा अवस्थित यस आयोजनाको विस्तृत प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न गरी EIA प्रतिवेदन स्वीकृतिको चरणमा रहेको । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग Energy Lock गरी Connection Agreement सम्पन्न गरी PPA को चरणमा रहेको छ ।

घ) चिलिमे-सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लि.

ड) सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लि.

च) रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लि.

छ) मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लि.

२. चिलिमे-सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लि.

चिलिमे-सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लि. मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १०% शेयर स्वामित्व रहेको छ । यस कम्पनी मार्फत बझाङ जिल्लामा सेती नदी-३ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, (८७ मे.वा.) को विकास तथा प्रवर्द्धन भै रहेको छ । हालसम्म यस आयोजनाको विस्तृत प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न भई EIA प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ । आयोजनाको लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग Energy Lock गरी Connection Agreement सम्पन्न गरी PPA को चरणमा रहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक दीर्घकालीन ऋणको लागि पहल भइरहेको छ ।

३. सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड

सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड (SJCL), चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड (CHCL) द्वारा प्रवर्द्धित एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो, जसको स्थापना २०१० मा नेपालको जलविद्युत क्षमतालाई उपयोग गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो । यस कम्पनीले स्थानीय समुदायको आयोजना स्वामित्वमा सहभागिता बढाउने र स्थानीय संसाधनहरू लगानी गरी विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नेमा जोड दिएको छ । देशको बढ्दो बिजुलीको मागलाई पूरा गर्न यस कम्पनीले PROR का रूपमा १४.८ मे.वा.को सान्जेन (माथिल्लो) जलविद्युत आयोजना (SUHEP) तथा ४२.५ मे.वा.को सान्जेन जलविद्युत आयोजना (SHEP) हरूको विकास गरी हाल ती आयोजनाहरू संचालनका क्रममा रहेका छन् । दुवै आयोजना रसुवा जिल्लाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका, चिलिमे गाउँमा काठमाडौँबाट उत्तर लगभग १६० किलोमिटर टाढा अवस्थित छन् । हेडवर्क्स साइट तिलोचेमा समुद्र सतहभन्दा २,३४८.३ मिटर उचाइमा रहेको छ । माथिल्लो आयोजना रन-अफ-रिभर प्रकारको छ, जसले दैनिक १ घण्टा १० मिनेट पीकिङ सुविधा सहित १६१.३ मिटर ग्रस हेडबाट वार्षिक ८२.४४ गिगावाट-घण्टा उर्जा उत्पादन गर्दछ । Q४० को एक्सडेन्समा डिजाइन डिस्चार्ज ११.०७ m³/s रहेको छ । तल्लो आयोजना (SHEP) ले माथिल्लो आयोजनाको टेलरेसबाट सिधै पानी प्रयोग गरी ४४२ मिटर ग्रस हेडबाट वार्षिक २४१.८६५ गिगावाट-घण्टा उर्जा उत्पादन गर्दछ । छुप्चुङ खोलाबाट अतिरिक्त ०.५० m³/s डिस्चार्ज इन्टेक/फोरवेमा थपिन्छ, जसले गर्दा डिजाइन डिस्चार्ज ११.५७ m³/s पुग्छ । सान्जेन माथिल्लो जलविद्युत आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन ८ अक्टोबर, २०२३ देखि तथा सान्जेन जलविद्युत आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन १६ डिसेम्बर २०२४ देखि सुरु भएको हो । यी आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत १३२ केभी ट्रान्समिसन लाइन हुँदै चिलिमे हब मार्फत चिलिमे-त्रिशुली २२० केभी राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जडान गरिएको छ ।

४. रसुवागढी हाइड्रोपावर कं. लि.

यस कम्पनी अन्तर्गत रसुवा जिल्लाको गोसाइकुण्ड गाउँपालिका वडा नं. १ र २ (थुमन र टिमुरे) मा रसुवागढी जलविद्युत आयोजना (१११ मे.वा.) लाई मुख्यतः निम्नानुसारको ३ लटमा विभाजन गरी निर्माण गरिएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट निर्माण भएको चिलिमे-त्रिशुली ३ बी २२० के.भी. प्रसारणलाइन तथा चिलिमे हब सबस्टेशनको निर्माण सम्पन्न पश्चात मिति २०८१ साल कार्तिक २५ मा आयोजनामा १३२ के.भी. को व्याक चार्ज उपलब्ध भएपश्चात मिति २०८१ साल मंसिर ५ गते ग्रिड सिङ्क्रोनाइजेशन गरी पहिलो यूनिटबाट विद्युत उत्पादन शुरू गरेको र सबै युनिटहरूबाट विद्युत उत्पादन तथा परिक्षण गरी मिति २०८१ साल पौष १६ गतेदेखि व्यापारिक रूपमा विद्युत उत्पादन (Commercial Operation) हुँदै आएको छ ।

५. मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कं. लि

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १० प्रतिशत र चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लि. को ३७ प्रतिशत संस्थापक प्रबर्द्धकत्वमा स्थापित मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लि. अन्तर्गत रहेको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना (१०२ मेगावाट) को व्यावसायिक विद्युत उत्पादन शुरू गर्न प्रसारणलाइनको अभाव नै मुख्य समस्या भएको छ । आयोजना एवं आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न भई विद्युत उत्पादनको लागि तयार भई सक्दा पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न आवश्यक बाह्रबिसे सब-स्टेशन र सो अन्तर्गतको प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य पूरा नहुँदा समस्या भएको छ । वैकल्पिक निकासी योजना अन्तर्गत शिवश्री हाइड्रो पावर लि.सँग निर्माण तथा प्रयोगका लागि समझदारी गरिएको सो कम्पनीको बाह्रबिसे-लामोसाँघु डबल सर्किट प्रसारण लाइन समेतको निर्माण कार्य स्थानीय सामाजिक समस्याका कारण हाल अवरुद्ध छ । समयमै व्यवसायिक उत्पादन नहुँदा आयोजनालाई ठूलो आर्थिक क्षति भइरहेको छ र लगानीकर्ताहरूको दबाव पनि बढ्दो छ ।

६. अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कं. लि.

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत संस्थापक शेयर रहेको अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड अन्तर्गतको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना २०७८ आषाढमा निर्माण सम्पन्न भई मिति २०७८ भाद्र २५ गतेबाट पुर्ण रूपमा Commercial Operation शुरू भएको । तत्पश्चात निरन्तर रूपमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेकोमा मिति २०८१।०६।१० गते साँझ देखि देशव्यापीरूपमा परेको अविरल वर्षाको कारण मिति २०८१।०६।१२ गते विद्युत केन्द्रको बाँधस्थलमा आएको बाढी तथा पहिरोले संरचनाहरू क्षतिग्रस्त भई ८८ दिन विद्युत केन्द्र पूर्णरूपमा बन्द भई आशंक मर्मत संभार पश्चात मिति २०८१ पौष ९ गतेदेखि विद्युत उत्पादन सुचारु गरिएको छ ।

कम्पनी अन्तर्गतको दोस्रो चरणमा निर्माणाधिन २२ मेगावाट क्षमताको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत आयोजना तथा डाइभर्सन निर्माणका लागि EPC (Engineering, Procurement and Construction) मोडलमा एकल प्याकेजमा निर्माण व्यवसायी M+S SSCE-HIGH HIMALAYA J=V सँग खरिद सम्झौता भई निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको । हाल आयोजना स्थल विगु गाउँपालिकामा वडा नं. १ लामाबगर दोलखामा Adit Tunnel, Main Access Tunnel, Headrace Tunnel र Powerhouse खन्ने कार्य भैरहेको छ । हालसम्म लामाबगरमा Adit Tunnel ४१४ मिटर खन्ने कार्य तथा Main Access Tunnel, Headrace Tunnel and Other Tunnels गरी १७०० मिटर सुरुङ्ग निर्माण सम्पन्न भैसकेको छ । यसैगरी आयोजनाका अन्य संरचनाहरू तथा अर्को विन्दुबाट समेत मुख्य सुरुङ्ग निर्माणका लागि गौरीशंकर गाउँपालिका, वडा नं- ९, रिक्मा पूर्वाधार निर्माण गरी सुरुङ्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ हुने अवस्थामा रहेको छ ।

७. तामाकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड

कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार मिति २०७३/११/२० गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रूपमा कार्य गर्दै आइरहेको यस कम्पनीले तामाकोशी पाँचौ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्ने मुख्य लक्ष्य राखेको छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको Tailrace वाट निस्कने पानी उपयोग गरी निर्माण गरिने यस आयोजनाको जडित क्षमता ९९.८ मे.वा. रहनेछ । आयोजनाको EIA, SEIA, IEE तथा EMP स्वीकृत भईसकेको । विद्युत प्रसारणको लागि आवश्यक हुने Switching House, Take off Yard, स्थायी क्याम्प तथा कार्यालय भवन निर्माण, आयोजनाको अडिटको पहुँच मार्ग निर्माण र २२० के.भी. प्रसारणलाइनको टावर निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा अधिग्रहण कार्य सम्पन्न भईसकेको । आयोजनाको Lot 1 Civil & Hydromechanical कार्यको लागि ठेकेदार कम्पनी SINOHYDRO-KSNS JV संग मिति २०८१/०२/२८ मा ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई निर्माण कार्य भईरहेको । आयोजनाको Construction Supervision & Management कार्यको लागि DOLSAR CSPDR JV संग परामर्श सेवा खरिद सम्झौता भई कार्य भईरहेको ।

८. मोदी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड

मोदी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडबाट प्रवर्धन भैरहेको माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत आयोजना (४२ मे.वा.) को Lot-1M Civil and Hydromechanical कार्यको निर्माणको लागि मिति २०८१/०१/२६ (May ८, २०२४) मा ठेकेदार SSCE-High Himalaya JV संग ठेक्का सम्झौताभई कार्य सुरु गरिसकेको, Lot-२: Electromechanical कार्यको लागि मिति २०८१/०२/०९ (May २२, २०२४) मा ठेक्का आव्हान भएकोमा सबै Bidder हरूले कम्पनीको लागत अनुमान भन्दा धेरै बढी Bid गरेकोले Tender Cancel भै Retender को लागि अन्तिम तयारीमा रहेको ।

मोदी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडबाट प्रवर्धन भैरहेको माथिल्लो मोदी जलविद्युत आयोजना (१८.२ मे.वा.) को Lot-१: Civil and Hydromechanical कार्यको निर्माणको लागि मिति २०८१/०८/१० मा

Tender आव्हान भएकोमा निर्धारित समयभित्र परेका बोलपत्रको प्राविधिक मुल्यांकन सकिएको र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने अन्तिम तयारीमा रहेको तथा सोहि आयोजनाको Lot-२: Electromechanical कार्यको लागि Tender गर्नको लागि Tender Document तयार रहेको छ ।

दुवै आयोजनाको PPA सम्पन्न भएको तथा Financial Closure सहित सम्पन्न भएको छ । दुवै आयोजनाको लागि आवश्यक १३२ KV Single Circuit प्रसारणलाइनको IEE स्वीकृत भैसकेको र निर्माणको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त भैसकेको छ । दुवै आयोजनाको लागि आवश्यक अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको जग्गा लिजमा लिने कार्य तथा रुख कटान कार्यको स्वीकृति भई रुख कटान कार्य भइरहेको ।

९. रघुगंगा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड

गण्डकी प्रदेश, म्याग्दी जिल्लामा अवस्थित राहुघाट जलाविद्युत आयोजनाको निर्माण, संचालन व्यवस्थापन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रूपमा रघुगंगा हाइड्रो पावर लिमिटेड, कम्पनि ऐन, २०६३ अनुसार मिति २०७३/११/२४ गते कम्पनि रजिस्ट्रारको कार्यालयमा विधिवत रूपमा दर्ता भइ स्थापना भएको हो । भारतको Export-Import (EXIM) Bank of India को सहूलियत पूर्ण ऋण सहयोग तथा नेपाल सरकार र ने.वि.प्रा.को संयुक्त लगानीमा ने.वि.प्रा.को सहायक कम्पनि, रघुगंगा हाइड्रो पावर लिमिटेडबाट निर्माणाधीन यस आयोजनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ७० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ । आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक वातावरणीय कार्य, जग्गा प्राप्ति, कर्मचारी आवास निर्माण लगायत सम्पूर्ण प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न भइ हाल लट १ सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल कार्य र लट २ इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यको लागि निर्माण व्यवसायी नियुक्त भइ निर्माण कार्य भइरहेको र हाल सम्म समग्र भौतिक प्रगति करिब ८५% रहेको छ ।

१०. पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड

ने.वि.प्रा.को ५०% शेयर स्वामित्व रहेको यस कम्पनी अर्न्तगत ढल्केबर मुजुफरपुर ४०० के.भि.प्रसारणलाइन सम्पन्न भैसकेको र विद्युत आयात निर्यात कार्य भैरहेको छ ।

११. चैनपुर सेती जलविद्युत कं. लि

ने.वि.प्रा.को ५१% शेयर स्वामित्व रहने यस कम्पनी अर्न्तगत चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजना (२१० मे.वा.) निर्माण गर्ने गरि कम्पनी स्थापना गरिएको हो । आयोजनाका पूर्व तयारीका कार्यहरु जस्तै अडिट टनेल खन्ने,आयोजनाको विद्युत गृह र आवासिय क्षेत्र जाने पहुँचमार्ग, आवासीय भवनहरु निर्माण सम्बन्धी कार्यहरु सुचारु रहेका छन । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन Updated गरी अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता SMEC बाट Review कार्य सम्पन्न भईसकेको छ । आयोजनाको विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र प्राप्त भई सकेको छ भने वातावरण प्रभाव मुल्यांकन EIA प्रतिवेदन नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भईसकेको छ । आयोजनाको मुख्य निर्माण कार्यको

लागि आवश्यक ऋण लगानीको लागि HIDCL को अगुवाईमा लगानीको सुनिश्चिता भएको मिति २०८१/१२/२० गतेको पत्रबाट पत्राचार समेत गरेको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय, बझाङको २०८१/०३/१४ गतेको निर्माण कार्य रोक्का गर्ने पत्र प्राप्त भए पश्चात अडिट टनेल ३ र ५ मा खन्ने कार्य पूर्ण रुपमा बन्द हुन गएकोले सो कार्यलाई यथाशिघ्र शुरु गर्न नसकेमा आयोजनालाई थप आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ ।

१२. त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा मिति २०६८ साल वैशाख २९ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको स्थापना भएको हो । कम्पनीको अधिकृत पुँजी रु.२ अर्ब ५० करोड र जारी पुँजी रु.२ अर्ब ४७ करोड रहेको छ । कम्पनीमा ने.वि.प्राको ३०% शेयर स्वामित्व रहेको छ । यस कम्पनीबाट निर्माणाधीन ३७ मे.वा क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली ३ बी जलविद्युत आयोजना नदी प्रवाहमा (RoR) आधारित माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजना (६० मे.वा.) को Cascade आयोजना हो । यस आयोजनाको औसत वार्षिक विद्युत उत्पादन २९२.५८ गिगावाट घण्टा (सुख्खा याम: १३४.८८ गिगावाट घण्टा; वर्षा याम: १५७.७० गिगावाट घण्टा) रहेको छ । माथिल्लो त्रिशुली ३ बी जलविद्युत आयोजना नेपाल सरकारको “जनताको जलविद्युत” कार्यक्रम अन्तर्गतको पहिलो आयोजना हो । यस आयोजनाबाट उत्पादित विजुली १३२ किलोभोल्टको प्रसारणलाइन मार्फत ३ कि.मि. उत्तर पश्चिमतर्फ अवस्थित माथिल्लो त्रिशुली ३ बी हब सबस्टेशनमा प्रसारण गरिनेछ ।

१३. दुधकोशी कम्पनी लिमिटेड

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापना भएको यस कम्पनीले खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु जिल्लाहरूमा पर्ने ६७० मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना प्रर्वद्धन र बिकास गरिरहेको छ । आयोजनामा दुईवटा भूमिगत विद्युत गृहहरू हुनेछन् । एउटा बाँधसँगै ७० मेगावाटको विद्युत गृह र अर्को सुनकोशी नदी किनारमा ६०० मेगावाटको मुख्य विद्युत गृह । आयोजनाको विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन र आयोजना निर्माणको लागि बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरू तयार भएको छ । जलविद्युत तर्फको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रतिवेदन र प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदन तयार गरिसकिएको छ । ADB र अन्य विकास साभेदार संस्थाहरूको गाइड लाइन अनुसार गरिएका विभिन्न वातावरणीय र सामाजिक योजनाहरू तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाको कुल लागत यु.एस. डलर २,३२० मिलियन हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माणको वैदेशिक तर्फको लगानीको लागि ADB लाई मुख्य लगानीकर्ताको रुपमा र Co-Financer को रुपमा World Bank, AIIB, EIB, OFID/ Saudi Development Fund लाई सहूलियत पूर्ण ऋण लगानी गरिदिन अनुरोध गरिसकिएको छ । आगामी

सेप्टेम्बर २०२५ भित्र आयोजनाको लागि आवश्यक विदेशी र स्वदेशी लगानीको सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्थापन (Financial Closure) गर्ने र सन् २०२६ को अन्त्यतिरबाट आयोजनाको मुख्य संरचनाहरूको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरी सन् २०३३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

१४. अपर अरुण हाइड्रो-इलेक्ट्रिक लिमिटेड

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनि अपर अरुण हाइड्रो-इलेक्ट्रिक लिमिटेड सन् २०१७ मा जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्धन र विकास हेतु स्थापना गरिएको Special Purpose Vehicle हो । यस कम्पनीद्वारा नेपाल सरकारको “नेपालको पानी जनताको लगानी” अवधारणा अन्तर्गत संखुवासभा जिल्लामा अवस्थित १०६३.३६ मे.वा. क्षमताको अपर अरुण जलविद्युत आयोजना र ४० मे.वा. क्षमताको इखुवा खोला जलविद्युत आयोजना प्रवर्धन तथा विकास भईरहेको छ ।

अपर अरुण ज.वि.आ. अन्तर्गत आयोजनाको निर्माण पूर्व तयारीका कार्यहरू जस्तै २.०३ कि.मि. सुरंग सहितको २१ कि.मि. लामो पहुँचमार्ग तथा कर्मचारी आवासगृह निर्माण भईरहेको, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र क्षतिपूर्ति वितरण लगायतका कार्यहरू सम्पन्न भईसकेको छ । हाल आयोजनाको टेन्डर डिजाइन तथा निर्माण सुपरिवेक्षण कार्यका निम्ति अन्तरराष्ट्रिय स्तरको परामर्शदाता नियुक्त भई कार्यभईरहेको छ । आयोजनाको grid connection agreement भईविद्युत खरिद सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ । यसका साथ साथै इखुवा खोला ज.वि.आ. को टेन्डर डिजाइन सम्बन्धि दस्तावेज परामर्शदाताद्वारा तयार भईरहेको छ ।

यस कम्पनीको आयोजना कार्यन्वयनका क्रममा देखिएको प्रमुख समस्या आयोजनाको लागि श्रोत सुनिश्चित गर्ने तथा वित्तीय व्यवस्थापन जुटाउने रहेको छ भने यस बाहेक आयोजना स्थलसम्म पहुँचको लागि निर्माणाधीन कोशी राजमार्गको अवस्था राम्रो नभएको, पूर्वाधारको सिमित सुविधा उपलब्ध भएको, अन्तरनिकाय समन्वय र स्वीकृतिमा ढिलाई हुने जस्ता अन्य समस्याको पहिचान तथा समाधानका निम्ति प्रयास गरिएका छन् ।

कम्पनीद्वारा आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्व तयारीका कार्यहरू अन्तिम चरणमा रहेको हुँदा आयोजना यथासिघ्रनै निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको अवस्थामा रहेको छ । कम्पनीले सन् २०२६ मा सुरु गरि सन् २०३२ सम्ममा अपर अरुण तथा इखुवा खोला ज.वि.आ. निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

१५. उत्तरगंगा कम्पनी लिमिटेड

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनि को रुपमा स्थापना भएको उत्तरगंगा पावर कम्पनि उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बिकाश गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको हो । यस कम्पनिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण को बहुमत सेयर (६८ %) रहेको छ । कम्पनि अन्तरगत प्रस्तावित

उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बागलुंग जिल्लाको पश्चिममा निसिखोला गाउँपालिकामा पर्दछ, राजधानी बाट करिब ४०० कि.मि पश्चिम गण्डकी प्रदेश मा अवस्थित छ । ढोरपाटन उपत्यका मा बग्ने उत्तरगंगा नदीमा २०० मि. को बाँध बाँधी कृत्रिम जलाशय निर्माण गरि सो पानि करिब ८ कि.मि लामो सुरुंग मार्फत निशी खोलामा पथान्तरण गरि ८२८ मे.वा को विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो विद्युत पश्चिम रुकुम जिल्ला को निर्माणाधीन बफिकोट ४०० के.भी सब स्टेशन मा लागि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मा समाहित गर्ने योजना छ ।

हालसम्म आयोजनाको प्रगति हेर्दा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिएको, वन तथा बातावरण मन्त्रालय बाट बातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन EIA स्वीकृत भैसकेको तथा विद्युत उत्पादन अनुमति (Generation License) पत्रको लागि विद्युत बिकास विभाग मा आवेदन दिइ सकेको छ ।

हाल NEA Engineering company मार्फत आयोजनाको Review of feasibility study and in basinandinter- basin option study को कार्य भैरहेको छ र रिपोर्ट प्राप्त भएपछि Construction Modality / funding modality निक्यौल गरि आगामी आठ वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना आयोजना ले राखेको छ ।

१६. तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेड

मार्ग देखि वैशाखसम्म अधिकतम विद्युत मागलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त जलाशययुक्त १४० MW तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्न नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्रबर्द्धित पूर्ण स्वामित्वको सहायक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेड २०६८ चैत्र १२ गते स्थापना हुनुको साथै दातृ निकायहरु क्रमशः १८४ MUSD जाईका, १५० MUSD एडीबी, ८५ MUSD ईआइबी, ४३ MUSD नेपाल सरकार र ४३ MUSD नेपाल विद्युत प्राधिकरणको समेत कुल जम्मा ५०५ मिलियन अमेरिकी डलर संयुक्त लगानी गर्ने स्रोत सुनिश्चित भई द्रुतगतिमा आयोजना निर्माण कार्य भईरहेको छ ।

१७. एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ्ग कम्पनी लिमिटेडमा ने.वि.प्रा.को ५१% शेयर स्वामित्व रहेका छ । यस कम्पनिले परियोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन तथा Review, निर्माण सुपरभिजन तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । २०८०/८१ मा कम्पनीले ७३ साना तथा ठूला परियोजनाहरु सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेसँगै ६३ अन्य परियोजनाहरुमा परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । प्रमुख आयोजनाहरुमा :

विस्तृत अध्ययन तथा Review तर्फ

१. मुगु कर्णाली कर्णाली जलविद्युत आयोजना (१९०२ मेगावाट)
२. जगदुल्ला ए जलविद्युत आयोजना (१२३.७ मेगावाट)

३. उत्तरगंगा जल विद्युत कम्पनी अन्तर्गत सम्भाव्यता Review अध्ययन तथा इन बेसिन विकल्प अध्ययन

४. फुकोट- वेतन - दोधोधरा ४०० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना

निर्माण सुभरभिजन तर्फ

५. अप्पर मोदी ए जलविद्युत आयोजना (४२ मेगावाट)

६. अप्पर मोदी जलविद्युत आयोजना (१८.२ मेगावाट)

७. भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना ५१००० हे. सिचाई तथा ४६.८ मेगावाट

८. रोल्वालिंग खोला जलविद्युत आयोजना (२०.६मेगावाट)

९. फुकोट- वेतन - दोधोधरा ४०० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना ९६ कि.मी.

१०. अप्पर तामाकोशी ४५६ मेगावाट पुनः निर्माण इन्जिनियरिङ्ग तथा सुपरभिजन

ऐन, नियम एवं विनियमहरूको सूची

ने.वि.प्रा.का प्रचलित ऐनहरू

- नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१
- विद्युत ऐन, २०४९
- विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४
- विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८

अन्य प्रासंगिक ऐनहरू

- जलश्रोत ऐन, २०४९
- सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
- वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
- श्रम ऐन, २०७४
- जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४
- वन ऐन, २०७६
- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
- सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४
- सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४

नियमावली तथा विनियमावली :

- विद्युत नियमावली, २०५०
- विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली, २०५९
- नेपाल विद्युत प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ (संसोधन सहित)
- नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०७५
- ने.वि.प्रा. विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८
- ने.वि.प्रा. विद्युत दुर्घटना क्षतिपुर्ति विनियमावली, २०६७
- ने.वि.प्रा. विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७८
- ने.वि.प्रा. भ्रमण खर्च विनियमावली, २०६५
- ने.वि.प्रा. विद्युत चुहावट नियन्त्रण विनियमावली, २०५०
- ने.वि.प्रा. सामुदायिक ग्रामिण विद्युतिकरण विनियमावली, २०७१

अन्य प्रासंगिक नियमावली

- जलश्रोत नियमावली, २०५०
- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४
- वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७
- श्रम नियमावली, २०७५
- सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) नियमावली, २०६५
- सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली, २०६५
- वन नियमावली, २०७९
- जलवर्धित विकास नीति, २०५८
- जलस्रोत नीति, २०७७
